Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung
und Wohnen

Berlin



Wettbewerbe

Umbau und Erweiterung Komische Oper Berlin

Berlin Mitte

Auslobung

Offener Realisierungswettbewerb (RPW 2013) in zwei Phasen für
Architekten als Generalplaner

Umbau und Erweiterung Komische Oper Berlin
Berlin Mitte

Auslobung

Berlin, Dezember 2019

Herausgeber
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung Städtebau und Projekte
Referat Architektur, Stadtgestaltung, Wettbewerbe
Württembergische Straße 6
10707 Berlin

Wettbewerbsdurchführung
Dipl.-Ing. Architektur
Inge Schmidt-Rathert
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Referat Architektur, Stadtgestaltung, Wettbewerbe

mit

Dipl.- Ing. Architektin
Ulrike Lickert, Berlin

Titelfoto
Komische Oper Berlin / © Gunnar Geller

Druck
G.R.I.M.M. Copy Plot & Digidruck, Berlin

Disclaimer
Die in der Auslobung gewählte männliche Form bezieht immer gleichermaßen weibliche Personen ein. Auf eine Doppelbezeichnung wurde in der Regel aufgrund besserer Lesbarkeit verzichtet.

Inhaltsverzeichnis

Anlass und Ziel 7

Teil 1 Verfahren 9
1.1 Auslober, Bedarfsträger, Nutzer 9
1.2 Art des Verfahrens 9
1.3 Richtlinie für Planungswettbewerbe 10
1.4 Teilnahmeberechtigung 11
1.5 Preisgericht und Vorprüfung 12
1.6 Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen 16
1.7 Abgabe der Wettbewerbsarbeiten 17
1.8 Ortsbesichtigung, Rückfragen 18
1.9 Verzeichnis der Wettbewerbsunterlagen 19
1.10 Geforderte Leistungen 19
1.11 Beurteilungsverfahren und Vorprüfung 24
1.12 Preise und Anerkennungen 24
1.13 Abschluss der ersten Phase 24
1.14 Abschluss der zweiten Phase 25
1.15 Weitere Bearbeitung 25
1.16 Eigentum und Urheberrecht 27
1.17 Verfassererklärung 27
1.18 Bekanntgabe des Ergebnisses / Ausstellung der Arbeiten 27
1.19 Haftung und Rückgabe 27
1.20 Zusammenfassung der Termine des Wettbewerbs 28

Teil 2 Situation und Planungsvorgaben 29
2.1 Städtebauliche Rahmenbedingungen 29
2.2 Historische Entwicklung 36
2.3 Das Wettbewerbsgebiet 51
2.4 Technische Infrastruktur 52
2.5 Erschließung 53
2.6 Planungs-, Bauordnungs- und Denkmalrecht 54

Teil 3 Wettbewerbsaufgabe 59
3.1 Das Opernhaus - Komische Oper Berlin 59
3.2 Planungsumfang 61
3.3 Städtebaulich-architektonische Zielsetzung 61
3.4 Raum- und Funktionsprogramm 65
3.5 Funktionale Anforderungen an den Bestand 66
3.6 Funktionale Anforderungen an den Neubau 70
3.7 Anforderungen Erschließung / Anlieferung / Logistik 78
3.8 Weitere Technische Anforderungen 79
3.9 Freiflächen / Außenanlagen 81
3.10 Nachhaltigkeit / Energieeffizienz / Ökologische Zielsetzung 82
3.11 Investitionskosten / Nutzungskosten / Wirtschaftlichkeit 84
3.12 Barrierefreies Bauen 85
3.13 Baurechtliche Vorschriften, Normen und Richtlinien 86
3.14 Beurteilungskriterien des Preisgerichts 86

Teil 4 Anhang 89
4.1 Digitale Anlagen 89
4.2 Quellenangaben 93

Anlass und Ziel

Der bestehende Gebäudekomplex der Komischen Oper Berlin soll saniert, modernisiert und erweitert werden. Das Ensemble besteht aus Bauwerken unterschiedlicher Entstehungszeiten von 1890 bis 1980 und steht insgesamt unter Denkmalschutz.

Gegenstand des zweiphasigen Realisierungswettbewerbs ist der nachhaltige Umbau des denkmalgeschützten Gebäudeensembles und dessen Erweiterung zu einem modernen, zukunftsorientierten Opernhaus.

An exponierter Stelle in der Berliner Mitte, im historischen Stadtzentrum zwischen der Straße Unter den Linden und der Behrenstraße ist die Komische Oper ein wichtiger Teil der Berliner Opern- und Kulturlandschaft. Die Oper ist stark in die Jahre gekommen. Der bauliche und technische Zustand des Gebäudes entspricht schon seit langem nicht mehr den Anforderungen an einen zeitgemäßen Kulturbetrieb. Die bühnentechnische Ausstattung basiert auf dem Stand des Wiederaufbaus Mitte der 1950-er Jahre bzw. der Erstausstattung der 1967-er Jahre. Trotz des schlechten baulichen Zustands und der dürftigen technischen Ausstattung überzeugt die Komische Oper Berlin mit ihrem klaren künstlerischen Profil, breitem Repertoire und der hohen künstlerischen Qualität der Aufführungen ihre Besucher.

Mit der Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten, renommierten Opernhauses soll die gleichzeitige Modernisierung sämtlicher technischer Anlagen und Ausstattungen sowie Optimierung der Funktionsabläufe des Opernbetriebs einhergehen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, gestalterisch, funktional und wirtschaftlich überzeugende Entwürfe zu erhalten, die sich architektonisch mit dem denkmalgeschützten Ensemble auseinandersetzen und die Komische Oper Berlin als Solitär im Stadtraum wirken lassen.

Die Planung soll unter dem Aspekt des Nachhaltigen Bauens im Sinne eines innovativen Energie- und kosteneffizienten Gebäudekonzeptes erfolgen.

Das Programm umfasst insgesamt ca. 20.000 m² Nutzungsflächen, davon sind ca. 8.600 m² in Neubauflächen unterzubringen.
Für die Baumaßnahme liegt ein geprüftes und genehmigtes Bedarfsprogramm vom April 2018 mit Gesamtkosten von 227.000.000,- Euro (brutto, Index Feb/18) vor.
Das Bauvorhaben wird aus Mitteln des Landes Berlin finanziert.

Der Baubeginn soll 2023 erfolgen. Die Fertigstellung ist für Ende 2029 geplant. Der konkrete Rahmenterminplan wird nach Vorliegen des Wettbewerbsergebnisses erarbeitet werden.

Teil 1 Verfahren

1.1 Auslober, Bedarfsträger, Nutzer

Auslober
Land Berlin vertreten durch die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung V, Hochbau
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin

Bedarfsträger
Senatsverwaltung für Kultur und Europa
Brunnenstraße 188-190
10119 Berlin

Nutzer
Stiftung Oper in Berlin
Komische Oper Berlin (KOB)
Behrenstraße 55-57
10117 Berlin

Durchführung und Gesamtkoordination des Wettbewerbsverfahrens
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung Städtebau und Projekte
Referat Architektur, Stadtgestaltung, Wettbewerbe
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
Inge Schmidt-Rathert, II D 1
Tel.: +49 (0)30/90139-4430
E-Mail: inge.schmidt-rathert@senstadt.berlin.de

Ausschreibung und Koordination der Vorprüfung
Ulrike Lickert, Dipl.-Ing. Architektin
Knaackstraße 78
10435 Berlin
Tel.: +49 (0)30/473 78 230
E-Mail: mail@ulrike-lickert.de

1.2 Art des Verfahrens

Die Auslobung erfolgt als offener Realisierungswettbewerb in zwei Phasen für Architekten als Generalplaner (gemäß RPW 2013) mit anschließenden Verhandlungsverfahren mit den Preisträgern nach Vergabeverordnung (VgV), Fassung vom 12. April 2016 (BGBl. I. S. 624) – im Folgenden: VgV.

Eine Wettbewerbsberatung von Fachplanern bei mehreren Generalplanern ist möglich.

Es ist beabsichtigt, einen Generalplanervertrag mindestens über die Leistungen der Objektplanung, Tragwerksplanung, Planung der Technischen Ausrüstung einschließlich Bühnentechnik, Bauphysik und Brandschutzplanung abzuschließen.

Das Preisgericht wählt auf Basis der in der Auslobung genannten Kriterien anhand der eingereichten Arbeiten der ersten Phase 15 bis 25 Wettbewerbsarbeiten zur vertiefenden Bearbeitung in der zweiten Phase aus.

In der ersten Phase werden keine Preise vergeben.

Der gesamte Wettbewerb ist bis zu dessen Abschluss anonym.

Kommunikation
Die Wettbewerbssprache ist deutsch. Die Kommunikation mit den Teilnehmern erfolgt ausschließlich über den Teilnehmerbereich des Wettbewerbs auf der Internet-Plattform von wettbewerbe aktuell.

1.3 Richtlinie für Planungswettbewerbe

Dem Wettbewerb liegen die Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013) sowie der Leitfaden zur Durchführung von Wettbewerben gemäß IV 150 der Allgemeinen Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Berlins (Anweisung Bau – ABau) und die VgV zugrunde, sofern nachstehend nichts anderes aufgeführt ist.

Die Architektenkammer Berlin und die Baukammer Berlin wirken vor, während und nach dem Wettbewerb beratend mit. Die Architektenkammer registriert den Wettbewerb. Mit der Registrierung wird bestätigt, dass die Auslobungsbedingungen der Richtlinie entsprechen. Die besonderen Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber (RPW 2013, § 9 RPW) sind anzuwenden. Der Wettbewerb wird bei der Architektenkammer Berlin registriert. Die Registriernummer wird nachgereicht.

Einverständnis
Jeder Teilnehmer, Preisrichter, Sachverständige, Vorprüfer und Gast erklärt sich durch seine Beteiligung bzw. Mitwirkung am Verfahren mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen und der Anwendung der Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2013) einverstanden. Verlautbarungen jeder Art über Inhalt und Ablauf vor und während der Laufzeit des Wettbewerbsverfahrens, einschließlich der Veröffentlichung der Wettbewerbsergebnisse, dürfen nur über die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen II D abgegeben werden.

Datenschutz
Die Datenschutzerklärung gemäß der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen angepasst. Es wird einer verstärkten Informationspflicht nachgekommen, um allen Verfahrensbeteiligten des Wettbewerbs Transparenz und Sicherheit über ihre Daten zu gewährleisten. Die beigefügten Datenschutzhinweise (siehe digitale Anlage) sind zu beachten.

Jeder Teilnehmer, Preisrichter, Sachverständige, Vorprüfer, Gast und Auftragnehmer willigt durch seine Beteiligung bzw. Mitwirkung am Verfahren ein, dass seine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit o.g. Wettbewerb bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Form einer automatisierten Datei geführt werden.

Vergabekammer
Öffentliche Aufträge, die gemäß den Vergabevorschriften der EU vergeben werden müssen, unterliegen einem Rechtsschutzverfahren. Für die öffentlichen Auftraggeber des Landes Berlin wird dieses Verfahren vor der Vergabekammer des Landes Berlin geführt.

Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Straße 105
10825 Berlin
Tel. +49(0)30 - 9013 8316, Fax. +49(0)30 - 9013 7613

1.4 Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme am Wettbewerb werden entsprechend der EU-Wettbewerbsbekanntmachung gemäß RPW 2013 und VgV Architekten als Generalplaner zugelassen. Es ist von den Teilnehmern sicherzustellen, dass die folgenden Fachdisziplinen bereits zum Wettbewerbsverfahren (nach RPW 2013) eingebunden werden: Tragwerksplaner, Planer der Technischen Ausrüstung und Bühnentechniker.

Als fachliche Anforderung an die Teilnahmeberechtigung wird die Berufsqualifikation als Architekt gefordert im Sinne des § 75 Abs. 1 und 3 VgV.

Bei natürlichen Personen sind die fachlichen Anforderungen erfüllt, wenn sie die vorgenannte Berufsbezeichnung führen dürfen. Bei juristischen Personen sind die fachlichen Anforderungen erfüllt, wenn der satzungsgemäße Geschäftszweck Planungsleistungen sind, die der Wettbewerbsaufgabe entsprechen. Außerdem müssen der zu benennende bevollmächtigte Vertreter und der Verfasser der Wettbewerbsarbeit die fachlichen Anforderungen, die an natürliche Personen gestellt werden, erfüllen. Bewerbergemeinschaften natürlicher und juristischer Personen sind teilnahmeberechtigt, wenn jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft die fachlichen Anforderungen und die Bewerbergemeinschaft insgesamt die sonstigen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Das Vorliegen der Teilnahmeberechtigung wird in Bezug auf die Preisträger geprüft. Soweit ein Preisträger wegen mangelnder Teilnahmeberechtigung oder Verstoßes gegen Wettbewerbsregeln nicht berücksichtigt werden kann, rücken die übrigen Preisträger sowie sonstige Teilnehmer in der Rangfolge des Preisgerichts nach, soweit das Preisgericht ausweislich des Protokolls nichts anderes bestimmt hat (vgl. § 79 Abs. 5 Satz 4 VgV; § 8 Abs. 1 UAbs. 2 RPW 2013).

1.5 Preisgericht und Vorprüfung

Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter

Elke Delugan-Meissl
Architektin, Wien

Jonathan Sergison
Architekt, London / Zürich

Volker Staab
Architekt, Berlin

Dr. Elli Mosayebi
Architektin, Zürich

Harry Gugger
Architekt, Basel

Dr.-Ing. Christoph Gengnagel
Tragwerksplaner, Berlin / München

Stellvertretende Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter

Ferdinand Heide
Architekt, Frankfurt a. M.

Nicole Zahner
Tragwerksplanerin, Berlin

Peter Haimerl
Architekt, München

N. N.
Architekt

Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter

Regula Lüscher
Senatsbaudirektorin
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Dr. Torsten Wöhlert
Staatssekretär für Kultur
Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Barrie Kosky
Intendant und Chefregisseur
Komische Oper Berlin

Dr. Christoph Rauhut
Landeskonservator und Direktor
Landesdenkmalamt

Ephraim Gothe
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit, Bezirksamt Mitte von Berlin

Stellvertretende Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter

Hermann-Josef Pohlmann
Abteilungsleiter Hochbau
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Helge Rehders
Leiter der Grundsatzabteilung
Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Susanne Moser
Geschäftsführende Direktorin
Komische Oper Berlin

Dr. Ruth Klawun
Leiterin Bau- und Kunstdenkmalpflege
Landesdenkmalamt

Kristina Laduch
Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung
Bezirksamt Mitte von Berlin

Sachverständige

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin

Manfred Kühne
Abteilungsleiter Städtebau und Projekte

Ariane Albers
Referatsleiterin Abteilung V, Hochbau
Projektmanagement Kultur

Bernd Weiß
Abteilung V, Hochbau
Projektmanagement Kultur

Irene Suhr
Abteilung V, Hochbau
Projektmanagement Kultur

Kristina Keinemann
Abteilung V, Hochbau
Projektmanagement Kultur

Sebastian Pellatz
Abteilung V Hochbau
Projektmanagement Kultur

Martina Pongratz-Witschurke
Gruppenleiterin Technische / wirtschaftliche Prüfung und Genehmigung Hochbau

Heiko Schröder
Technische / wirtschaftliche Prüfung und Genehmigung Hochbau

	Sigrid Nett Abteilung Städtebau und Projekte - Bauplanungsrecht
	Daniel Klette Abteilung Städtebau und Projekte - Bauplanungsrecht
	Paola Messer Leiterin Oberste Bauaufsicht
	Thomas Meyer Oberste Bauaufsicht
	Kais-Uwe Karge Oberste Bauaufsicht
	Susanne Walter Referatsleiterin Architektur, Stadtgestaltung, Wettbewerbe
	Inge Schmidt-Rathert Gruppenleiterin Referat Architektur, Stadtgestaltung, Wettbewerbe
	Ingeborg Stude / Maike Pischke Koordinierungsstelle Barrierefreies Bauen
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	Karin Irmscher Abteilung IV
Senatsverwaltung für Kultur und Europa	Kathrin Simons Referatsleiterin Bau- und Liegenschaften
	Sascha Silvester Wenzel Grundsatz - Bauen / Liegenschaften
	Barbara Esser Referatsleiterin Bühnen, Orchester, Tanz, Literatur
	Steffen Pauels Referat Bühnen, Orchester, Tanz, Literatur
Landesdenkmalamt Berlin	Sybille Haseley Zuständige Gebietsreferentin
Bezirksamt Mitte von Berlin	Steffen Klette Stadtentwicklungsamt Stellvertr. Leitung Fachbereich Stadtplanung

	Heike Mertens Stadtentwicklungsamt Fachbereich Stadtplanung Städtebauliche Beratung und Planungsrecht
	Uta Walch Fachbereich Denkmalschutz Ortsteil Mitte
	Felix Ross Strassen- und Grünflächenamt
Komische Oper Berlin	Philip Bröking Operndirektor
	Rainer Simon Referent des Intendanten
	Daniel Kaiser Technischer Direktor
	Frank Köckritz Referent des Technischen Direktors
	André Kraft Leiter Kommunikation und Marketing
	Katrin Kath Leiterin Kostümabteilung
	Andreas Moritz Orchestermanager
	Enrico Hübner Künftiger Leiter der Haus- und Betriebstechnik
Vorprüfung	Ulrike Lickert Architektin, Berlin
	Norbert Giebels Architekt, Berlin
	Birgit Dietsch Architektin, Berlin
	N. N. Architektin, Berlin
Kostenprüfung	N. N Projektsteuerer
Energieeffizienz / Nachhaltigkeit	N. N. Energiesachverständiger

Verfahrensbeteiligte	Peter Kever Referent Wettbewerb und Vergabe Architektenkammer Berlin
	Annalie Schoen Landeswettbewerbsausschuss Architektenkammer Berlin
	Marion Pristl Baukammer Berlin
Gäste	Georg Vierthaler Generaldirektor Stiftung Oper in Berlin
	Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin
	Mitglieder der Bezirksverordneten-versammlung Mitte von Berlin

1.6 Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen

Die Wettbewerbsunterlagen stehen allen interessierten Büros zum Download auf der Internet-Plattform von wettbewerbe aktuell zur Verfügung.

Anmeldung und Zugang zum Teilnehmerbereich
Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich zunächst unter der Adresse: https://www.wettbewerbe-aktuell.de/onlineverfahren/ov/296 für die Teilnahme am Wettbewerb zu registrieren.

Falls noch nicht vorhanden, muss ein Login (kostenfreier Basis-Account) über wettbewerbe-aktuell erstellt werden.
Nach vollständiger Anmeldung werden den Teilnehmern die individuellen Zugangsdaten an die zuvor anzugebende Emailadresse zugesandt. Mit den Zugangsdaten ist der Teilnehmerbereich zu erreichen, in dem die vollständigen Auslobungsunterlagen zum Herunterladen hinterlegt sind. Im Teilnehmerbereich stehen alle dem Wettbewerb zugehörigen Unterlagen bereit. Innerhalb des Bereichs werden zu den jeweiligen Terminen die Zugänge zum Rückfragenbereich und ergänzende Wettbewerbsinformationen bereitgestellt. Weitergehende Informationen, die während des Verfahrens versendet werden, werden an die Emailadresse gesendet, die von den Teilnehmern (beim Login) hinterlegt wurde.
Wettbewerbsunterlagen können nur auf diesem Weg abgerufen werden. Eine Zusendung per Post erfolgt nicht.

Die Registrierung für den Teilnehmerbereich ist nicht mit einer Prüfung der Teilnahmeberechtigung verbunden. Jeder Teilnehmer prüft seine Teilnahmeberechtigung selbständig. Eine Prüfung durch den Auslober erfolgt erst nach abgeschlossenem Wettbewerb.

Die Modelleinsatzplatte wird zur zweiten Phase versendet.

1.7 Abgabe der Wettbewerbsarbeiten

Es gelten folgende Abgabetermine:

Erste Phase
Abgabe des Wettbewerbsentwurfs 24. Februar 2020, 17.00 Uhr

Zweite Phase
Abgabe des Wettbewerbsentwurfs 06. Juli 2020, 17.00 Uhr
Abgabe Modell 16. Juli 2020, 17.00 Uhr

Die Arbeiten **müssen jeweils zu den oben genannten Terminen spätestens um 17.00 Uhr** in der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Referat Architektur, Stadtgestaltung, Wettbewerbe
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
Raum Nr. 131

eingegangen sein (es gilt **nicht** das Datum des Poststempels).
Die Wettbewerbspläne sind gerollt in einer eckigen Versandbox einzureichen.
Das Modell der zweiten Phase ist ebenfalls an oben genannter Stelle abzugeben und in transportgerechter, und wieder verwendbarer Verpackung einzureichen.

Die Verfasser tragen die Verantwortung, dass die geforderten Leistungen **zu den oben genannten Terminen jeweils um 17.00 Uhr** vorliegen.

Alle Wettbewerbsleistungen beider Phasen sind, zur Wahrung der Anonymität in verschlossenem Zustand ohne Absender oder sonstigen Hinweis auf den Verfasser, aber mit der Kennzahl und dem Vermerk „Komische Oper Berlin“, einzureichen. Bei Zustellung durch Kurierdienst ist der Empfänger als Absender anzugeben.

Sonderbestimmungen für Teilnehmer aus dem Ausland:
Bei Sendungen aus dem Ausland ist die Einhaltung der oben genannten Regelung meist nicht möglich. Daher können Teilnehmer aus dem Ausland ersatzweise folgende Absenderangabe verwenden:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Berlin
c/o Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
(+ jeweilige Anschrift im Staat des Absenders)

Bei Sendungen aus Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, ist auf der Zollerklärung der Inhalt als „DOX“ (documents) zu bezeichnen, der Wert ist auf 10 Euro (no commercial value) zu setzen.

Kennzeichnung der Arbeiten
Die Wettbewerbsarbeiten sind in allen Stücken durch gleichlautende Kennzahlen zu bezeichnen. Sie sind aus sechs arabischen Ziffern zu bilden, und in einer Größe von 1 cm Höhe und 4 cm Breite auf jedem Blatt und Schriftstück in der rechten oberen Ecke anzubringen.

Für jede Phase ist eine Verfasserklärung abzugeben (siehe Formblätter im digitalen Anhang).

In der zweiten Phase ist eine andere Kennzahl zu verwenden.

Der Wettbewerbsverfasser hat die Verfassererklärungen mit seiner Anschrift in einem verschlossenen und undurchsichtigen Umschlag mit der jeweils gleichen Kennzahl abzugeben, mit der er seinen Wettbewerbsbeitrag gekennzeichnet hat. In der ersten Phase ist dabei eine andere Kennzahl zu verwenden als in der zweiten Phase.

Je Phase ist dieser Umschlag gleichzeitig mit der Wettbewerbsarbeit abzugeben. Die Verfassererklärung ist nicht in digitaler Form einzureichen.

1.8 Ortsbesichtigung, Rückfragen

Ortsbesichtigung
Am **02.01.2020** und am **03.01.2020**
findet jeweils um 13.00 Uhr eine Ortsbesichtigung statt.
Die Teilnehmer werden gebeten, sich zu der Ortsbesichtigung mit Angabe des ausgewählten Termins und Anzahl der Personen anzumelden bei:
mail@ulrike-lickert.de.

Treffpunkt für die Ortsbesichtigung ist:
Haupteingang
Komische Oper Berlin
Behrenstraße 55-57
10117 Berlin

Das Neubaugrundstück ist jederzeit begehbar.

Rückfragen erste Phase
Rückfragen zur Auslobung können ausschließlich bis zum **10. Januar 2020 um 13.00 Uhr** im Rückfragenforum des Wettbewerbs auf der Internet-Plattform von wettbewerbe aktuell unter https://www.wettbewerbe-aktuell.de/onlineverfahren/ov/296 gestellt werden.

Alle gestellten Fragen werden im Rückfragenforum direkt und anonym angezeigt. Dadurch ist es möglich, dass alle Teilnehmer bereits gestellte Fragen nachlesen und Doppelungen vermieden werden können. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, selbst zu überprüfen, dass seine gestellten Fragen im „Rückfragenforum“ angezeigt werden.
Bei den Rückfragen ist auf die entsprechenden Teilziffern der Auslobung Bezug zu nehmen.

Die Fragen werden gesammelt. Eine unmittelbare Beantwortung im Rückfragenforum ist nicht vorgesehen. Die Beantwortung der Rückfragen erfolgt in Abstimmung mit dem Preisgericht. Die Beantwortung aller Rückfragen wird für die Beteiligten am 16. Januar 2020 im Rückfragenforum eingestellt.
Ein Rückfragenkolloquium findet nicht statt.

Rückfragen zweite Phase
Rückfragen können entsprechend den Rückfragenmodalitäten der ersten Phase schriftlich bis zum **30. April 2020 um 13.00 Uhr** im Rückfragenforum des Wettbewerbs gestellt werden. Bei den Rückfragen ist auf die entsprechenden Teilziffern der Auslobung Bezug zu nehmen.

Die Fragen werden gesammelt. Eine unmittelbare Beantwortung im Rückfragenforum ist nicht vorgesehen.
Die Beantwortung der Rückfragen erfolgt in Abstimmung mit dem Preisgericht. Die Beantwortung aller Rückfragen wird für die Beteiligten am 07. Mai 2020 im Rückfragenforum eingestellt.
Ein Rückfragenkolloquium findet nicht statt.

1.9 Verzeichnis der Wettbewerbsunterlagen

Unterlagen des Wettbewerbs sind:
- die vorliegende Auslobung
- die Zusammenstellung der Rückfragen und deren Beantwortung
- digitale Daten zum Download (vollständiges Verzeichnis siehe Teil 4 Anhang)

Hinweis
Jeder Teilnehmer des Wettbewerbes verpflichtet sich, die vorliegenden digitalisierten Daten und Pläne nur für die Beteiligung am Wettbewerb zu nutzen. Daten, die im Rahmen der Bearbeitung als Zwischenprodukte anfallen und nicht an den Auslober abgegeben werden, sind nach Abschluss des Wettbewerbs zu löschen.

1.10 Geforderte Leistungen

Wettbewerbsleistungen der ersten Phase


In der ersten Phase werden von den Teilnehmern folgende Leistungen gefordert:

Leistungen in Papierform
1. Lageplan, M 1:500
   Veranschaulichung der städtebaulichen Konzeption mit Darstellung: Baukörperaufsichten, Gebäudehöhen bezogen auf Normalhöhennull (NHN) und OK Terrain, Dachformen, Geschosszahlen, Gebäudeeingänge, Erschließung / An- Ablieferung
2. Grundriss aller Geschosse, M 1:500
   Bestandsgebäude und Neubau
   mit Nachweis, Beschriftung und farblicher Kennzeichnung der übergeordneten Nutzungsbereiche des Raumprogramms
   EG mit Darstellung der äußeren Erschließung
3. Ansicht Glinkastraße und Ansicht Behrenstraße, M 1:200
4. Notwendige schematische Schnitte durch den Neubau im Bereich einer Verbindung mit dem Bestand, mit Höhenangaben, M 1:500
5. Zwei 3D-Volumenstudien der Gebäudevolumen unter Verwendung der 3D-Modell-Daten, Maßstab frei wählbar (kein Rendering)
6. Erläuterungsbericht (getrennt von den Plänen, max. 2 DIN A 4 Seiten) zu den genannten Beurteilungskriterien, u. a.:
   - Erläuterung und Begründung des Entwurfskonzepts
   - Erläuterung des Nutzungskonzepts
   - Aussagen zu Konstruktion und Materialien

7. Berechnungen auf Formblättern
   (siehe digitale Anlage 4_1_07_Formblaetter: 01_KOB_Formblatt bis 03_KOB_Formblatt.xls)
   - Nutzungsflächen NUF der übergeordneten Nutzungsbereiche gemäß Raumprogramm
   - Technikfläche TF
   - Brutto-Grundfläche BGFa - Neubau
   - Brutto-Rauminhalt BRIa (V) - Neubau
   - Gebäudehüllfläche (A) - Neubau
   - Verhältnis Brutto-Grundfläche a / Nutzungsfläche (BGFa / NUF) - Neubau
   - Verhältnis A / V - Neubau
8. Prüfpläne, gefaltet
   Ein Satz aller Grundrisse, Schnitte und Ansichten, mit nachvollziehbarer und ausreichender Vermaßung, eindeutiger Ausweisung und Kennzeichnung der Nutzungsbereiche in den Grundrissen und Angabe der Höhen in Schnitten und Ansichten, farbliche Kennzeichnung der Nutzungsbereiche.
9. Verfassererklärung
   siehe Formblatt in digitaler Anlage

Allgemeine Hinweise erste Phase

Die Leistungen 1. bis 6. der ersten Phase sind auf max. vier DIN A0 Blätter darzustellen. Hierfür stehen jedem Teilnehmer max. zwei Rolltafeln mit einer Hängefläche von 1,90 m x 1,40 m (Breite x Höhe) zur Verfügung. Die Maße sind einzuhalten. Jeder Teilnehmer darf nur eine Arbeit ohne Variante einreichen. Mehrleistungen, die über die in der Auslobung geforderten Leistungen hinausgehen werden gemäß § 5 Absatz 2 RPW 2013 von der Vorprüfung ausgesondert. Farbige Darstellungen und erläuternde Skizzen sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Hängefläche zugelassen.

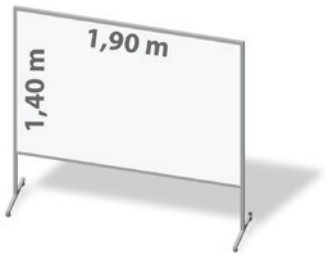

Verkleinerung

Die Präsentationspläne sind zusätzlich als Verkleinerungen für die Vorprüfung als DIN A3 Ausdruck (297 x 420 mm) einzureichen.

Zusätzliche Leistungen in digitaler Form

Zusätzlich sind folgende Leistungen in digitaler Form auf CD-Rom, DVD oder Stick zu erbringen (für Vorprüfung, Ergebnisprotokoll und Veröffentlichung):

- die Präsentationspläne als Windows-kompatible tif-Datei(en) in einer Auflösung von bevorzugt 300dpi
- die Präsentationspläne als pdf-Datei(en) mit eingebundenen Pixeldarstellungen in einer Auflösung von bevorzugt 300dpi
- die ausgefüllten Formblätter als xls-Datei (Microsoft Excel)
- die Prüfpläne als CAD-Datei im Format dwg oder dxf (AutoCAD, Version 2007 oder tiefer)
- der Erläuterungsbericht als pdf-Datei
- Verzeichnis der eingereichten Unterlagen als pdf-Datei

Als verbindliche Form der Arbeit gilt der Papierausdruck.

Wettbewerbsleistungen der zweiten Phase

Die folgende Aufstellung der geforderten Leistungen der zweiten Phase ist vorläufig und informativ. Die Ausloberin behält sich eine Präzisierung der Aufgabenstellung und der geforderten Leistungen zu Beginn der zweiten Phase vor.

Leistungen in Papierform

1. Lageplan, M 1:500
   Veranschaulichung der städtebaulichen Konzeption mit Darstellung: Baukörperaufsichten, Gebäudehöhen bezogen auf Normalhöhennull (NHN) und OK Terrain, Dachformen, Geschosszahlen, Gebäudeeingänge, Erschließung / An- Ablieferung
2. Grundriss der Eingangsebenen, M 1:200
   mit Darstellung der näheren Umgebung und äußeren Erschließung und Angabe der Raumbezeichnung
   gemäß Raumprogramm einschl. Technikflächen und Schächte
3. Grundrisse aller weiteren Geschosse, M 1:200
   Angabe der Raumbezeichnung gemäß Raumprogramm
   einschl. Technikflächen und Schächte
4. Ansichten aller wesentlichen Gebäudeseiten (mind. von der Behrensstraße, Glinkastraße und Unter den Linden), M 1:200
5. Alle zum Verständnis des Entwurfs erforderlichen Schnitte im M 1:200
6. Fassaden- bzw. Systemausschnitt des Neubaus mit Teilansicht im M 1:20 (der Informationsgehalt soll annähernd dem eines Schnittes im M 1:50 entsprechen), beispielhaft zur Vermittelbarkeit von Materialität, Gestaltqualität mit Aussagen zu Konstruktion, Materialarten und -stärken inkl. Dämm- und Speichermassenkonzept, opake und transparente Flächen, Blendschutz / Sonnenschutz.
7. Drei räumliche Darstellungen:
   a) Darstellung von Unter den Linden
   b) Darstellung der Verbindung Alt- und Neubau
   c) Innendarstellung zur Verdeutlichung der innenräumlichen Qualität
8. Schematische Verdeutlichung des Tragwerkskonzepts, ohne Maßstab
9. Energiekonzept als Schaubild des Neubaus (Piktogramm) mit Erläuterung unter Angabe der wesentlichen Elemente und Prinzipien des Energiekonzepts während der Heiz- und Kühlperiode als Piktogramm auf den Präsentationsplänen und Erläuterung auf max. 2 DIN A4 Seiten
10. Erläuterungsbericht (getrennt von den Plänen, max. fünf DIN A 4 Seiten)
    zu den unter Pkt. 3.14 aufgeführten Beurteilungskriterien, u. a.:
    - Erläuterung und Begründung des Entwurfskonzeptes
    - Aussagen zu Konstruktion und Materialien - Neubau
    - Aussagen zur Wirtschaftlichkeit - Neubau
    - Aussagen zur Barrierefreiheit - Neubau
    - Aussagen zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz


    sowie zu den weiteren unter Pkt. 3.13 genannten Beurteilungskriterien. Alle Aussagen sind besonders hinsichtlich kostenrelevanter Überlegungen darzustellen.

11. Baubeschreibung nach DIN 276 (neu) zu den KG 300 und 400
12. Prüfpläne (gefaltet):
    Ein Satz aller Grundrisse, Schnitte und Ansichten, vermaßt und mit Eintragung
    - der Raumbezeichnungen gemäß Raumprogramm
    - der für die Berechnungen notwendigen Maße
    - der Raumgrößen
    - Im Bereich des Bestandes
      Kennzeichnung aller entfernten Bauteile in der Farbe gelb
      Kennzeichnung aller neuen Bauteile in der Farbe rot
    - im Bereich der Ansichten Neubau: eindeutige Kennzeichnung der opaken und transparenten Fassadenflächen sowie der energetisch relevanten Fassadenelemente (z.B. Sonnenschutz, fassadenintegrierte Solartechnikflächen), zu öffnende und feststehende Fassadenflächen
    - Dachaufsicht M 1: 500 mit eindeutiger Kennzeichnung der opaken und transparenten Dachflächen bzw. Dachoberlichter sowie der energetisch relevanten Bauteile (z.B. Photovoltaik, Solarthermie) und ggf. der Gründachflächen
13. Berechnungen auf Formblättern ((siehe digitale Anlage 4_1_07_ Formblaetter: 01_KOB_Formblatt bis 03_KOB_Formblatt.xls)
    - Nutzungsflächen NUF in der Aufschlüsselung gemäß Raumprogramm
    - Technikfläche TF
    - Brutto-Grundfläche BGFa
    - Brutto-Rauminhalt BRIa (V)
    - Gebäudehüllfläche (A)
    - Verhältnis Brutto-Grundfläche a / Nutzungsfläche (BGFa / NUF)
    - Verhältnis A / V
    - Überbaute Fläche
    - BAU (Baugrube)
    - BAF (Basisflächen)
    - AWF (Außenwandflächen)
    - IWF (Innenwandflächen)
    - HTF (Horizontale Trennflächen)
    - DAF (Dachflächen)

    Die für die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen notwendigen Angaben sind auf den Prüfplänen (siehe 12.) darzustellen.
14. Modell M 1:500 unter Verwendung der vorgegebenen Einsatzplatte
15. Verfassererklärung, siehe Formblatt in digitaler Anlage
16. Verzeichnis der eingereichten Unterlagen

Allgemeine Hinweise zweite Phase

Für die Präsentation der Leistungen 1. bis 9. der zweiten Phase stehen pro Wettbewerbsteilnehmer max. vier Rolltafeln mit einer Hängefläche von 1,90 m (Breite) x 1,46 m (Höhe) zur Verfügung.
Die Maße sind einzuhalten. Jeder Teilnehmer darf nur eine Arbeit ohne Variante einreichen. Mehrleistungen, die über die in der Auslobung geforderten Leistungen hinausgehen werden gemäß § 5 Absatz 2 RPW 2013 von der Vorprüfung ausgesondert.



Farbige Darstellungen und erläuternde Skizzen sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Hängefläche zugelassen.

Zusätzliche Leistungen in digitaler Form
Zusätzlich sind folgende Leistungen in digitaler Form auf CD-Rom, DVD oder Stick zu erbringen (für Vorprüfung, Ergebnisprotokoll und Veröffentlichung):
- die Präsentationspläne als Windows-kompatible tif-Datei(en) in einer Auflösung von bevorzugt 300dpi
- die Präsentationspläne als pdf-Datei(en) mit eingebundenen Pixeldarstellungen in einer Auflösung von bevorzugt 300dpi
- die ausgefüllten Formblätter als xls-Datei (Microsoft Excel) und pdf
- die geforderten Leistungen nach Nr. 12 (Prüfpläne) als CAD-Datei(en) im Format dwg oder dxf (AutoCAD, Version 2007 oder tiefer)
- der Erläuterungsbericht als pdf-Datei
- die Baubeschreibung als pdf-Datei
- Verzeichnis der eingereichten Unterlagen als pdf-Datei

Als verbindliche Form der Arbeit gilt der Papierausdruck.

Hinweise zu den digitalen Leistungen
„Offene“ Dateien aus Layout-Programmen (z.B. InDesign, QuarkExpress, Illustrator etc.) können nicht berücksichtigt werden. Bildmaterial, das nicht im genannten Windows-kompatiblen tif-Format vorliegt, kann nicht berücksichtigt werden.

Die CD-ROM / DVD oder Stick selbst trägt als Titel nur die sechsstellige Kennzahl, mit der auch die schriftlichen Pläne gekennzeichnet werden (z.B. 123456). Die einzelnen Dateien auf der CD-ROM / DVD / Stick müssen wie folgt benannt werden:
Der erste Teil des Dateinamens ist die sechsstellige Kennzahl, danach folgt ein Unterstrich und anschließend der eigentliche Dateititel, gefolgt von der Formatangabe, z.B. „tif“.
Beispiele:
- Lageplan: 123456_lageplan.tif
- Grundrisszeichnung Erdgeschoss: 123456_grundriss_eg.pdf
- Prüfpläne: 123456_pruefplan_eg.dwg

In den Dateinamen dürfen keine Leer- und Sonderzeichen vorkommen.
Die CD-ROM / DVD oder Stick ist für Windows-kompatiblen PC zu erstellen. Macintosh-Formate können grundsätzlich nicht verwendet werden.

Allgemeine Hinweise für beide Phasen
Wettbewerbsbeiträge, die während der Laufzeit des Wettbewerbs veröffentlicht werden, verstoßen gegen die in § 1 Absatz 4 und § 6 Absatz 2 RPW 2013 geforderte Anonymität, und sind von der Beurteilung auszuschließen.

Ausschlusskriterien / Verstoß gegen bindende Vorgaben
Es werden keine bindenden Vorgaben im Sinne der RPW 2013 § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 formuliert.

1.11 Beurteilungsverfahren und Vorprüfung

Das Beurteilungsverfahren ist unter § 6 Abs. 2 der RPW 2013 sowie in der Anlage VI und VII der RPW 2013 dargestellt.

Ergänzend gilt Folgendes:
Die zugelassenen Arbeiten werden entsprechend RPW 2013, Anlage VI vorgeprüft. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe können die Sachverständigen zur Unterstützung der Vorprüfer hinzugezogen werden. Dem Preisgericht werden die Ergebnisse der Vorprüfung als Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt. Die Beurteilung der Arbeiten bleibt dem Preisgericht vorbehalten.

1.12 Preise und Anerkennungen

Die Wettbewerbssumme (RPW 2013 § 7 Absatz 2) ist auf der Basis der §§35, 52 und 56 HOAI (i.d. Fassung v. 17.07.2013) sowie einen Zuschlag für den Bühnentechniker ermittelt.
Für die zweite Phase werden 15 bis max. 25 Teilnehmer ausgewählt.

Für Preise, Anerkennungen und Aufwandsentschädigung stehen insgesamt 864.500,- Euro (netto) zur Verfügung.

Vorgesehen ist folgende Preisverteilung:

1. Preis	160.000,- Euro
2. Preis	110.000,- Euro
3. Preis	70.000,- Euro
4. Preis	32.500,- Euro
Drei Anerkennungen je	20.000,- Euro

Die Wettbewerbssumme wird zur Hälfte als Aufwandsentschädigung in der zweiten Phase in Höhe von insgesamt 432.000,- € ausgeschüttet. Die Summe wird entsprechend der Anzahl der ausgewählten Teilnehmer für die zweite Phase verteilt.

Die Preise und Anerkennungen werden nach Entscheidung des Preisgerichts unter Ausschluss des Rechtsweges zugeteilt. Das Preisgericht kann einstimmig eine andere Verteilung beschließen oder Preisgruppen bilden. Die Mehrwertsteuer von derzeit 19 Prozent ist in den genannten Beträgen nicht enthalten und wird den inländischen Teilnehmern zusätzlich ausgezahlt.

1.13 Abschluss der ersten Phase

Die zur Teilnahme an der zweiten Phase ausgewählten Architekten werden umgehend zur Teilnahme an der zweiten Phase aufgefordert.
Die Öffnung der Verfassererklärungen der ersten Phase erfolgt durch die Wettbewerbsbetreuung. In der zweiten Phase ist eine Verfassererklärung mit einer neuen Kennzahl einzureichen. Die Anonymität aller Teilnehmer bleibt damit bis zum Abschluss der zweiten Phase gewahrt.

Der Auslobungstext wird ggf. nach Abschluss der ersten Phase präzisiert werden. Das Preisgericht wird hierzu am Ende der Sitzung eine Empfehlung abgeben. Den für die zweite Phase qualifizierten Teilnehmern werden die zusätzlichen Unterlagen mit den Empfehlungen des Preisgerichts zugesandt.

1.14 Abschluss der zweiten Phase

Das Ergebnis des Wettbewerbs wird (unter Vorbehalt der Prüfung der Teilnahmeberechtigung) den Teilnehmern, deren Arbeit mit einem Preis oder einer Anerkennung ausgezeichnet wird, unmittelbar nach der Entscheidung des Preisgerichts zum Abschluss der zweiten Phase mitgeteilt, allen anderen durch eine E-Mail und die Übersendung des Preisgerichtsprotokolls.

1.15 Weitere Bearbeitung

Das Preisgericht gibt eine schriftliche Empfehlung für die weitere Bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe.

Die weitere Beauftragung erfolgt auf der Grundlage eines Verhandlungsverfahrens (VgV) mit den Preisträgern nach der zweiten Phase.

Der Verfahrensablauf nach Abschluss des Realisierungswettbewerbs gestaltet sich in folgenden Schritten:

- Nach Abschluss des Wettbewerbs prüft der Auftraggeber gemäß § 79 Abs. 5 Satz 4 VgV, ob die Preisträger über eine Teilnahmeberechtigung verfügen und die geltenden Wettbewerbsregeln eingehalten haben.

- Gemäß § 80 Abs. 1 VgV ist der öffentliche Auftraggeber verpflichtet, die Eignung der Preisträger zu prüfen und für das Verhandlungsverfahren festzustellen, bevor in Verhandlungen eingetreten wird. Die Preisträger müssen daher die in der Wettbewerbsbekanntmachung unter Ziffer VI.3) geforderte Eignung anhand der benannten Eignungsnachweise belegen.

- Die Preisträger, die ihre Eignung wie gefordert nachgewiesen haben, werden zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert.

- Alle Bieter, die nach der formalen Prüfung nicht zwingend ausgeschlossen werden, werden zu Verhandlungsgesprächen eingeladen.

- Nach Abschluss der Verhandlungen, welche unter Umständen aus mehreren Verhandlungsrunden bestehen können, werden alle im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter auf der Basis einheitlicher und dem Ergebnis der Verhandlungen angepasster Vergabeunterlagen zur Abgabe eines endgültigen Angebots aufgefordert. Der Auftraggeber unterrichtet die Bieter, sobald die Verhandlungen abgeschlossen wurden und legt eine für alle Bieter einheitliche Frist für die Einreichung endgültiger Angebote fest.

- Die endgültigen Angebote werden sodann anhand der bekannt gegebenen Zuschlagskriterien gewertet.

Das Ergebnis des Wettbewerbs fließt mit einer Gewichtung von 40 % in die Wertung ein.

Die wesentlichen Bestandteile der Vergabeunterlagen liegen im Entwurf den digitalen Anlagen bei. Sie dienen der Information und sind erst durch die Preisträger nach Wettbewerbsentscheidung bei Beteiligung am VgV-Verfahren zu bearbeiten.

Es ist beabsichtigt, die Leistungsphasen 2 bis 9, gemäß HOAI (2013) § 34, die Leistungsphasen 2 bis 6 gemäß HOAI (2013) § 51 und die Leistungsphasen 2 bis 9 gemäß HOAI (2013) § 55 zu beauftragen.

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Die Beauftragung der jeweils nächsten Leistungsstufe erfolgt insbesondere nur bei Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie nur bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme abrufen wird.

Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht.

Im Falle einer weiteren Bearbeitung werden durch den Wettbewerb bereits erbrachte Leistungen des Wettbewerbsteilnehmers bis zur Höhe des zuerkannten Preises nicht erneut vergütet, wenn der Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen unverändert der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird (RPW 2013 § 8 Absatz 2).

Für Architekten, die nicht Mitglieder der Berliner Architektenkammer sind, gilt § 6 Bau- und Architektenkammergesetz in der neuesten Fassung (http://www.ak-berlin.de/publicity/ak/internet.nsf/tindex/de_berufsrecht.htm). Bei ausländischen Wettbewerbsteilnehmern wird die Hinzuziehung eines Kontaktbüros für die weitere Bearbeitung

Kunst am Bau

Entsprechend den Ausführungen in der Allgemeinen Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Berlins (ABau) sind wirtschaftliche Mittel zur Umsetzung von „Kunst am Bau“ berücksichtigt worden.

1.16 Eigentum und Urheberrecht

Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Anerkennungen ausgezeichneten Wettbewerbsarbeiten werden Eigentum des Auslobers. Das Urheberrecht und das Recht der Veröffentlichung der Entwürfe bleiben dem Verfasser erhalten (RPW 2013 § 8 Abs. 3).

Der Auslober ist berechtigt, die zur Beurteilung zugelassenen Arbeiten nach Abschluss des Wettbewerbs ohne weitere Vergütung zu dokumentieren, auszustellen und (auch über Dritte) zu veröffentlichen. Die Namen der Verfasser werden dabei genannt.

1.17 Verfassererklärung

Durch ihre Unterschrift in der Verfassererklärung versichern die Wettbewerbsteilnehmer, dass sie die geistigen Urheber der Wettbewerbsarbeiten, gemäß den Wettbewerbsbedingungen teilnahmeberechtigt, mit einer Beauftragung zur weiteren Bearbeitung einverstanden und zur fachgerechten Durchführung in der Lage sind. Die Verfassererklärungen befinden sich als Formblatt in den digitalen Anlagen.

1.18 Bekanntgabe des Ergebnisses / Ausstellung der Arbeiten

Das Ergebnis des Wettbewerbs wird (unter Vorbehalt der Prüfung der Teilnahmeberechtigung) den Teilnehmern, deren Arbeit mit einem Preis oder einer Anerkennung ausgezeichnet wird, unmittelbar nach der Entscheidung des Preisgerichts der zweiten Phase, alle anderen durch eine Info-Email und Übersendung des Preisgerichtsprotokolls mitgeteilt und der Öffentlichkeit über die Presse sowie unter www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/wettbewerbe bekannt gegeben.
Die zur Beurteilung zugelassenen Wettbewerbsarbeiten beider Phasen werden mit den Namen der Verfasser, der Mitarbeiter und Sonderfachleute, den Preisen, Anerkennungen und der Aufnahme in die engere Wahl und dem Preisgerichtsprotokoll öffentlich ausgestellt. Eröffnung, Ort und Dauer der Ausstellung werden den Wettbewerbsteilnehmern und der Presse bekannt gegeben (RPW 2013 § 8 Abs.1).

1.19 Haftung und Rückgabe

Für die Beschädigung oder den Verlust der eingereichten Arbeiten haftet der Auslober nur im Fall nachweisbar schuldhaften Verhaltens. Die nicht prämierten Arbeiten von in Berlin ansässigen Teilnehmern können zu einem Zeitpunkt, der den Wettbewerbsteilnehmern rechtzeitig mitgeteilt wird, bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Referat II D - abgeholt werden.

Die nicht in Berlin ansässigen Büros werden nach Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten schriftlich bzw. per E-Mail angefragt, ob Interesse an einer Rücksendung ihrer Wettbewerbsunterlagen besteht. Die Rücksendung erfolgt nur auf Bestätigung und nur dann, wenn die Unterlagen in transport-

gerechter und wieder verwendbarer Verpackung eingereicht wurden.
Werden die Arbeiten innerhalb der genannten Fristen nicht zurückgefordert, so geht der Auslober davon aus, dass die betreffenden Teilnehmer das Eigentum an ihren eingereichten Wettbewerbsunterlagen aufgegeben haben und er mit diesen Unterlagen nach seinem Belieben verfahren kann.

1.20 Zusammenfassung der Termine des Wettbewerbs

Absendung der Wettbewerbsbekanntmachung zur Veröffentlichung	09. Dezember 2019
Ortsbesichtigung	02. Januar 2020, 13.00 Uhr (Anmeldung)
oder Ortsbesichtigung	03. Januar 2020, 13.00 Uhr (Anmeldung)

Termine erste Phase

Rückfragen per Rückfragenforum	10. Januar 2020, 13.00 Uhr
Beantwortung der Rückfragen	16. Januar 2020
Abgabe der Arbeiten erste Phase	**bis 24. Februar 2020 / 17.00 Uhr**
Preisgerichtssitzung erste Phase: 1. Tag	30. März 2020
2. Tag	31. März 2020

Termine zweite Phase

Ausgabe / Aufforderung zweite Phase	20. April 2020
Rückfragen per Rückfragenforum	30. April 2020, 13.00 Uhr
Beantwortung der Rückfragen	07. Mai 2020
Abgabe der Arbeiten zweite Phase	**bis 06. Juli 2020 / 17.00 Uhr**
Abgabe des Modells zweite Phase	**bis 16. Juli 2020 / 17.00 Uhr**
Preisgerichtssitzung zweite Phase: 1. Tag	17. August 2020
2. Tag	18. August 2020
Ausstellung der Arbeiten	voraussichtlich Ende September 2020

Teil 2 Situation und Planungsvorgaben



Abb. 01: Schwarzplan, rot die Komische Oper

2.1 Städtebauliche Rahmenbedingungen

Lage im Stadtgebiet
Die Komische Oper Berlin (KOB) befindet sich im historischen Stadtzentrum in unmittelbarer Nähe zahlreicher bedeutender Bauwerke im Bezirk Mitte. Die Liegenschaft ist Teil des Denkmalensembles Dorotheenstadt und in der Denkmalliste des Landes Berlin als Baudenkmal eingetragen.

Der Boulevard Unter den Linden und das nahegelegene Brandenburger Tor gehören zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Berlins.

Das städtebauliche Umfeld ist vor allem geprägt durch die Wiederaufbauphase Ostberlins der frühen 1960er Jahre und durch die Architektur der Nachwendezeit. Im Quartier befinden sich repräsentative Büro- und Verwaltungsgebäude mit dem Schwerpunkten Kultur, Politik, Diplomatie, aber auch Hotels sowie Wohn- und Gewerbenutzung.

Die KOB ist mit dem Hauptzugang an der Behrenstraße gelegen. Östlich schließt direkt das Westin Grand Berlin Hotel an.

Westlich der KOB zwischen Unter den Linden und Behrenstraße befindet sich an der Glinkastraße eine Freifläche, die als Baufeld für die geplante Erweiterung genutzt werden soll.

Unter den Linden steht blockrandbildend das jetzige Funktionsgebäude mit der Opernkasse. Das Gebäude aus DDR-Zeit ist mit einer Brückenanbindung an das Bühnenhaus angebunden. Es wird mit der Fertigstellung der Erweiterung nicht mehr Teil der KOB sein.



Abb. 02: Luftbild, 2018 mit Markierung des Standortes der Komischen Oper

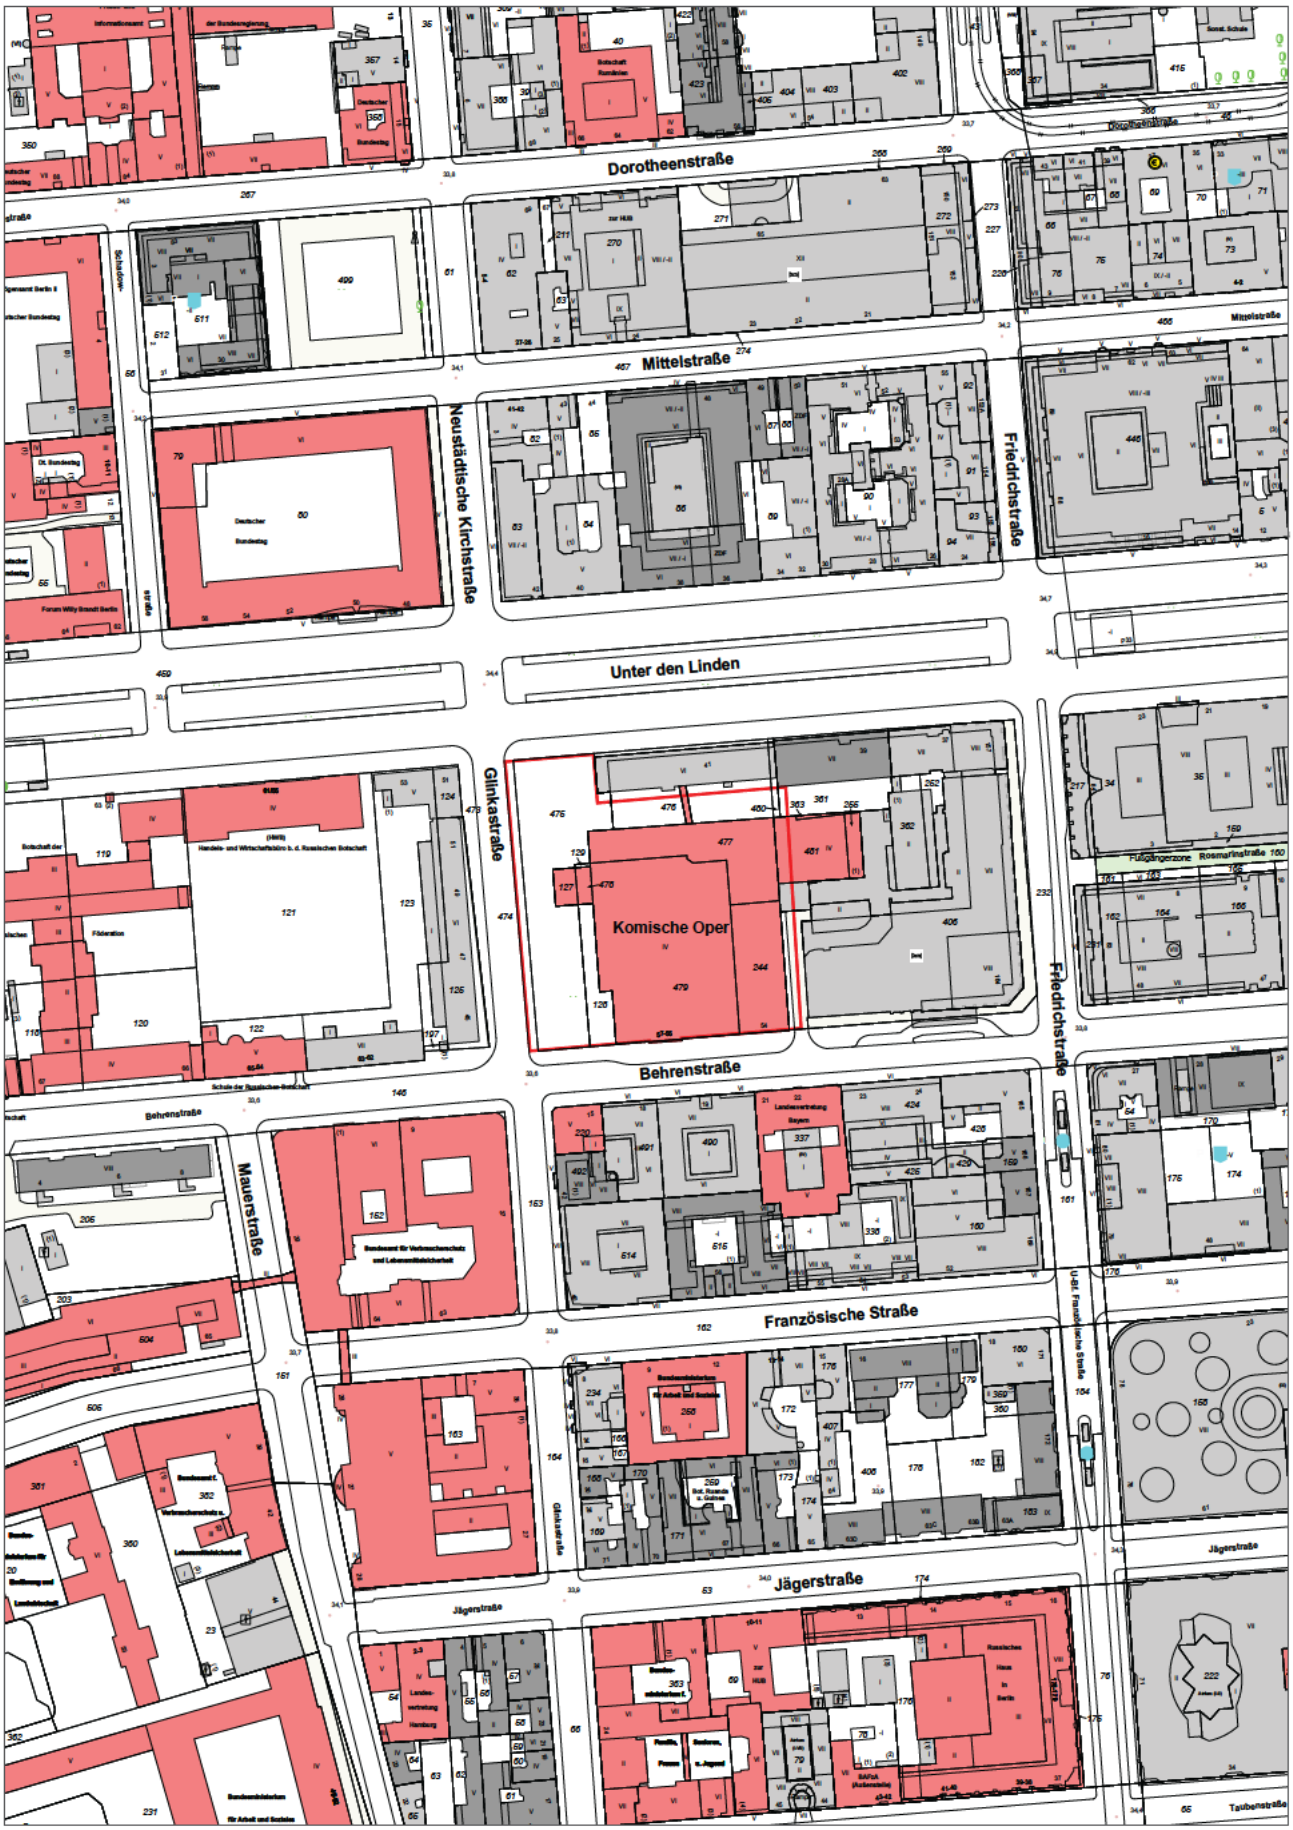


Abb. 03: Lageplan mit Markierungen des Wettbewerbsgebiets

2.1.1 Bebauung im direkten Umfeld

An der südöstlichen Ecke Behrensstraße / Glinkastraße, gegenüber des Wettbewerbsgebietes befindet sich ein nach Plänen von Heinrich Theising 1898 errichtetes denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus (siehe Abbildung 04 unten). „Es prägt mit seiner mächtigen Eckkartusche die Straßenkreuzung. Das sandsteinverkleidete Gebäude besteht aus zwei Geschäftsetagen und einem darüber liegenden Wohnhausteil. Das Geschäftsgeschoss mit seiner Rundbogengliederung mit Sandsteinquaderung und eingestellten gedrungen-massiven Säulen wirkt sehr stabil und mächtig, während die Wohngeschosse in der oberen Haushälfte mit der schlanken Binnengliederung der Fenster und den filigranen Balkonen eine größere Leichtigkeit ausstrahlen. (.....). Das vierte Obergeschoss und die Dachaufbauten fielen dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer und wurden bei der umfassenden Restaurierung für die „Gauck-Behörde“ nicht wiederhergestellt. Das heutige Dach ist eine an den Bestand angepasste Neuschöpfung“. (Quelle: denkmal/liste)



Abb. 04: Glinka-/Behrenstraße, Wohn- / Geschäftshaus von 1898, © Markus Löffelhardt

Links im Anschluss an die denkmalgeschützte Eckbebauung gegenüber des Zuschauereingangs der KOB befinden sich zwei neue Bürogebäude, die 2017 fertiggestellt und von der Patzschke Planungsgesellschaft entworfen wurden (siehe Abbildung 05 und 06 unten). Die acht oberirdischen Geschosse umfassen ein EG mit Einzelhandel, sechs Obergeschosse in Büronutzung und ein siebtes OG mit Dachterrassen.
Südöstlich in der Straßenfront Behrenstraße gegenüber der Einfahrt der





Abb. 05 und 06: Behrenstraße, gegenüber des Haupteingangs KOB, Foto: nilo

KOB befindet sich der heutige Sitz der Landesvertretung des Freistaates Bayern. Ehemals war es das Geschäftshaus des A. Schaaffhausen'schen Bankvereins. Es wurde 1910 nach dem Entwurf der Architekten Bielenberg und Moser erbaut. Die Sandsteinfassade ist durch massive, kannelierte Pfeiler über dem Rustikageschoss betont, die als Kolossalpilaster die zurückspringenden Fensterachsen zusammenfassen und das Gebälk unter dem Konsolgesims tragen. Die historischen schmiedeeisernen Fenstergitter sind noch erhalten. Nach 1924 gehörte das Haus der Reichs-Kredit-Gesellschaft.



Abb. 07: Bayerische Landesvertretung, Behrenstraße gegenüber der östlichen Zufahrt KOB, © nilo agentur für fotografie

Nordöstlich in der Behrenstraße neben der KOB schließt direkt das Westin Grand Berlin Hotel an. Bis 1957 befand sich auf dem Grundstück des Hotels eine der imposantesten Ladenpassagen der Stadt, die 1873 eröffnete Kaisergalerie. 1943 wurde das Gebäude bei einem Luftangriff zerstört, die verbliebene Ruine wurde 1957 abgetragen. Das Interhotel Grand Hotel Berlin wurde 1987 zur DDR-Zeit als repräsentativer Bau im klassizistischen Stil und mit repräsentativem hochwertigem Standard erbaut. Nach der Wende wurde es verkauft und 1997 für das Westin Grand Berlin Hotel umgebaut.



Abb. 08: Behrenstraße, rechts Westin Grand Berlin Hotel, Blick auf die KOB mit rechter Zufahrt, © Jan Windszus Photography



Abb. 09: Glinkastraße / Ecke Behrenstraße, © Gerald Zabel

Gegenüber der KOB auf der südwestlichen Ecke befindet sich ein Banken-Komplex, der sich über drei Quartiere erstreckt.
Der heutige Eindruck wird geprägt von den vereinfachenden, aber systematischen Umgestaltungen nach schweren Kriegszerstörungen. Die Gebäudeteile an der Behrenstraße wurden 1872-74 von Ende & Böckmann für die Unionsbank errichtet, ab 1882 von Architekt Wilhelm Martens neu- und umgebaut. Die Fassaden des Baukomplexes waren bis zu den Kriegszerstörungen in der Art italienischer Renaissancepaläste gestaltet. Die gesamte Anlage wurde 1921-22 von Wilhelm Kimbel noch um ein Geschoss aufgestockt. Der Komplex wird derzeit umfangreich saniert.

Ehemaliges Aeroflot-Gebäude
Das Gebäude wurde 1968 errichtet und war lange Jahre Repräsentanz der Aeroflot in Berlin.
2013 eröffnete die Handelsabteilung der russischen Botschaft dort das „Russische Haus der Wirtschaft“. Es dient als Anlaufstelle für deutsch-russische Wirtschaftsunternehmen.



Abb. 10: Unter den Linden, Ecke Glinkastraße, ehem. Aeroflot-Gebäude, © Gerald Zabel

Das Gebäude ist gegliedert in einen fünfgeschossigen Kopfbau Unter den Linden und einen riegelförmigen sechsgeschossigen Bürotrakt mit Natursteinsockel. Die klar strukturierte Fassade zeigt den Bauzeittypus der 60er Jahre. Das Gebäude ist Teil des geschützten Ensembles.

Funktionsbau der KOB Unter den Linden
Das Gebäude wurde 1961-1964 nach Entwürfen der Architekten Emil Schmidt und Heinz Dübel erbaut und ist Teil des Ensembles Unter den Linden.

Es handelt sich um einen Stahlbeton-Teilfertigbau aus den Jahren 1964 / 1965 mit bauzeittypischer Ausprägung. Das Gebäude ist technisch und gestalterisch noch im Ursprungszustand und seit Entstehung noch nicht grundsaniert worden.

Das Funktionsgebäude bildet an der Straße Unter den Linden im EG-Bereich einen Arkadengang aus. Der westliche Giebel hat im EG eine markante Stützenkonstruktion und ist durch ein Wandrelief künstlerisch gestaltet.



Abb. 11: Unter den Linden, Ecke Glinkastraße, Funktionsgebäude, Wettbewerbsgebiet mit Blick auf den Bühnenturm, 2019

Das Gebäude weist daher einen sehr hohen Grad an Instandhaltungsrückstand auf.
Neben der Verwaltung, einiger Proben- und Werkstattfunktionen der KOB befindet sich im EG des Gebäudes die Theaterkasse. Zudem sind in dem Gebäude auch Fremdmieter untergebracht. Das Gebäude steht im Rahmen des Gesamtensembles unter Denkmalschutz. Es soll künftig nicht mehr durch die KOB genutzt werden. Die zukünftige Nutzung steht noch nicht fest.

2.2 Historische Entwicklung

2.2.1 Denkmalensemble Dorotheenstadt und Boulevard Unter den Linden

Historisch gehört das Wettbewerbsgrundstück zur Dorotheenstadt oder Neustadt, einer planmäßigen Stadterweiterung des 17. Jahrhunderts, die bis 1710 über ein eigenes Stadtrecht verfügte, bis sie mit Berlin, Cölln und anderen Stadterweiterungen zusammengeschlossen wurde. Zur Dorotheenstadt gehört das gesamte Gebiet vom Festungsgraben im Osten bis zum Brandenburger Tor im Westen und von der Spree im Norden bis zur Behrenstraße im Süden. Später kamen noch einige Erweiterungen hinzu.
„Das Ensemble Dorotheenstadt“ umfasst die historischen Bauten, Denkmäler und Gartendenkmale an der Straße Unter den Linden und den angrenzenden Straßenzügen. Die Straße Unter den Linden war bis zu den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges der in dreihundert Jahren geschaffene attraktive Hauptzugangsweg zur Residenz und Hauptstadt Berlin.

Am Anfang stand eine bescheidene Allee zum Jagdrevier des Großen Kurfürsten im Tiergarten, in den folgenden Jahrhunderten hinterließen verschiedene geschichtliche Perioden bedeutende Spuren in der Physiognomie dieses Gesamtkunstwerkes: Friedrich II. ließ das „Forum Fridericianum“ als Erweiterung des Schlossbezirks errichten, zur Zeit der Französischen Revolution entstand das eindrucksvollste aller Berliner Tore, das Brandenburger Tor, nach dem Sieg über Napoleon in den Befreiungskriegen werteten Schinkel und Rauch die Straße zur „Via Triumphalis“ auf und am Ende des 19. Jahrhunderts wandelte sie sich zur vornehmsten Geschäftsstraße der Stadt.

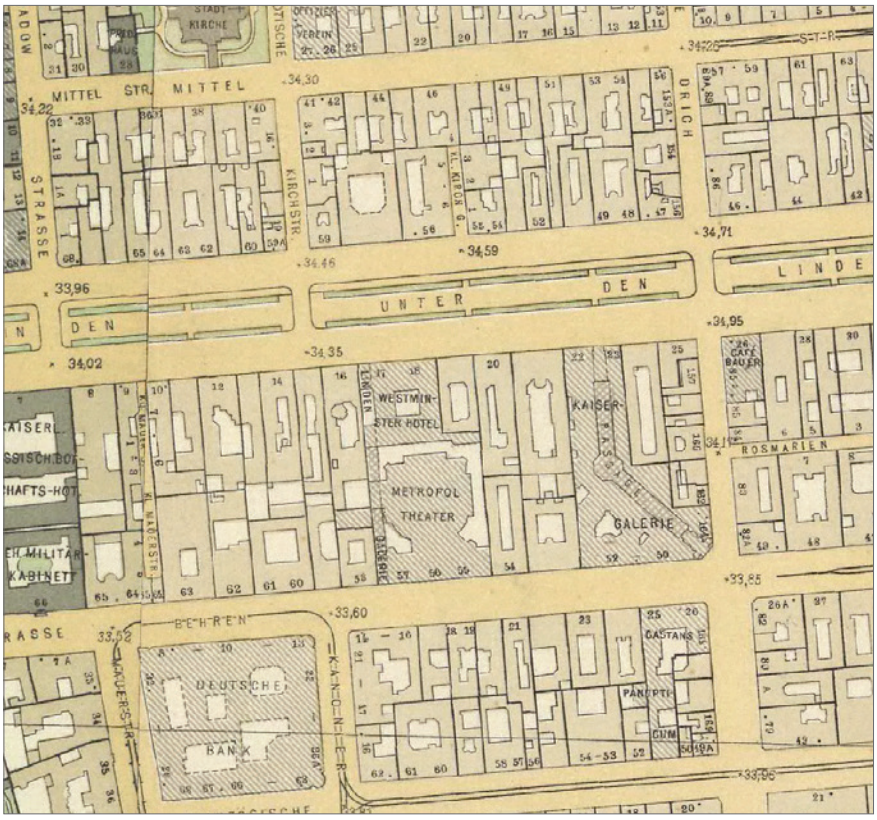


Abb. 12: Übersichtsplan von Berlin, bearbeitet von Julius Straube, um 1910

1936 wurde durch den Berliner Magistrat im Bemühen um eine Vereinheitlichung des Stadtbildes der Straße Unter den Linden die erste Fassung des Lindenstatus verabschiedet. Diese Ortssatzung wollte die Einheit des Straßenbildes, die mit der Umwandlung in eine Geschäftsstraße seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts verloren gegangen war, wiederherstellen.

Bereits 1937 wurde das Lindenstatut durch die übergeordnete Planungsbehörde unter der Leitung von Albert Speer außer Kraft gesetzt. Im Weiteren sollten die Leitlinien der Umbauplanung Berlins zur Welthauptstadt Germania maßgebend sein. Die Planung gelangte jedoch nicht zur Ausführung.

Die Straße Unter den Linden erscheint heute weitgehend in der Form, die sie durch den Wiederaufbau in den Jahrzehnten nach dem Weltkrieg erhalten hat. Bei mehreren Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg wurden die Gebäude und der Boulevard stark zerstört. Von 64 Gebäuden waren nur noch 16 erhalten, die meisten blieben als Ruinen oder Teilruinen zurück.
Der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg folgte der schwierige Wiederaufbau in der DDR bis in die 1960er Jahre. Der Magistrat von Berlin hatte unmittelbar nach dem Krieg festgelegt, dass beim Wiederaufbau nach dem Lindenstatut verfahren werden sollte. Dieses war in Anlehnung an das Statut der Vorkriegszeit neu formuliert worden. Die Straße wurde als Korridorstraße mit den traditionellen Fluchtlinien und Traufhöhen wiedererrichtet. Neubauten ordneten sich also weitgehend, bis auf die Sowjetische Botschaft, in das städtebaulich vorgegebene Schema ein. Nur wenige Neuordnungen, wie zum Beispiel der Durchbruch der Glinkastraße durch einen ehemals geschlossenen Baublock und die Aufweitung der Friedrichstraße brachten Veränderungen in den Stadtgrundriss.
Die bedeutenden historischen Bauten erhielten im Äußeren ihre überlieferten Formen zurück, wurden teilweise im Vergleich mit dem Vorkriegszustand harmonisiert und im Inneren durch moderne, aber dem historischen Äußeren angepasste Einbauten ergänzt. So wurden wesentliche Grundzüge des historischen Straßenbildes bewahrt, obwohl schon in den 1920er Jahren und erneut am Ende der 1950er Jahre maßgebliche Stadtplaner eine Modernisierung der Linden bei völliger Auflösung der historischen Baustruktur zwischen Friedrichsforum und Pariser Platz vorgeschlagen hatten.

Im August 2009 verabschiedete der Berliner Senat die „Verordnung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen an der Straße Unter den Linden, auf der Museumsinsel und im Bereich des Gendarmenmarktes“ (Baugestaltungsverordnung Historisches Zentrum), die heute noch gültig ist.

Die Straße Unter den Linden ist in unterschiedliche Bereiche unterteilt: Hinter der Schlossbrücke zeigt sie mit - wieder aufgebauten - Zeughaus und „Forum Fridericianum“ das vertraute Bild der erweiterten Residenz des 18. Jahrhunderts. Hinter dem Friedrichdenkmal an der Lindenallee ist stellenweise die bürgerliche Geschäftsstadt mit ihren repräsentativen Bauten erhalten und im Anschluss daran bestimmen öffentliche Gebäude und Botschaften aus der DDR-Zeit das Bild. Der Pariser Platz erhielt erst seit der Wende eine neue Bebauung, da er zur DDR-Zeit Sperrgebiet war. Zusammengebunden wird das Denkmalensemble Unter den Linden durch den Boulevard mit Baumbestand, die aus der 1647 nach holländischem

Vorbild planmäßig angelegten Baumallee hervorgegangen ist.
Die erste Bepflanzung zeigte eine sechsreihige Allee mit einer Mittelpromenade und beidseitig jeweils Reit-, Fahr- und Gehwege. Nach dem Ende der Befreiungskriege 1815 erhielt sie ihre bis heute bestehende Aufteilung mit vier Baumreihen. Die Ausstattung des Boulevards - Rasenstreifen, Sitzbänke, Einfassungen, Pflasterung und Beleuchtung - hat sich seitdem immer wieder verändert. 1936 wurden im Zuge des Baues der Nord-Süd-S-Bahn sämtliche Bäume gefällt und die Allee nach Beendigung der Bauarbeiten mit etwa 350 Silberlinden wieder aufgeforstet. Mit der Wiederherstellung der Bebauung nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges wurde auch die Straßenanlage weitgehend rekonstruiert. Seit 1997 wird der Boulevard mit aufwändigen Maßnahmen saniert.“ (Quelle: Denkmaldatenbank Landesdenkmalamt Berlin).
Zurzeit ist der Boulevard allerdings durch den U-Bahnbau und den notwendigen Neuanpflanzungen in Mitleidenschaft gezogen.



Abb. 13: Westlicher Bereich des Boulevards Unter den Linden 2016, Blick vom Brandenburger Tor nach Osten, unten der Pariser Platz, oben rechts die KOB, © alliance/ZB/Bernd Settnik.

2.2.2 Baugeschichte Komische Oper Berlin

Bereits seit 1765 gab es in der Behrenstraße ein Theatergebäude, das sogenannte „Theater in der Bärenstraße“.

1891-1892
Der Wiener Theater-Unternehmer Anton Ronacher gründete 1891 den Aktienverein „Unter den Linden“ und erbaute1892 das „Theater Unter den Linden“ („Ronacher“ Theater). Die Planung und Ausführung leisteten die Wiener Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Gottfried Helmer, bekannt als Theaterarchitekten mit Bauten u.a. in Prag, Budapest, Hamburg, München. Ronacher ließ gleichzeitig ein Hotel Unter den Linden errichten, das spätere „Hotel Westminster“. Theatergebäude und Hotel waren durch die „Kleine Lindenpassage“ verbunden. Die Eröffnung des „Theater Unter den Linden“ fand am 24.09.1892 statt.
Nach einer finanziellen Krise wurde das Haus von dem Theaterunternehmer Richard Schulz als „Metropoltheater“ nach einer Renovierung 1898 wiedereröffnet.



Abb. 14: Metropoltheater, Ansicht Behrenstraße um 1918

1928-1932
Das Metropoltheater gehörte von 1927 bis 1933 zum Konzern von Alfred und Fritz Rotter. Unter der Leitung des Architekten Alfred Grenander wurden 1928 bauliche Veränderungen im Innern des Theatergebäudes vorgenommen, sie betrafen v.a. die Umgestaltung der Ränge, Umgänge, Logen, Toiletten und der Kassenhalle. Bauherr war in dieser Zeit die Dorotheenstadt A.G.
Die Maßnahmen sind in der Bauwelt 1928 beschrieben: „…Der Zuschauerraum wurde auf ein lichtes Gelb mit hellem Gold abgestimmt, die Sitzzahl wurde durch Fortfall des Mittelganges im Parkett um 270 Plätze vermehrt. Im Parkett und ersten Rang wurden anstelle der früheren Sitznischen breite Umgänge geschaffen. Durch die Vermehrung der Platzzahl und den Umbau des Zuschauerraumes waren neue Treppen erforderlich. Jeder Rang hat jetzt seine eigene Treppe. Um ein neues Theaterfoyer zu

schaffen, wurden mehrere Säle der ehemaligen Arkadia erneuert; hierbei ergaben sich reizvolle Blicke ins Haupttreppenhaus. Die Bühne erhielt eine neue Beleuchtungsanlage, Versenkung und Rundhorizont. Auch das Äußere des Theaters wurde in hellen Farben gestrichen, die Eckpfeiler mit hellen Kalkplatten verkleidet. Ein vergoldetes Glasdach, das den ganzen Bürgersteig überragt, wurde über dem Eingang angebracht. Die alten Beleuchtungskörper wurden durch moderne Wandarme ersetzt.“ [Zitat: Bauwelt 19. 1928, S. 1054].
Im zweiten Rang bzw. Rangumgang wurde das bis heute erhaltene Podium für Sitzplätze eingebaut.

1933-1945
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 musste das Metropoltheater zunächst schließen. Das Theater wurde 1934 in den „Kraft durch Freude“ Vergnügungsbetrieb eingegliedert und dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unterstellt. Mit Beginn der Spielzeit 1934/35 wurde der Schauspieler Heinz Hentschke zum Direktor ernannt. Bauliche Maßnahmen durch den Architekten W.W. Zschimmer waren 1934 die Erweiterung der Bühne mit einer fest eingebauten Drehscheibe, sowie 1935 Büroumbauten. Seit 1935 war die Deutsche Zündholz-Fabriken AG Bauherr und Eigentümer des Theatergebäudes. 1939 und 1941 erfolgte nach Plänen von Paul Baumgarten ein Magazinanbau, der Umbau der Bühnenräume, die Vergrößerung des Orchestergrabens und die Einrichtung einer Führerloge. 1944 erfolgte die Schließung aller Berliner Bühnen. Bei Bombenangriffen am 9. März 1945 wurden das Bühnenhaus und das Vorderhaus an der Behrenstraße mit dem Haupttreppenhaus teilzerstört. Der Zuschauerraum war beschädigt und durch einen Blindgänger im Dach ging das Deckengemälde verloren.

1946-1947 / 1953
Der Wiederaufbau des Metropoltheaters erfolgte 1946 auf Befehl des sowjetischen Militär- und Stadtkommandanten.

Im Februar 1946 hatten die Enttrümmerungs- und Bauarbeiten begonnen. Beim Teilwiederaufbau bis Ende 1947 wurde die zerstörte Vorderfront an der Behrenstraße weitgehend abgebrochen und der Haupteingang als neuklassizistischer Eingangsportikus umgestaltet. Das Theater erhielt eine Drehbühne. Beim Wiederaufbau wurde auch die stark zerstörte Haupttreppe abgebrochen und durch eine neue Treppe mit geändertem Treppenlauf, Kunststeinbelag und neuem schmiedeeisernen Geländer ersetzt. Im Foyer, den Rängen, Umgängen und v.a. im Zuschauersaal waren Putz- und Stuckarbeiten erforderlich, die Bodenbeläge wurden erneuert. Es erfolgte der Einbau von neuen Fenstern und Türen. 1947 hatte das Theater 1388 Sitzplätze.

Es folgten 1948-1950 die Einrichtung von eigenen Werkstätten und Dekorationsmagazinen, 1952-1953 die Planung und der Bau einer Probebühne mit den Maßen der Hauptbühne und zusätzlichen Räumen.
1955-1956 wurden die verbliebenen Ruinengebäude auf dem Theatergrundstück abgebrochen und westlich eine Seitenbühne errichtet, es folgte auch der Neubau eines Heizhauses. 1958 mussten die statisch nicht mehr tragfähigen Holzbinder über der Bühne durch eine Stahlkonstruktion ersetzt werden.



Abb. 15: Metropoltheater, Ansicht Behrenstraße um 1964

1963-1967

Die Rekonstruktion der Komischen Oper Berlin 1963-1966 war Teil der Planungen zum Wiederaufbau der Straße Unter den Linden. Eine umfassende bauliche Erneuerung des Opernhauses war für die unter ihrem Intendanten Walter Felsenstein international bekannte Oper dringend erforderlich geworden, da Raumnot und technische Unzulänglichkeiten die Arbeit des erfolgreichen Ensembles der Komischen Oper beeinträchtigten.
„Die Komische Oper erhält durch den Aufbau des Stadtzentrums in ihrer städtebaulichen Lage eine völlig veränderte Bedeutung. In der Vorkriegszeit war die Komische Oper ein zwischen Hinterhöfen eingezwängter Theaterbau. Die nach 1945 bis 1958 zwischen der Altbausubstanz errichteten Nebengebäude (Probebühnen, Seitenbühne, Magazin, Heizhaus) mit ebenfalls unterschiedlichen Geschosshöhen werden den jetzigen Standortanforderungen nicht gerecht. Durch die Neuplanung wird das Theater ein von allen Seiten freistehender Baukomplex und liegt durch die Verlängerung der Glinkastraße (Durchbruch Unter den Linden) an einer Hauptverkehrsstraße.



Abb. 16: KOB, Ansicht Glinkastraße um 1967, Blick von der Straße Unter den Linden



Abb. 17: KOB, Ansicht Glinkastraße um 1967, Blick von der Behrenstraße / Glinkastr.

Mit der sich verändernden prädestinierten Lage rechtfertigt sich auch das Bemühen des Projektanten, den bisherigen Hinterhofcharakter zu beseitigen und eine städtebauliche Einordnung zu erreichen“. [Zitat: Akte Landesarchiv Berlin, Bestand C Rep. 121, Nr. 400, Gutachten vom 10.04.1964, S. 6].

Hauptplanträger und Investitionsträger für Rekonstruktionsmaßnahmen Komische Oper 1964-1966 war der Magistrat von Groß-Berlin, Bereich Bauwesen und Investitionen, Fachplanträger war das Ministerium für Kultur der DDR, der Nutzer ist die Komische Oper.
Als Hauptprojektant war der VEB Berlin-Projekt eingesetzt und der Hauptauftragnehmer war das BMK Ingenieurhochbau Berlin. Projektleiter im VEB Berlin-Projekt war der Architekt Kunz Nierade, der bereits 1956-1960 das Leipziger Opernhaus erbaut hatte.

Die Grundsteinlegung fand am 29. März 1965 statt und am 4. Dezember 1966 wurde das Opernhaus wiedereröffnet. Zeitgleich ist das Funktionsgebäude der Oper Unter den Linden 41 errichtet worden.



Abb. 18: KOB, Ansicht Behrenstraße um 1967

Vorgabe für den Neubau und die Rekonstruktion der Komischen Oper waren der Erhalt des Zuschauerraums mit der Neuumbauung. Die überlieferten Archivzeichnungen zeigen den Entwurfsprozess und das gestalterische Ringen des Architekten um eine angemessene Lösung, insbesondere für die Eingangsfassade an der Behrenstraße.
„Die Architektur ergab sich aus der Funktion des Hauses. Überflüssiges wurde vermieden, auf große Glasflächen von vornherein aus akustischen und ökonomischen Gründen verzichtet. Lediglich der Haupteingang ist durch einen großen Glaserker betont, dessen kupferne Verkleidung mit ihren Friesen von Prof. Fritz Kühn geschaffen wurde. Eine rhythmisch gegliederte Sandsteinfassade umschließt das ganze Bauwerk. An der Behrenstraße durchdringt sie den Erkervorbau und läßt durch ihre drei Rundbogenöffnungen den dahinterliegenden Treppenhausbau in seiner alten architektonischen Gestalt ahnen. Im Innern – besonders im großen Foyer – sind alte und neue Architektur miteinander konfrontiert. Das sparsam verteilte Mobiliar – Tische und blauviolett bezogene Stühle – hat Prof. Fritz Kühn entworfen. Zwei Gobelins vom Hallenser Künstlerehepaar Rataiczyk behandeln die Liebe, eines der Grundmotive der Oper. Besonders hervorzuheben ist noch die Renovierung des Zuschauerraumes, der unter Beibehaltung der alten Platzzahl ein neues Gestühl erhielt und farblich so erneuert wurde, daß die neubarocke Dekoration von 1892 gleichsam einen Hauch aus unseren Tagen verspüren läßt.“ [Zitat: Deutsche Architektur 16. 1967, S. 666ff].

Die Baumaßnahmen umfassten neben der neuen Umbauung v.a. eine Vergrößerung des Bühnenhauses durch Seitenbühnen, die Einrichtung einer Probebühne und den Neubau eines Funktionsgebäudes zur Straße Unter den Linden. Im Gegensatz zu dem Theatersaal im Stil des Wiener Spätbarock mit Hermen, die in das stuckierte Deckengewölbe überleiten und dem stuckierten Treppenhaus von 1947 sind die neuen Räume von 1966 sachlich-schlicht gehalten, im Sinne eines architektonischen Minimalismus. An den fast vollständig geschlossenen, mit Sandsteinplatten verkleideten Fassaden ist nur der Eingangsrisalit an der Behrenstraße, der im oberen Teil großflächig verglast und mit strukturiertem Kupferblech von Fritz Kühn verkleidet ist, gestalterisch herausgehoben. Hinter den Glasflächen sind die drei großen Bogenfensteröffnungen des historischen Theatergebäudes erkennbar. Die geschlossene, ruhige Westfassade liegt an der Glinkastraße, die erst 1965 aus verkehrstechnischen Gründen von der Behrenstraße bis zur Neustädtischen Kirchstraße durchgelegt worden war.

Zu den nachträglichen Veränderungen gehört der 1968 eingefügte überdachte Gang (Casino-Flur) zwischen Zuschauerhaus und Casinobau. 1986-1987 wurde im Zuge einer allgemeinen Gebäudesanierung die Farbgebung im Zuschauersaal erneuert. Zu den weiteren Maßnahmen dieser Zeit gehörten die Instandsetzung der Küche, Maßnahmen an der technischen Gebäudeausrüstung und die Erneuerung von Fenstern.
Bei der umfassenden Fassadeninstandsetzung, einschließlich Wärmedämmung der Fassaden, wurden 1995-1996 neue Sandsteinplatten angebracht und dabei das Plattenraster der Fassaden teilweise verändert.
Eine weitere Veränderung der Gestaltung von Kunz Nierade betraf 2005 die Umgestaltung der Garderoben und der Foyers durch das Architekturbüro Braunfels Architekten.

2.2.3 Baubeschreibung der Komischen Oper Berlin

Fassaden

Seit der Rekonstruktion durch Kunz Nierade präsentiert sich die KOB als blockhaft geschlossener Solitär mit einheitlicher Traufhöhe, überragt lediglich durch den auch in Hinblick auf die Materialität abgesetzten Bühnenturm. Während die Nord- und die Ostfassade glatte ungebrochene Wandfluchten aufweisen, ist an der Südfassade der Haupteingang durch einen leicht in den Straßenraum ragenden Risalit betont.



Abb. 19: Haupteingang der KOB an der Behrenstraße, © Jan Windszus Photography

Am bewegtesten präsentiert sich die Westfassade mit dem weit vor die Hauptfassade ragenden Anbau der westlichen Seitenbühne und einem weniger stark ausgebildeten, gleichwohl prägnanten Fassadenversprung im südlichen Bereich.

Alle Fassaden außer dem Bühnenturm sind mit Sandsteinplatten bekleidet, deren unterschiedliche Breiten ein regelmäßig über die Fassade gelegtes Fugenraster erzeugen, das in der Putzritzung der Bühnenturmfassaden aufgenommen wird.



Abb. 20: Blick am Abend auf die KOB von der Ecke Behrenstraße / Glinkastraße, © Jan Windszus Photography

Je nach Funktionsbereich und Nutzung sind Fensteröffnungen in die glatten Fassaden eingeschnittenen, regelmäßig über die gesamte Länge an der Nordfassade oder beschränkt auf einzelne Geschosse bzw. Fassadenabschnitte an den anderen Fassaden, wodurch eine abwechslungsreiche und spannungsvolle Komposition entsteht. „Die Fassaden sind als Sandstein-Lochfassaden mit knappster Profilierung völlig flächig gehalten und erhalten durch den rhythmisch fortlaufenden Fugenschnitt ihren besonderen architektonischen Reiz. Die Sandsteinverkleidung wird in weißem Gothaer Sandstein vorgenommen.“ [Zitat: Akte Reko KOB Mappe 1 Nr.1 TG, S.4, Archiv Komische Oper, Akte ohne Signatur].

Seit der 1995 durchgeführten Fassadensanierung ist die ehemals ausgewogene und zurückhaltende, gleichwohl spannungsreiche Fassadengestaltung in ihrer Wirkung beeinträchtigt: Sowohl die neu auf eine Wärmedämmung aufgebrachten Sandsteinplatten mit ihrer ausgeprägten Farbigkeit und Musterung, die durch Reduzierung der maximalen Plattenbreite erhöhte Fugenzahl als auch die aufgrund der Wärmedämmung vergrößerte Tiefe der Fensterleibungen stehen dem bauzeitlich intendierten ruhigen, flächig und blockhaft wirkenden Erscheinungsbild entgegen.

Raumbereiche
Um den zu erhaltenden Zuschauersaal mit angrenzenden Umgängen, dem südlich gelegenen Haupttreppenhaus sowie den seitlich angeordneten Nebentreppenhäusern gruppierte Nierade verschiedene Funktionsbereiche:

Im sogenannten Zuschauerhaus sind dem Saal nach Süden, zur Behrenstraße hin, Garderoben und Foyers sowie Sanitär- und Funktionsräume vorgelagert.

Das sogenannte Bühnenhaus besteht aus dem Bühnen-, dem Probebühnen- und dem Garderobentrakt. Östlich des Zuschauerhauses liegt der Probebühnentrakt, mit Casino- und Küchenbereich für die Mitarbeiter im EG und den darüber angeordneten Probebühnen entlang der Südfassade die kleine Probebühne und nördlich anschließend die große Probebühne. Der Bühnentrakt umfasst die an den Zuschauersaal angrenzende Hauptbühne, die westliche Seiten- und die bereits 1955 errichtete, 1966 in ihrer Höhe reduzierte westliche Magazin-Seitenbühne. Nach Osten folgen die östliche Seitenbühne und Magazinräume.

Nördlich des Bühnentraktes, angelagert an einen langen Flur und über drei Treppenhäuser erschlossen, erstreckt sich entlang der gesamten Nordfassade der viergeschossige Garderobentrakt mit Garderoben, Masken- und Kostümbildnerräumen.

Zuschauerhaus
Der Haupteingang zur KOB befindet sich im Bereich des vor die Südfassade vorgezogenen Erkers. Über eine durch Wandscheiben in drei Zugangsbereiche getrennte Außentreppe gelangt man in die Eingangshalle mit den Zuschauerkassen, von wo aus bis zum Umbau 2005 durch Braunfels Architekten der Durchgang in die seitlich gelegenen Garderoben möglich war.





Abb. 21 und 22 Foyer auf der Ebene Umgang des zweiten Rangs, Fotos von 1967

Von diesen aus oder direkt vom Eingangsbereich betritt man das nach einem Bombenschaden 1947 in veränderter Gestalt wiederaufgebaute Haupttreppenhaus. Der erste Treppenlauf führt zum Umgang des ersten Rangs, über die im Folgenden zweiarmig angelegte Treppenführung gelangt der Zuschauer zum an der Südfassade angelagerten Foyer und von dort zum Umgang des zweiten Rangs.

An die Gestaltung dieses südlich des Zuschauersaals gelegenen Eingangs- und Empfangsbereichs knüpfte Nierade einen besonderen gestalterischen Anspruch: „Denn das architektonische Hauptproblem war, in geschickter Weise die neue Architektur mit der alten zusammenzufügen und gewissermaßen die richtige Nahtstelle zu finden.
Der Verfasser legte sie ins Foyer. Das alte Treppenhaus wurde durch die umgebende sachliche Architektur des Foyers gleichsam neu gefasst und in seinem Wert gesteigert. Von diesem Foyer war dann die die Verbindung zum alten Zuschauerraum von selbst gegeben.“ [Zitat: Deutsche Architektur 16.1967, S. 667].
An originaler Ausstattung erhalten sind die Kreisloch-Plattendecke sowie hinter der derzeit vorhandenen Spiegelbekleidung die originale Wandgestaltung von 1966 mit den die Fugenteilung der Fassaden in Form von Putznuten aufnehmenden Gliederung. Die aus Mahagonistäben gefertigten Heizkörperverkleidungen, die von Fritz Kühn gestalteten Möbel sowie die beiden vom Künstlerpaar Rataiczyk gefertigten Gobelins sind nicht mehr vorhanden.



Abb. 23: Foyer auf der Ebene des Umgangs des zweiten Rangs, Foto von 1967



Abb. 24: Foyer heute, Ebene Umgang des zweiten Rangs, © Jan Windszus Photography

Der Zuschauersaal ist in seiner Gestaltung weitgehend von 1892/1928 erhalten, lediglich im Bereich des Proszeniums wurden 1966 die bereits 1962 veränderten und in ihrer Schmuckgestaltung stark vereinfachten Logenöffnungen nochmals neu gestaltet. Zudem wurden die vorhandenen Wandleuchten umgestaltet und die Raumfassung von 1947/1962 zugunsten einer Vereinfachung und Annäherung an eine moderne Gestaltung verändert: „Im Zuschauersaal kam es lediglich darauf an, durch entsprechende Farbgebung und Zurückdrängung der zu starken Vergoldung eine unserer Zeit gemäßere Atmosphäre zu erzielen und die figürliche Dekoration ansehnlich zu machen.“ [Zitat: Deutsche Architektur 16.1967, S. 667].

Bei der 1986-87 erfolgten Instandsetzung des Zuschauersaals wurde diese zurückhaltende Farbgebung aus dem Jahr 1966 zugunsten einer in abgestuften Farbtönen gehaltenen Fassung mit wieder stärkerem Vergoldungsaufwand aufgegeben.



Abb. 25: Zuschauersaal heute, © Gunnar Geller

Während der zum Zuschauersaal durch Bogenstellungen geöffnete Umgang des zweiten Rangs in seiner Stuckgliederung von 1892 erhalten ist, entschied sich Nierade bei den Umgängen im Parkett und im ersten Rang für eine Neugestaltung. Die an der Umgang-Innenwand angeordneten offenen Garderoben wurden zu Technikräumen umgebaut und alle Wände entstuckt und als glatte Putzflächen erneuert. Lediglich das Profil des Deckengesimses wurde übernommen und an den neu hinzugekommen Wandbereichen ergänzt.
An das nördliche Ende der Umgänge im ersten und zweiten Rang schließen sich die Rangtreppen an: Die Treppen zum zweiten Rang aus der Erbauungszeit 1892 sowie die im Zuge der Umbaumaßnahmen durch Alfred Grenander 1928 in die bestehenden Treppenläufe eingesetzten Treppen zum ersten Rang sind in der originalen Ausstattung erhalten. Mit ihrer monochrom weißen Farbfassung haben diese Rangtreppen den Anspruch Nierades nach einer zeitgemäßen Gestaltung der historisch überlieferten Architektur bewahrt.

Bühnenhaus
Im Bühnenhaus, dem nicht-öffentlichen Teil des Opernhauses, sind das an der Behrenstraße gelegene Casino und der anschließende Klubraum die beiden Raumbereiche mit der aufwändigsten Gestaltung. Mit der Kreisloch-Plattendecke, dem Bodenbelag aus Narsdorfer Klinkern und der Sitzbank entlang der Fensterfront sind im Casino prägende Gestaltungselemente aus der Erbauungszeit erhalten. Auch im angrenzenden Klubraum sind Decke und Wandpaneel von 1966 noch vorhanden. Beide Räume waren zur Erbauungszeit vom Bühnen- und Garderobentrakt nur über den Innenhof zugänglich, erst mit Anbau des sogenannten Casino-Flurs 1968 konnten sie ohne Austritt in Freie erreicht werden. Die sonstige Gestaltung im Bühnenhaus „ist schlicht und sachlich. Jeder besondere Aufwand wird vermieden." [Zitat: Akte Reko KOB Mappe 1 Nr.1 TG, S.10, Archiv Komische Oper, Akte ohne Signatur]. Nördlich an Casino und Klubraum schließen sich Küchen- und Werkstatträume an.

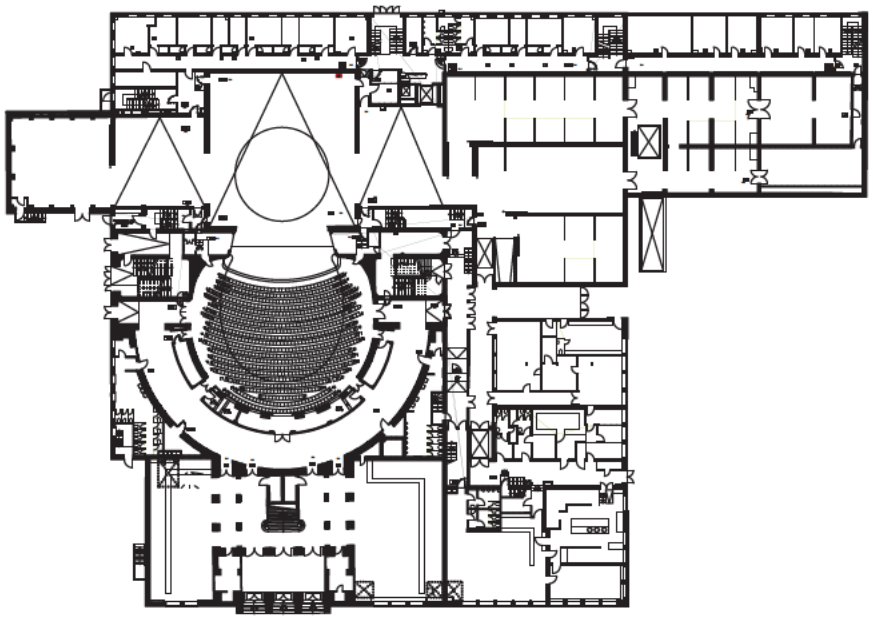


Abb. 26: Grundriss Bestand, 1. OG

Über ein nördlich des Casinos angeordnetes Treppenhaus erfolgt im 1. bzw. 2. OG der Zugang zu den beiden Probebühnen, deren Raumvolumen sich bis ins 3. OG erstreckt. In die große Probebühne ist eine Regie- und Beleuchtergalerie eingefügt, deren Räume ebenfalls über oben genanntes Treppenhaus zugänglich und in ihrer schalltechnischen Ausstattung noch weitgehend original erhalten sind. Auch die Gestaltung und Ausstattung der Probebühnen ist weitgehend original erhalten, lediglich die zwischen die Deckenträger eingehängten Paneele wurden zwischenzeitlich in veränderter Materialität und Gestaltung erneuert.
Die Raumbereiche des Bühnentraktes mit Hauptbühne, Nebenbühnen und Magazinräumen sind über axial angeordnete große Wandöffnungen in West-Ost-Richtung miteinander verbunden. Der Zugang zu den Arbeitsbühnen der Hauptbühne erfolgt über die beiden noch aus der Erbauungszeit 1892 stammenden Treppenhäuser am Übergang von Zuschauer- zu Bühnenhaus sowie über zwei in den nördlichen Ecken der Hauptbühne angeordnete Wendeltreppen. Auch in diesen Raumbereichen haben seit 1966 keine maßgeblichen Veränderungen an der Raumgestaltung stattgefunden, lediglich die Bühnentechnik wurde zwischenzeitlich marginal erneuert. In den Magazinräumen wurde inzwischen ein Großteil der stählernen Trennwand-Einbauten entfernt.

Nördlich des Bühnentraktes erstreckt sich über die gesamte Länge der Nordfassade der Garderobentrakt. An einen innenliegenden Flur schließen sich nach Norden über vier Geschosse die Garderoben- und Masken- bzw. Kostümbildnerräume an, deren bauzeitliche Ausstattung von 1966 mit Schminktischen, Schränken, Leuchten und Vorhangblenden teilweise noch vorhanden ist. An Sondernutzungen ist im westlichen Bereich des Garderobentrakts, der über zwei Geschosse reichende, mit ansteigenden Sitzreihen versehene Chorprobensaal angeordnet. Deren originale Ausstattung ist ebenfalls teilweise noch erhalten. Im östlichen Bereich des Garderobentrakts über den Magazinräumen befinden sich Lager- und Fundusräume. Von einem 1966 geplanten Ballettsaal haben sich keine Spuren erhalten. Die Erschließung des Garderobentrakts erfolgt über drei vom Keller- bis ins 3. OG reichende Treppenhäuser. Das in der Mitte gelegene Haupttreppenhaus zeichnet sich durch breiter angelegte Treppenläufe und Podeste aus. Der bauzeitliche Charakter der Treppenhäuser wie der innenliegenden Flure ist weitgehend erhalten, lediglich die Deckenpaneele und die Bodenbeläge der Flure wurden zwischenzeitlich in verändertem Material und veränderter Gestaltung erneuert. Von den die Flure prägenden Holztüren sind die meisten erhalten, ebenso die meisten der in deutlich geringerer Anzahl vorkommenden Stahltüren. An vielen Türen finden sich auch noch die originalen Beschläge.

Konstruktion

Wände und Decken
Die KOB ist in weiten Teilen als Massivbau errichtet. Die Wände des von 1892/1928 erhaltenen zentralen Bereichs mit Zuschauerraum, Umgängen und Rangtreppen sind aus Ziegeln gemauert, die Decken sind nach damaligem Verständnis „feuersicher“ gestaltet und bestehen aus flach gemauerten Kappen zwischen Stahlträgern. Die Stuckdecken der Rangtreppen und vermutlich auch des Zuschauersaals sind als Rabitzdecken mit Drahtstäben von diesen Kappendecken abgehängt.

Die 1966 neu errichteten Bereiche des Opernhauses sind ebenfalls weitgehend mit Wänden aus Ziegelmauerwerk und massiven Decken versehen, genannt werden Ackermanndecken, Stahlbetondecken und Stahlbetonhohldielen. Lediglich die Umfassungswände der großen Probebühne sind durch eine Stahlkonstruktion ausgesteift. Die Treppen sind monolithisch aus Stahlbeton gefertigt, Tritt- und Setzstufen sind mit Fertigteilwinkelstufen aus Kunststein bekleidet.

Dächer
Der Dachstuhl über dem Zuschauerraum und dem Proszenium von 1892 ist erhalten: Genietete Fachwerkbinder überspannen den Raum von West nach Ost, die Untergurte geben die Kontur des Saalgewölbes vor. In Querrichtung verlaufende Träger zwischen den Untergurten der Binder bilden das Auflager für die gemauerten Deckenkappen. Die auf die Obergurte aufgelegten Träger dienen als Auflager für hölzerne Sparren und Dachschalung.

Der Dachbereich über dem Haupttreppenhauses wurde durch einen Bombentreffer zerstört und 1947 wieder aufgebaut. Hier finden sich im Dachraum in Nord-Süd-Richtung verlaufende Nagelbrettbinder, von denen vermutlich das in veränderter Gestalt erneuerte Rabitzgewölbe abgehängt ist und die bis zum Umbau 1966 das Auflager für ein Holzdach darstellten.

Die 1966 erneuerten bzw. neu errichteten Dächer sind weitgehend mit massiver Dachdecke ausgebildet, entweder mit Stahlbetonhohldielen über Stahlträgern oder als Stahlbeton(-rippen)decken. Lediglich über den beiden Probebühnen sind Dreiecksbinder aus Stahl mit shedartigem Zuschnitt verlegt, die Schalung ist auf Stahlpfetten aufgelegt.

Anlieferung, Hotel (Altbau 4)
Der Gebäudeflügel wurde 1985 östlich am Bühnenhinterhaus benachbart zum Hotel als massiver Betonbau ergänzt. Der Gebäudetrakt wird überwiegend für die Anlieferung und Lagerung von Bühnenbauteilen und Materialien für den Spielbetrieb genutzt. Auf dem Dach betreibt das benachbarte Hotel aktuell einen Dachgarten mit Tagungssaal.
Der Gebäudeteil soll weitgehend nicht mehr durch die KOB genutzt werden.

Baulicher Zustand
Die Gebäude der KOB befinden sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand mit einem großen Instandhaltungsrückstau.
In den Untergeschossen zeigen sich deutliche und voranschreitende Feuchteschäden. Zusätzlich sind im gesamten Gebäudekomplex Rissbildungen vorzufinden, die auf zwischenzeitlich geänderte Baugrund-/ Grundwasserverhältnisse (z.B. auch durch den U-Bahn-Bau) schließen lassen.
Die Raumausbauten, Türanlagen, Wandoberflächen und die Ausstattung sind größtenteils alters- und nutzungsbedingt verschlissen.

Der überwiegende Teil der Technischen Anlagen, der Sicherheits- und Betriebstechnik und der Bühnentechnik befinden sich auf dem Stand von 1965.

Aktuell müssen bereits vorgezogene Maßnahmen zur Sicherung eines Spielbetriebs bis zum Beginn der Gesamtsanierung durchgeführt werden. Im gesamten technischen und nichttechnischen Ausbau sind zum Teil Schadstoffquellen aus bauzeittypischen Materialien (Asbest, KMF, PAK, Schwermetalle etc.) vorzufinden, die zwingend im Rahmen einer Gesamtsanierung planerisch begleitet und beseitigt werden müssen.

2.3 Das Wettbewerbsgebiet

Die KOB befindet sich auf mehreren Grundstücken (siehe Lageplan), welche im Süden durch die Behrenstraße, östlich durch das Westin Grand Berlin Hotel und westlich durch die Glinkastraße begrenzt werden. Nördlich befindet sich das Funktionsgebäude Unter den Linden, das künftig nicht mehr Bestandteil der KOB sein wird. Der Altbau 4 im Osten ist zum überwiegenden Teil nicht Bestandteil des Wettbewerbs. Die Bearbeitungsgrenze verläuft auf der Achse „I“ durch das gesamte Gebäude und über alle Etagen. Der davon östliche Gebäudeteil wird einer anderen Nutzung zugeführt werden und soll weiter bestehen bleiben.

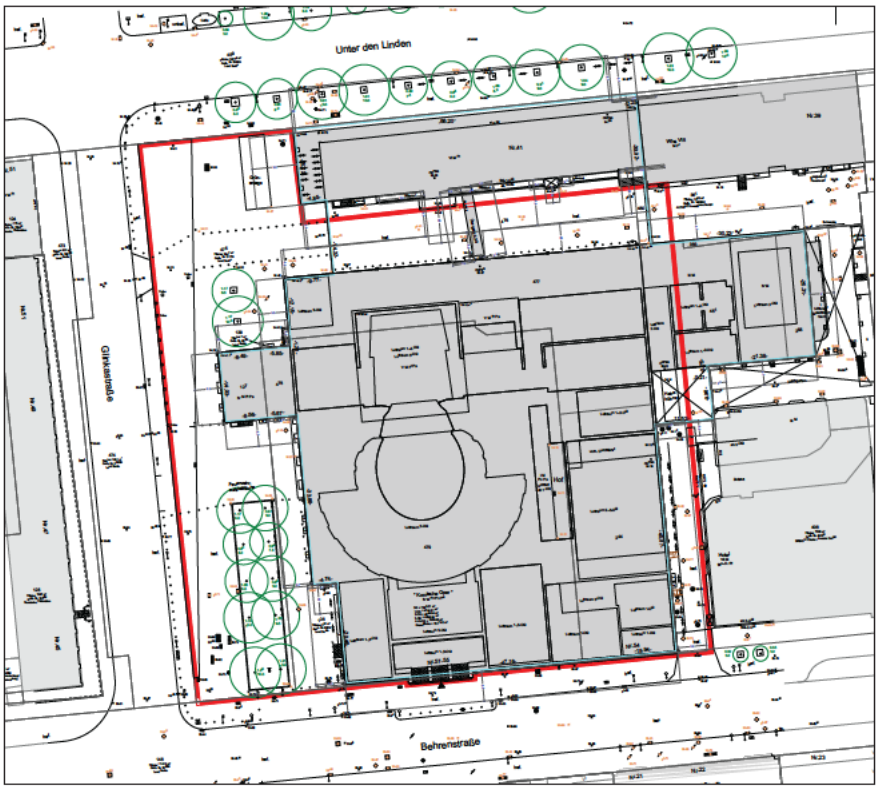


Abb 27: Ausschnitt Vermesserplan, Wettbewerbsgebiet rot umrandet

Gegenwärtige Nutzung
Die KOB wird vollständig als Operngebäude genutzt.

Zwischennutzung
Die KOB wird die Gebäude vor Baubeginn räumen und für die Dauer der Bauzeit in eine Ersatzspielstätte (z.B. Schillertheater) umziehen. Das EG des Funktionsgebäudes soll auch während der Baumaßnahme mit der Opernkasse/ dem Besucherservice an der Straße Unter den Linden belegt bleiben, ebenso die dort benachbarte Fremdvermietung. Somit steht

das EG des Funktionsgebäudes nicht als Baustelleneinrichtung etc. zur Verfügung. Vor Baubeginn wird eine externe Medienversorgung Unter den Linden und eine medientechnische Trennung zum benachbarten Hotel umgesetzt werden.

Eigentümer
Die Flurstücke 41, 127, 128, 129, 244, 255, 361, 363, 475 und 476 bis 481 befinden sich im Eigentum der Stiftung Oper in Berlin.
Das Flurstück 406 ist im Eigentum des Hotels Westin Grand Berlin. Die Einfahrt von der Behrenstraße ist für die KOB über eine eingetragene Grunddienstbarkeit gesichert.



Abb. 28: Schaubild, rot: Gebäude KOB, Eigentum Land Berlin / Stiftung Oper,
dunkelgrau: Funktionsgebäude (Rückgabe), blau: Westin Grand Berlin Hotel

Baugrund / Grundwasser
Es liegt ein vororientierender Bericht über die geologischen Untergrundverhältnisse und die daraus resultierende Gründungssituation vom 26.08.19 vor (siehe digitale Anlagen).
Die Beprobung der Altlasten hat ergeben, dass von einer Bodenbelastung von > Z2 auszugehen ist.

Der Grundwasserspiegel lag bei der Untersuchung bei 30,70 m ü.NHN, der zu erwartende höchste Grundwasserstand (zeHGW) liegt bei 31,60 m ü.NHN.

Kampfmittel
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand gibt es keinen Hinweis auf eine von Kampfmitteln ausgehende konkrete Gefahr.
Das Vorkommen von Kampfmitteln kann jedoch nie verbindlich und völlig ausgeschlossen werden.

2.4 Technische Infrastruktur

Das Gebäude ist an das öffentliche Ver- und Entsorgungsnetz der Wasserbetriebe angeschlossen.
Die Versorgung mit Wärme erfolgt über einen Fernwärmeanschluss durch Vattenfall.

Die vorhandenen Hausanschlüsse für Wasser, Fernwärme, Elektro und Telekommunikation müssen entsprechend den erweiterten Leistungsvorgaben sowie dem Stand der Technik und Normierung erneuert und/oder ertüchtigt werden.
Zusätzlich müssen die Gebäudeteile KOB Altbau 1 - 4 und das alte Funktionsgebäude an der Straße Unter den Linden sowie das benachbarte Hotel medientechnisch getrennt und einzeln neu versorgt werden. Hierzu sind im Vorfeld der Sanierungsarbeiten Medienumverlegungsmaßnahmen im Baufeld durchzuführen. Dies gilt auch für die Leitungen, die sich im Bereich des Baufeldes für den Neubau befinden.

2.5 Erschließung

Übergeordnete Erschließung
Das Grundstück liegt im historischen Berliner Stadtzentrum. Alle umgebenden Straßen sind Verkehrsachsen, die sowohl mit der Innenstadt West als auch mit dem historischen Zentrum sehr gut verbunden sind.

Öffentlicher Nahverkehr - S- und U-Bahn
Die KOB kann durch zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel, wie U- und S-Bahn sowie Bussen erreicht werden.

In unmittelbarer Nähe befinden sich die U- und S-Bahn-Stationen Brandenburger Tor und der Bahnhof Friedrichstraße. Zusätzlich wird aktuell in unmittelbarer Nähe eine neue U-Bahn-Linie Unter den Linden fertiggestellt.

Hauptzugang
Der Haupteingang/ öffentliche Zugang der KOB befindet sich an der Behrenstraße und wird dort auch verbleiben. Einfahrten und Nebeneingänge sind an der Behrenstraße und an der Glinkastraße vorgesehen und zum Teil auch schon jetzt vorhanden.

Anlieferung / Logistik
Die Anlieferung der KOB erfolgt von der Behrenstraße zwischen dem Westin Grand Berlin Hotel und der KOB. Die Zufahrt wird gemeinsam mit dem Hotel genutzt. Die Hoteltiefgarage und Anlieferung im rückwärtigen Bereich wird über die Zufahrt angebunden. Es ist ein Wegerecht für die KOB als Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen und gesichert, d.h. der Weg kann weiter zur Anlieferung, Feuerwehr und Fluchtweg genutzt werden.

Auf dem Hof im Norden befinden sich PKW-Stellplätze und Fahrradstellplätze für die Mitarbeiter der KOB. Die Zufahrt erfolgt von der Glinkastraße.

Baum- und Gehölzbewuchs
Die auf der Freifläche an der Glinkastraße vorhandenen Bäume müssen aufgrund des zu errichtenden Neubaus entfernt werden. Sonstiger Baum- und Gehölzbewuchs ist nicht vorhanden. Es gilt die Baumschutzverordnung des Landes Berlin.

2.6 Planungs-, Bauordnungs- und Denkmalrecht

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan (FNP) weist eine gemischte Baufläche aus.

Planungsrecht
Es liegt kein Bebauungsplan (B-Plan) vor. Die Zulässigkeit des Bauvorhabens wird nach § 34 BauGB entschieden. D. h. das Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.
Das Rücksichtnahmegebot ist zu wahren.

Bauordnungsrecht
Der Planung ist die Bauordnung des Landes Berlin (BauOBln, www.stadtentwicklung.berlin.de.service/gesetzestexte/de/bauen.shtml) in der aktuellen Fassung zugrunde zu legen.
Es gilt die Abstandsfläche von 0,4 h.

Aufbauten oder Technikgeschosse müssen innerhalb der bestehenden Abstandsflächen bleiben.

Baugestaltungsverordnung Historisches Zentrum
Für den Wettbewerbsbereich gibt es die „Verordnung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen an der Straße Unter den Linden, auf der Museumsinsel und im Bereich des Gendarmenmarktes“ (Baugestaltungsverordnung Historisches Zentrum) vom 21. August 2009.

Für die vorliegende Wettbewerbsaufgabe ersetzen die formulierten denkmalpflegerischen und städtebaulichen Festlegungen die Inhalte der Baugestaltungsverordnung.

Denkmalschutz
Die Liegenschaft ist als Teil des Denkmalensembles Dorotheenstadt, das Gebäude der Komischen Oper ist als Einzeldenkmal in die Denkmalliste eingetragen.

Das Theater „Unter den Linden“, „Metropoltheater“, heute „Komische Oper“ (1891/92) ist als Baudenkmal in die Denkmalliste eingetragen: OBJ-Nr.: 09065009 (Hauptgebäude), 09096001 (Funktionsgebäude)

Denkmalpflegeplan
Der Denkmalpflegeplan (siehe Auszug in digitaler Anlage) für die KOB beinhaltet eine detaillierte denkmalpflegerische Bewertung der Gebäudehülle und der Innenräume des Operngebäudes und stellt ein wesentliches Instrument für einen zukünftigen denkmalgerechten Umgang mit der Gebäudeanlage dar.

Die konzeptionellen Empfehlungen zum denkmalgerechten Umgang mit dem Gebäude der KOB begründen sich aus der Geschichte und dem vorgefundenen Bestand.



Abb. 29: Ausschnitt Denkmalkarte Berlin

Bei notwendigen baulichen Anpassungen dient der Denkmalpflegeplan als Rahmenplan.

Bei allen Maßnahmen sind insbesondere die folgende Denkmalwerte zu berücksichtigen:

Denkmalwert Stadtbild
Neubau und Rekonstruktion der KOB 1964-1966 unter der Leitung des Architekten Kunz Nierade waren vor allem darauf gerichtet, eine moderne Spielstätte für das Opernensemble zu schaffen, die im prominenten Stadtraum Unter den Linden / Behrenstraße als eigenständiges
Operngebäude, als Solitär wahrgenommen wird. Die neue Umbauung des historischen Theatergebäudes zeichnet sich in der Außenarchitektur durch eine klare Formensprache des kompakten Baukörpers mit den glatten Sandsteinoberflächen der Fassaden ab. Über seine gestalterische Lösung schrieb Kunz Nierade: „Große fast fensterlose Flächen der Fassaden ergaben sich von innen. Infolgedessen lag es nahe, den ganzen Baukörper mit großen ruhigen Flächen in Kontrast zu den stark perforierten Fassaden der Lindenbebauung zu setzen.“1

In der Außenarchitektur sind Zuschauerhaus, Garderoben- und Probebühnentrakt sowie die westliche Seitenbühne von 1955 ganz bewusst gestalterisch zusammengefasst.
Funktionsbedingt erfährt das Opernhaus mit dem Bühnenturm eine Baukörperstaffelung.
Mit der blockhaften, gezielt durch Fassadenversprünge belebten Baukörpergestalt sowie der kontrastierenden Gestaltung zwischen geschlossener Natursteinbekleidung, wenigen akzentuiert eingesetzten Fassadenöffnungen und dem verglasten Eingangsrisalit entsteht die solitäre Wirkung zur umgebenden Bebauung. Die Solitärwirkung der Komischen Oper im Stadtbild hat eine hohe denkmalpflegerische Bedeutung.

Denkmalwert Fassaden

In der Baubeschreibung von 1964 heißt es: „Die Fassaden sind als Sandstein-Lochfassaden mit knappster Profilierung völlig flächig gehalten und erhalten durch den rhythmisch fortlaufenden Fugenschnitt ihren besonderen architektonischen Reiz. Die Sandsteinverkleidung wird in weißem Cottaer Sandstein vorgenommen.“2

Die ursprüngliche Vorgabe für Kunz Nierade war der Erhalt der neuklassizistischen Fassadengestaltung von 1947 an der Behrenstraße. Die überlieferten Archivzeichnungen zeigen den Entwurfsprozess und das gestalterische Ringen des Architekten um eine angemessene Lösung, insbesondere für die Eingangsfassade an der Behrenstraße, die schließlich anstelle der neuklassizistischen Giebelfront einen leicht vor die Fassade tretenden, durch klare Linien gekennzeichneten Eingangsrisalit erhielt. Die Sandsteinfassade von 1966 umschließt das ganze Bauwerk und durchdringt an der Behrenstraße den Eingangsvorbau.

Hier verweisen die von außen sichtbaren drei Rundbogenöffnungen auf das dahinterliegende historische Treppenhaus. Die Hauptfassade an der Behrenstraße und der Haupteingang mit dem Stahl-Glas-Risalit und den kupfernen Friesen von Fritz Kühn kann als eine für diese Zeitepoche besondere Gestaltungsleistung gewertet werden. Nierade ist mit dieser Gestaltung eine zeitgemäße Transformation des Bauwerks aus dem späten 19. Jahrhundert gelungen.

Die ruhige Gesamtwirkung wird auch an der Nord- und Westfront mit der gleichmäßigen Reihung der Fenster für den Garderobentrakt und den anschließenden Bereich im Zuschauerhaus beibehalten.

Denkmalwert Innenräume

Im halbrunden Zuschauersaal mit den zwei hufeisenförmigen Rängen ist die neubarocke Raumgestaltung der Architekten Fellner und Helmer von 1892 mit der Spiegeldecke, den aufwändigen Stuckornamenten und 18 Hermenplastiken mit verschiedenen Attributen zu Theater und Musik weitgehend erhalten. Die 1966 als „zeitgemäß“ bezeichnete Wiederherstellung des historischen Zuschauersaales und die Teilveränderung der Umgänge und des Haupttreppenhauses nach modernen Gesichtspunkten hat eine ganz eigenständige architekturhistorische Bedeutung und ist ein einmaliges Zeugnis für den adaptiven Umgang von Architekt Kunz Nierade und dem Maler Hans Kinder mit der Architektur und Kunst des Historismus.

Im Haupttreppenhaus überlagern sich die Raumgestaltungen von 1892 / 1947 und von 1966.

Die Inszenierung der historischen Architektur des Treppenhauses im neuen Foyer ist ein Höhepunkt in der Raumgestaltung 1966 von Kunz Nierade. „Das alte Treppenhaus wurde durch die umgebende sachliche Architektur des Foyers gleichsam neu gefasst und in seinem Wert gesteigert.“

An den Arkadenstellungen wurde die Stuckfassung nach dem vorhandenen Vorbild des Treppenhauses erneuert bzw. ergänzt, der gestalterische Zusammenhang wurde durch eine helle Farbfassung erreicht.

2005 erfolgte die Umgestaltung durch Braunfels Architekten mit der vorgehängten wandhohen Spiegelbekleidung.

Unter den reversibel eingebauten Oberflächen ist die dem Minimalismus verpflichtete Raumgestaltung von 1966 noch erhalten: Nierade hat bewusst von der Fassade in das große Foyer hineingestaltet und das Fugenraster der Sandsteinbekleidung auf die Stuckwände mittels einge-

tiefter Nuten übertragen. Von 1966 erhalten ist zudem die abgehangene Lochplattendecke aus Gipsstuck (farblich überfasst), der Boden hatte bereits 1966 einen roten Teppichbelag. Die Kristallkugelleuchten stammen ebenfalls noch aus der Bauzeit 1966.
Eine besondere Herausforderung für den Um- und Neubau unter Kunz Nierade war die Gestaltung des Schnittpunktes zwischen historistischer Architektur des bestehenden Gebäudes von 1892 und der neuen Architektur von 1966. Nierade hat das Foyer als „richtige Nahtstelle“ zwischen historischer und neuer Architektur bezeichnet: „Foyer und Erfrischungsräume bilden eine räumliche Einheit, in deren Mitte das alte Treppenhaus in seiner alten Architektur hell ausgeleuchtet ganz und gar weiß drinsteht, umgeben von taubenblaugrau gehaltenen Stuckwänden, die durch Nuten im Maßstab der Versprossung der Spiegelwände unterteilt sind.“
Die Innenarchitektur von 1966 ist von einem dem „Minimalismus“ verpflichteten Gestaltungswillen geprägt, der in den neuen Haupträumen sehr konsequent und überzeugend durch die Auswahl von wenigen Materialien für Fußböden, Wände und Decken umgesetzt wurde.

Teil 3 Wettbewerbsaufgabe

3.1 Das Opernhaus - Komische Oper Berlin

Die Komische Oper Berlin steht für vielseitiges, zeitgemäßes und innovatives Musiktheater mit Sinn und Sinnlichkeit. Musiktheater heißt an der Komischen Oper Berlin immer auch Ensemble-Theater, das auf die musikalische sowie auf die darstellerische Seite gleichermaßen höchsten Wert legt. Nicht nur in künstlerischer, sondern vor allem auch in organisatorischer und kommunikativer Hinsicht setzt sich die Komische Oper Berlin Innovation im Sinne eines modernen Managements zum Ziel. Und schließlich begreift sich die Komische Oper Berlin als weltoffenes und bürgernahes Opernhaus, dessen Türen allen Besucher*innen offenstehen.

Am 23. Dezember 1947 eröffnete der Regisseur Walter Felsenstein die Komische Oper in dem Gebäude des ehemaligen Metropol Theaters. Bis heute stellt die Gründung der Komischen Oper einen einzigartigen Akt dar, da weder Adelige noch Bürger*innen, sondern ein Regisseur das Opernhaus ins Leben rief. Dies prägt bis heute die Tradition und das Profil des vornehmlich von Künstlerintendant*innen geleiteten Hauses.

Der Name Komische Oper bezieht sich auf die Pariser »opéra comique«, ein Genre, das mit seinen bürgerlichen Held*innen und gesprochenen Dialogen im Gegensatz zur höfischen »opera seria« als volksnah und unmittelbar verständlich galt. Felsensteins Konzept des realistischen Musik-Theaters, in dem musikalische und szenische Ebene als sich bedingende Komponenten einer Einheit verstanden werden, wirkte stilbildend nicht nur für die folgenden Intendantengenerationen des Hauses (Joachim Herz, Werner Rackwitz, Albert Kost mit Chefregisseur Harry Kupfer und Andreas Homoki), sondern auch für den gesamten internationalen Opernbetrieb des 20. Jahrhunderts.

Das Repertoire umfasst seither die gesamte Bandbreite musikdramatischer Gattungen – von den zentralen Werken der Opernliteratur bis zu Operette und Musical sowie weniger häufig gespielten Bühnenwerken, insbesondere aus dem osteuropäischen Kulturkreis. Zeitgenössisches stand ebenfalls von Anfang an auf dem Programm, darunter viele Ur- und Erstaufführungen.

Das von Tom Schilling von 1965 bis 1993 geleitete Tanztheater der Komischen Oper, das Felsensteins Maximen eines realistischen Musiktheaters folgte und als das wichtigste Tanztheater der DDR gilt, trug maßgeblich zum internationalen Ruf der Komischen Oper bei.

Anfang der 2000er Jahre wurde auf politischen Wunsch die Tanzsparten der Deutschen und der Komischen Oper Berlin zusammengelegt und 2004 dafür das Staatsballett Berlin gegründet. Zur gleichen Zeit wurde die Stiftung Oper in Berlin als eine Stiftung des Öffentlichen Rechts gegründet. Sie umfasst seither fünf eigenständige Betriebe: die Deutsche Oper Berlin, die Staatsoper Unter den Linden, die Komische Oper Berlin, das Staatsballett Berlin, den Bühnenservicebetrieb sowie das Stiftungsdach. Mit 2.500 fest Beschäftigten und ca. 2000 Gästen und Aushilfen ist die Stiftung Oper in Berlin eine der größten Kulturinstitutionen Europas.

Die Komische Oper ist eine tragende Säule dieser bedeutenden Kulturinstitution.

2012 übernahm der australische Theater- und Opernregisseur Barrie Kosky die künstlerische Leitung und Intendanz der Komischen Oper Berlin. Die für ein Opernhaus ungewöhnliche Vielseitigkeit und Flexibilität (von der klassischen Mozart-Oper bis hin zu Uraufführungen), der Schwerpunkt auf ein durch sorgfältiges Proben gewährleistetes hohes künstlerisches Niveau und die Ensemblepflege bleiben unter dieser Intendanz wichtige Charakterzüge der Komischen Oper Berlin.

Die Identität des Hauses wird allerdings nicht mehr nur in der Tradition Felsensteins begründet, sondern bezieht sich konzeptionell ebenso auf die bisher weniger beachtete, stark von jüdischen – und deshalb nach 1933 verdrängten und kaum wieder ins öffentliche Bewusstsein zurückgeholten – Künstler*innen geprägte Vorkriegstradition des Hauses.

Darüber hinaus öffnet sich das Haus verstärkt internationalen Regisseur*innen und überführt die Idee der Komischen Oper Berlin als ebenso innovatives wie volksnahes Musik-Theater-Haus damit konsequent in das globalisierte 21. Jahrhundert. Felsensteins Anspruch an eine Oper als Musik-Theater, in dem Musik und Szene gleichberechtigte Teile der Inszenierung sind, wird hierbei mit der Forderung nach einem Musik-Theater-Erlebnis verbunden, das alle Sinne des Menschen anspricht.

2013 wurde die Komische Oper Berlin und ihre 430 Mitarbeiter*innen und jährlich bis zu 300 Gastmusiker*innen und -sänger*innen mit der Auszeichnung »Opernhaus des Jahres« der Fachzeitschrift Opernwelt geehrt. Intendant und Chefregisseur Barrie Kosky wurde zudem mit dem International Opera Award 2014 als weltweit bester Opernregisseur ausgezeichnet.

Die Komische Oper erfreut derzeit jährlich über 220.000 Besucherinnen und Besucher (davon ca. 40.000 Kinder) mit ihrem abwechslungsreichen Programm.

Die Komische Oper Berlin war zu unterschiedlichen Zeiten ihres Bestehens eine Schrittmacherin im Feld des internationalen Musiktheaters. In den 1920er Jahren prägte sie als führendes Operetten- und Revuetheater maßgeblich die Berlinerische und damit weltweite Kunst-, Kultur- und Unterhaltungsszene. Das Musiktheater-Konzept Walter Felsensteins revolutionierte nach dem Zweiten Weltkrieg den gesamten europäischen Opernbetrieb und bleibt bis heute ein wichtiger Bezugspunkt für die große Mehrheit der Musiktheaterschaffenden mit Anspruch auf Aktualität.

3.2 Planungsumfang

Die Planung umfasst die Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes bei gleichzeitiger Modernisierung sämtlicher technischer Anlagen und Ausstattungen sowie Optimierung der Funktionsabläufe des Opernbetriebs.

In der ersten Phase des Wettbewerbs ist ein architektonisches Gebäudekonzept zu entwickeln, das einen klaren stadträumlichen, architektonischen und funktionalen Lösungsansatz unter Berücksichtigung der räumlich-funktionalen Anforderungen für die Wettbewerbsaufgabe aufzeigt.

In der zweiten Phase des Wettbewerbs soll unter Berücksichtigung der funktionalen Anforderungen der Entwurf weiterentwickelt werden.

Für die Dauer der Baumaßnahme wird der Spielbetrieb komplett ausgelagert und an einer Ersatzspielstätte (z.B. Schillertheater) aufrechterhalten.

Das Programm umfasst insgesamt ca. 38.000 m² Bruttogrundfläche, davon sind ca. 15.000 m² in Neubauflächen unterzubringen.

Die Gesamtkosten nach DIN 276 betragen 227.000.000,- Euro (brutto) - Stand Februar 2018. Die mit dem Bedarfsprogramm genehmigten Bauwerkskosten (KG 300 und 400) betragen 118.366.200 Euro (brutto).
Das Bauvorhaben wird aus Mitteln des Landes Berlin finanziert.

Der Baubeginn soll 2023 erfolgen. Die Fertigstellung ist für Ende 2029 geplant. Der konkrete Rahmenterminplan wird nach Vorliegen des Wettbewerbsergebnisses erarbeitet werden.

3.3 Städtebaulich-architektonische Zielsetzung

Erwartet wird ein herausragender Entwurf, der die Bedeutung der KOB im Stadtraum zur Geltung bringt.

Es soll eine Gesamtanlage geschaffen werden, die ein neues Markenzeichen und einen Magneten für ein zeitgemäßes und prominentes Opernhaus darstellt. Die architektonische Gestaltung soll der Bedeutung und Qualität des Ortes gerecht werden und das Stadtbild an diesem innerstädtischen Ort aufwerten.

Übergeordnete städtebaulich-architektonische Zielsetzung der Entwurfsaufgabe ist es, das denkmalgeschützte Gebäudeensemble mit den unterschiedlichen Entstehungszeiträumen zu erhalten, mit der Erweiterung den Solitär zu stärken und eine neue Strahlkraft für die KOB zu entwickeln.

Die Erweiterung ist gestalterisch und funktional überzeugend mit dem Altbau zu verbinden und in den Gesamtkontext einzufügen. Das Opernhaus soll als Gesamtanlage wahrnehmbar sein.

Die KOB möchte sich in Richtung Stadt öffnen, Kommunikationsanlässe bieten und das Opernerlebnis bestmöglich ausweiten.

Die Herausforderung der Wettbewerbsaufgabe besteht darin, die geforderte Baumasse mit den Belangen der Denkmalpflege, den planungsrechtlichen und räumlich-funktionalen Anforderungen auf dem zur Verfügung stehenden Grundstück in Einklang zu zubringen.

Die Ausbildung und Gestaltung der Neubebauung im Eckbereich der Straße Unter den Linden / Glinkastraße ist wegen der Besonderheit des Ortes von großer Bedeutung. Der Anschluss an das Funktionsgebäude Unter den Linden soll architektonisch mit Rücksichtnahme auf die Struktur des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes erfolgen.
An der Straße Unter den Linden soll eine Gebäudehöhe von 24 m nicht überschritten werden.

Alle weiteren Gebäudebereiche können eine Höhe bis zu 28 m aufweisen.
Die Abstandsflächen von 0,4 H zur Straßenmitte sind einzuhalten.
Die Hochhausgrenze ist nicht zu überschreiten, d.h. kein Aufenthaltsraum darf mit seiner Fußbodenoberkante mehr als 22 Meter über der Geländeoberfläche liegen.

Zum östlichen Nachbarn Westin Grand Berlin Hotel ist Rücksichtnahme zu wahren. Die bestehende Höhe der östlichen Grenzbebauung im Bereich des Altbaus 3 ist nicht zu überschreiten. Aufbauten oder Technikgeschosse sind in diesem Bereich nicht vorzusehen.

Das Bestandsgebäude der KOB wird den gestiegenen räumlichen, technischen und logistischen Anforderungen an ein zeitgemäßes Opernhaus nicht mehr gerecht. Ziel ist die grundlegende Sanierung und Erneuerung des baulichen und technischen Bestands und die Anpassung an die Anforderungen an einen zukunftsorientierten, nachhaltigen, wirtschaftlichen und ökologisch orientierten Opernbetrieb für Mitarbeiter und ihr Publikum. Hierfür sind umfangreiche räumliche Optimierungen und Neuordnungen der funktionalen und technischen Beziehungen notwendig.

Bei allen Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung sind der angemessene Umgang mit der denkmalgeschützten Substanz von hoher Bedeutung.

Mit der blockhaften, gezielt durch Fassadenversprünge belebten Baukörpergestalt sowie der kontrastierenden Gestaltung zwischen geschlossener Natursteinbekleidung, wenigen akzentuiert eingesetzten Fassadenöffnungen und dem verglasten Eingangsrisalit entsteht die solitäre Wirkung der Komischen Oper zur umgebenden Bebauung. Die flach geneigten Dachflächen der Umbauung Nierades bleiben im Stadtbild unsichtbar und ermöglichen auf diese Weise den kubischen, würfelhaften Charakter des Gebäudes.

- Ausgesprochenes denkmalpflegerisches Ziel ist die Bewahrung der Wahrnehmbarkeit des Bestandsbaus als Solitär. Der Neubau soll daher nur an funktional erforderlichen Stellen (z.B. im nördlichen Bereich

der Bühne u. Funktionsräume und im Bereich Foyer) an den Altbau anschließen. Die Ecke Glinkastraße/Behrenstraße soll räumlich freigespielt werden, so dass das Bestandsgebäude dort als ehemaliger „Solitär“ wahrgenommen werden kann. Eine Höhendifferenzierung zwischen Bestand und Neubau ist erwünscht.

- Die Fassaden des Bestandsgebäudes sollen hinsichtlich Öffnungen, Materialität und Fugenbild auf die Gestaltung der 1960er Jahre zurückgeführt werden.

- Zusätzliche Öffnungen /Durchbrüche oder Veränderungen bestehender Öffnungen in den Bestandsfassaden sind nur im Einzelfall bei funktional unbedingt nötigen Übergängen zwischen Neubau und Bestandsbau denkbar. Gänzlich ausgeschlossen werden zusätzliche Durchfahrten/Öffnungen bzw. Veränderung in der Fassade zur Behrensstraße.

- Ein Rückbau der westlichen Seitenbühne ist aus denkmalfachlicher Sicht vertretbar.

- Erhalt der Baukonstruktion (Außenwände/Dächer) aller Bauteile des Bestandsgebäudes der Bauphasen 1-3 (blau, violett, rot, siehe Bindungskartierung Denkmalpflegeplan).

- Technikflächen auf dem Bestandsgebäude sind so anzuordnen, dass sie das äußere Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen und nicht sichtbar sind.

- Der Anschluss an das Funktionsgebäude Unter den Linden muss architektonisch mit Rücksichtnahme auf die Struktur des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes erfolgen.

- Der Neubau soll sich gestalterisch in die umgebende denkmalgeschützte Bebauung einfügen.

Im Gebäudeinneren ist der Denkmalwert der Komischen Oper Berlin in besonderem Maße in der architektonisch interessanten Überlagerung der beiden Hauptbauphasen 1892-1945 und 1964-1966 begründet. Dazu kommen sichtbare Bauteile aus der Wiederaufbauphase 1946-1947.

- Erhalt / weitgehender Erhalt der Raumstrukturen sowie Konservierung und Restaurierung von Ausstattung, Oberflächen, Farbfassung aus den Bauphasen 1-3 für die Raumbereiche mit denkmalpflegerischer Bindung A und B gemäß Bindungskartierung Denkmalpflegeplan (hellgrün, dunkelgrün)
  D.h. Grundrissänderungen, zusätzliche feste Einbauten sind in diesen Bereichen ausgeschlossen.

- Erhalt und Konservierung der sich überlagernden Raumfassungen von 1892, 1947 und 1966 im Bereich der Haupttreppe ZA und Konservierung/Restaurierung bzw. Wiederherstellung der sachlichen Raumgestaltung von 1966 für Decke, Wände, Boden in den Foyers auf der Grundlage der restauratorischen Befunde.

- Veränderungen der Raumstrukturen für Bereiche mit untergeordneter Bedeutung, Bindung C gemäß Bindungskartierung Denkmalpflegeplan (grau) und damit einhergehende Eingriffe in die Baukonstruktion (Innenwände/Decken) sind möglich.

Ein Abbruch der Dachkonstruktion im östlichen Bereich des Bestandsbaus (d. h. das Dach über dem in Bauphase 3 errichteten östlichen Bauteil) ist möglich.

Der Denkmalpflegeplan hat einen bindenden Charakter, jedoch kann in Einzelfällen immer eine individuelle Lösung mit den Denkmalbehörden abgestimmt werden. Bei notwendigen baulichen Anpassungen dient der Denkmalpflegeplan als Rahmenplan.

Der Bühnenturm muss auf Grund der technischen Anforderungen um mind. 5 m erhöht werden.

Die Haupterschließung für die Besucher soll im Altbau an der Behrenstraße bleiben.
Die unterschiedlichen öffentlichen Zuwegungen von Unter den Linden sind dabei zu berücksichtigen und durch klare, barrierefreie Wegeführungen anzubinden.
Die Anlieferungen müssen logistisch funktional gut ausgebildet sein.

Das vorliegende Raumprogramm mit der Aufteilung der Funktionen in den Alt- und Neubau zeigt eine Möglichkeit, die räumlich-funktionalen Anforderungen der Komischen Oper zu erfüllen.
Es ist Bestandteil der Wettbewerbsaufgabe, eine überzeugende Nutzungsverteilung in Alt- und Neubau aufzuzeigen. Eine sinnvolle Umsortierung der Nutzungen von Alt- und Neubau ist unter Berücksichtigung der räumlich-funktionalen Zusammenhänge möglich.

Die innenräumlichen, atmosphärischen, akustischen und klimatischen Aufenthaltsqualitäten in allen Bereichen für Mitarbeiter und Besucher sowie eine anspruchsvolle nachhaltige gestalterische Umsetzung ökologischer und energetischer Anforderungen sind in der entwurflichen Ausarbeitung von großer Bedeutung.

Abweichungen von den formulierten städtebaulichen und denkmalpflegerischen Belangen müssen stadträumlich, gestalterisch und funktional überzeugend begründet werden und der übergeordneten Zielsetzung dienen.

Aus Kostengründen wurde bisher für den Neubau von nur einem Untergeschoss ausgegangen. Bei Vorschlägen für ein weiteres Untergeschoss ist die Kostenobergrenze einzuhalten.

Es sind keine Bauabschnitte vorgesehen. Die Bauausführung soll aus technischen und wirtschaftlichen Gründen als zeitlich konzentrierte Baumaßnahme durchgeführt werden.

3.4 Raum- und Funktionsprogramm

Das Raumprogramm setzt sich zusammen aus insgesamt 19.937 m² NUF, davon 8.577 m² im Neubau und 11.360 m² im Bestand.
Das Raumprogramm mit Auflistung aller nachzuweisenden Räume ist im Anhang als digitale Anlage als pdf und als Formblatt beigelegt.
Die Tabelle zeigt zum allgemeinen Überblick die übergeordneten Nutzungsbereiche.

Nummer	Nutzung	Nutzungsfläche NUF [m²]
	Neubau	**8.577**
1	Tageskasse, Café, workshop	335
2	Casino	556
3	Öffentliches Café, z. B. mit Dachgarten	505
4	Probebühne 1 und 2	1.283
5	Orchester - Stimmzimmer, Garderoben, Instr.Lager	1.533
6	Chorprobe	224
7 - 8	Probenräume	519
9	Intendanz	260
10	Orchesterleitung	206
11	Dramaturgie	227
12	Szenisch-musikalische Leitung	411
13	Kommunikation	184
14 - 16	Technische Abteilung, Bühnentechnik, Beleuchtung	421
17	Verwaltung	348
18	Hausverwaltung - Teilbereiche	414
19 - 23	Sitzungsräume, Teeküchen, Kopier- u. Druck, WCs	1.151
	Altbau	**11.360**
24	Zuschauerbereich mit Foyer, Zuschauersaal, etc.	1.584
26 - 29	Hauptbühne, Seitenbühnen und Bühnentechnik	5.196
30 - 32	Teilbereiche - szenisch-musikalische Leitung / Dramaturgie / Kommunikation	534
33	Requisite	560
34	Kostüm	1.727
35 - 36	Künstlergarderoben / Maske	846
37	Hausverwaltung - Teilbereiche	642
38 - 39	Nebenräume	271
Summe Nutzfläche Gesamt in m²		**19.937**
TF - N	**Technikfläche Neubau ca.**	1.864
TF - B	**Technikfläche Bestand**	3.318

3.5 Funktionale Anforderungen an den Bestand

Im Rahmen der Erstellung des Bedarfsprogramms wurde auf der Grundlage einer Einpassstudie ein Raumprogramm getrennt nach Altbau und Neubau erstellt.
Die Studie soll lediglich die Anforderungen an die räumlich-funktionalen Zusammenhänge aufzeigen und dient zum besseren Verständnis des Raumprogramms.

Das Raumprogramm des Wettbewerbs spiegelt die Nutzungsverteilung im Altbau und Neubau entsprechend der Einpassstudie wieder. Die Pläne sind im digitalen Anhang dokumentiert (pdf-Format). Die Nutzungen sind gemäß Raumprogramm gekennzeichnet.

Für den Altbau zeigt die Einpassstudie die funktionsgerechte Raumanordnung und die für die Arbeitsabläufe der KOB sinnvollen Zuordnungen der Raumnutzungen. Mehrere Funktionen des Altbaus sind bereits durch die vielen unveränderlichen Nutzungen in den Bühnen-, Zuschauer-, Garderoben- und Magazinbereichen vorgegeben.

Der Altbau gliedert sich in folgende Funktionen:

Altbau 1 - Bühnenhaus mit Zuschauersaal, Foyers, Hauptbühne, Bühnenturm
Altbau 2 - Bühnenhinterhaus mit Künstlergarderoben, Werkstätten, Technikräumen
Altbau 3 - Montagehalle, Magazinen, Werkstätten, Lagern
Altbau 4 - Anlieferung

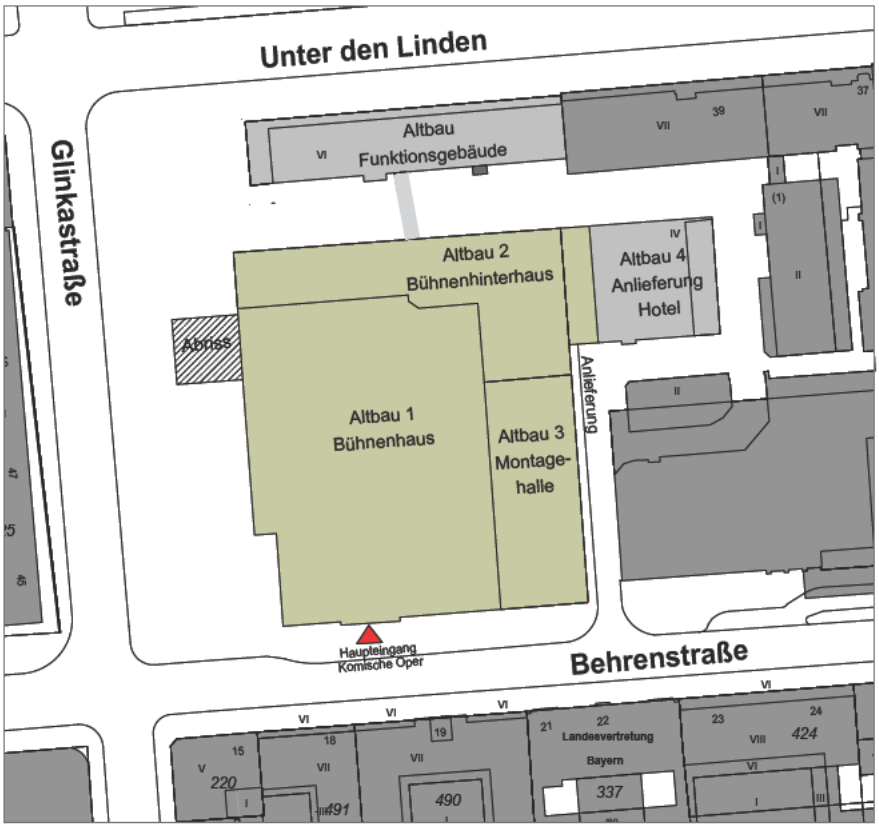


Abb. 30 Lageplan mit Kennzeichnung der Gebäudeteile Altbau

Altbau 1 - Bühnenhaus mit Zuschauersaal, Foyers, Haupt- und Seitenbühnen, Orchestergaben, Bühnenturm

Bühnenhaus
Das denkmalgeschützte Bühnenhaus - Altbau 1 - in der Hauptsache der öffentlich zugängliche Bereich – soll strukturell und baulich kaum verändert werden. Nur im Foyerbereich soll ein neuer großzügiger Windfang für das Foyer entstehen und der bauliche Zustand von 1967 wiederhergestellt werden.

Zuschauersaal und Foyer
Die im Rahmen einer Foyer-Umgestaltung von Braunfels Architekten hergestellten Oberflächen sollen für die Gesamtsanierung komplett zurückgebaut werden, um die im Foyerbereich vorgesehene Wiederherstellung der historischen Gestaltung und strukturelle Änderungen zu ermöglichen.
Weiterhin sind eine Erneuerung / Sanierung der gesamten Haustechnik, Oberflächen und Bodenbeläge, im Zuschauerraum und den Foyers gemäß restauratorischem Befund geplant. Im Zuschauerraum sollen die gesamte Podesterie und Lüftungstechnik und die Bestuhlung samt Übersetzungsanlage erneuert werden. Die Fußbodenbeläge sollen in höherwertiger Qualität entsprechend dem repräsentativen Charakter ausgeführt und die WC-Räume erneuert werden.

Im UG sollen in Teilbereichen der tiefer gelegenen Bereiche eine neue ebenengleiche Sohle und eine nachträgliche Abdichtung eingebaut werden, um eine Nutzung für die technischen Betriebsräume und den Orchestergraben zu ermöglichen.

Die bestehende Dachkonstruktion soll brandschutztechnisch ertüchtigt und die Rauchabzugsöffnungen erneuert werden.

Der Neubau von WC-Anlagen am Foyer des Bestandsgebäudes ist nicht gewünscht.

Orchestergraben
Der Orchestergraben wurde bereits baulich tiefer gelegt. Zusätzliche Akustikmaßnahmen und der Umgang mit der Hubtechnik sind in den späteren Planungen weiter zu untersuchen.

Haupt- und Seitenbühnen / Bühnenturmaufstockung
Der vorhandene Bühnenturm soll um ca. 5 m aufgestockt werden. Es sind hohe Lasten abzuleiten, die aus der Bühnenmaschinerie eingeleitet werden (Zugstangen mit Dekorationen in dynamischer Belastung). Die Konstruktion ist gemäß den statischen Erfordernissen zu entwickeln. Im Bühnenturm werden die gesamte Schnürbodentechnik und die Galeriegänge erneuert. Im Bereich der Haupt- und Seitenbühnen soll der Einbau neuer Podeste und einer neuen Dreh- und Unterbühne erfolgen.

Die Bühnenschräge muss wegen der Sichtlinien weiter schrägstellbar sein. Es ist eine Begradigung für Auf- und Abbauten und Sonderveranstaltungen, wie Opernball, zu ermöglichen.

Theatertechnische Räume und Lagerräume
Um den Bühnen- und Zuschauerraum sollen wie im Bestand, Räume der theatertechnischen Abteilung, wie Tonstudio und Beleuchterlogen untergebracht werden. Die übrigen Räume an den Außenseiten können aus brandschutztechnischer Sicht nicht alle als Aufenthaltsräume genutzt werden und können somit Platz für Lager und Abstellräume der technischen Abteilung und der Hausverwaltung schaffen.

Altbau 2 - Bühnenhinterhaus mit Künstlergarderoben, Werkstätten, Technikräume

Im Altbau 2 sollten wie bereits im Bestand weiterhin Künstlergarderoben, Werkstätten, Technikräume, Kostümräume und Sanitäranlagen angeordnet sowie Aufzüge mit Hofzugang eingefügt werden.

Die Decken sollen entsprechend den erforderlichen Lasten verstärkt und die Wandoberflächen, Bodenbeläge, Kellerabdichtungen und die komplette Gebäudetechnik erneuert werden.

Die Natursteinplatten der Rückfassade sollen für die Erneuerung der Wärmedämmung abgenommen und der ursprüngliche Sandstein wieder angebracht werden.

Altbau 3 - Montagehalle, Magazine, Werkstätten, Lager

Die bisher im Altbau 3 untergebrachten Probebühnen 1 und 2 sollen ausgelagert und im Neubau in neuer Qualität untergebracht werden. Hierfür könnte der Altbau 3 entkernt werden und z. B. Räume für die Kostümabteilung, Magazine, Werkstätten und Lager mit Lagertechnik untergebracht werden.
Dabei ist der Erhalt der denkmalgeschützten äußeren Gestalt gewünscht.

Es ist angedacht, im UG eine neue Sohle für die technischen Betriebsräume tiefer einzubauen und die Fundamente zu verstärken. Damit könnten die erweiterten Magazinräume untergebracht werden.

Im 2. OG ist eine Verbindung zum Foyer und zum Altbau 1 gewünscht.

Im 3.OG des Altbaus 3 sind die Anordnung der Büros, Werkstätten, Wasch-, Trocken- und Bügelräume sowie das Lager der Kostümabteilung wünschenswert.

Am verbleibenden Altbaubestand im Anschlussbereich Altbau 1 und Altbau 3 sind wie im Bestand vor allem Räume für die technische Abteilung gewünscht.

Altbau 4 - Anlieferung
Es wird eine weitgehende Aufgabe des Gebäudeteils vorgesehen und eine eindeutige bauliche Trennung zum Hotelbetrieb vorgesehen werden. Der westliche Teilbereich der Anlieferung soll weiter für die KOB zur Verfügung stehen und entsprechend saniert. Die Bearbeitungsgrenze verläuft auf der Achse „I“ durch das gesamte Gebäude und über alle Etagen. Auf der Achse „I“ ist eine Brandwand vorzusehen.

Technikflächen auf dem Altbau
Es sollen Technikflächen für notwendige Lüftungszentralen auf dem Dach des Altbaus nachgewiesen werden. Diese sind so anzuordnen, dass sie das äußere Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen und nicht sichtbar sind. Auf dem Altbau 3 sind keine Technikflächen vorzusehen.

Sandsteinverkleidung
Die vorgehängte Sandsteinverkleidung des Altbaus soll durch den ursprünglichen Sandstein ausgetauscht werden. Der Steinbruch, aus dem die Platten für den ’66-er Bau stammten, ist noch in Betrieb und kann eine ausreichende Anzahl an Platten liefern.

Anbindungen zwischen Altbau und Erweiterung
Die Anbindung der einzelnen Gebäudeteile ist aufgrund der vielen mehrgeschossigen Räume nur an wenigen Stellen möglich.
Neue Anbindungen vom Altbau 1 zum Altbau 3 und zur Erweiterung sind an der Behrenstraße im UG, EG und im 2. OG gewünscht.

Weitere Anbindungen zwischen Altbau 1 und Erweiterung sollen in Bühnennähe und am Bühnenhinterhaus im UG, EG, 2.OG und im 3.OG funktional angeordnet werden.

Im UG soll eine niveaugleiche Verbindung zwischen dem Orchestergraben und der neuen Orchesterprobe im Neubau geschaffen werden. Das UG soll ebenengleich an die tiefergelegten Bestandskeller vom Altbau 1 herangeführt werden, um schwellenlose Transporte zwischen den Funktionsbereichen zu ermöglichen.

Querverbindungen
Neue Querverbindungen und Flure sollen im UG zwischen Orchestergraben und Unterbühne, im 3.OG zwischen Altbau 1 und Altbau 3, sowie im 3.OG um den Bühnenturm herum im Altbau 2 geschaffen werden.

Treppenhäuser
Die innere Erschließung des Altbaus erfolgt unter Erhalt der meisten Treppenhäuser wie im Bestand. Die erforderlichen Fluchtwege aus dem Neubau und Altbau sind gewährleisten. Es ist das notwendige Maß an Treppenhäusern zu planen.

Bühnentechnik
Der große Teil der Arbeitsbereiche, die Umkleiden- und Sozialräume der Mitarbeiter bei der Bühnentechnik befinden sich im Altbau. Neben den Werkstätten sind die Arbeitsbereiche der Mitarbeiter der Bühnentechnik die Bühnen und Probebühnen, zu denen die Bühnentechniker auf kurzem Weg gelangen sollen, gewünscht.

3.6 Funktionale Anforderungen an den Neubau

Einpassstudie Erweiterung
Das Neubauprogramm wurde mit Hilfe einer zeichnerischen Einpasssss-studie erstellt.

Die Studie soll im Rahmen des Wettbewerbs lediglich die Anforderungen an die räumlich-funktionalen Zusammenhänge aufzeigen und dient zum besseren Verständnis des Raumprogramms.

Folgende funktionalen Anforderungen sind für den Neubau zu berücksichtigen:

Tageskasse / Café / Opernshop - Unter den Linden
Es wird eine Vorverkaufs- / Tageskasse im Bereich der begehrten Lage am touristischen Verkehrsstrom der Straße Unter den Linden gewünscht.
Denkbar ist es, die Tageskasse im Neubau mit einem Café und Souvenirshop als Merkzeichen für die KOB zum Stadtraum zu platzieren und alle Serviceangebote einer zeitgemäßen Tageskasse aufweisen.
Der Bereich soll als „Begegnungsort“ für den ersten Kontakt mit den Besuchern einladend gestaltet werden. Der Besucher soll neugierig auf einen Besuch einer Vorstellung der KOB werden.
Das Café soll kleine gastronomische Angebote (Kaffeespezialitäten, Sandwiches, Kuchen etc.) für den Besucher bieten. Eine kleine Küche für die Zubereitung von einfachen Speisen ist wünschenswert. Stühle und Tische sowohl im Inneren als auch an der Straße sollen zur Öffnung der Oper nach außen beitragen.
Ein kleiner Bühnenbereich für Veranstaltungen wie Lesungen, kleinstbesetzte Kammermusik etc. wäre wünschenswert.
Angegliedert an Kasse und Café soll ein Opernshop (Merchandising-Bereich) mit Schauvitrinen entstehen.

Der Haupteingang der KOB für Besucher mit Abendkasse soll im Altbaufoyer des Haupteingangs an der Behrenstraße untergebracht werden.

Workshopraum
Es soll ein Workshopraum für die Zuschauer ebenerdig angeordnet werden. Gewünscht wird eine Anbindung an den Bereich Café / Tageskasse / Opernshop. Der Workshopraum dient u. a. dem Empfang und der Einstimmung von Besuchergruppen auf die Vorführung, aber auch der Nachbereitung mit den Besuchern. Weiterhin soll er Sammelpunkt und Auftakt von öffentlichen Führungen sein, die zurzeit ca. 50 Mal im Jahr durchgeführt werden. Dem öffentlichen Bereich Café und Workshopraum sind Sanitärräume zuzuordnen.

Casino / Restaurant
Im Casino / Restaurant sollen die Mitarbeiterinnen der KOB im Kantinenbetrieb zwischen 9.00 Uhr und 1.00 Uhr versorgt werden. Gäste sollen ebenfalls das Mittagsangebot des Casinos und im Rahmen der Abendveranstaltungen ein angemessenes Angebot nutzen können. Für die Mitarbeitenden ist ein ungestörter Bereich mit 90 + 40 Plätze variabel abzugrenzen. Für externe Gäste sollen 60 + 40 Plätze vorgesehen werden.
Der Barbereich soll für Mitarbeiter und für das Publikum zugänglich sein.

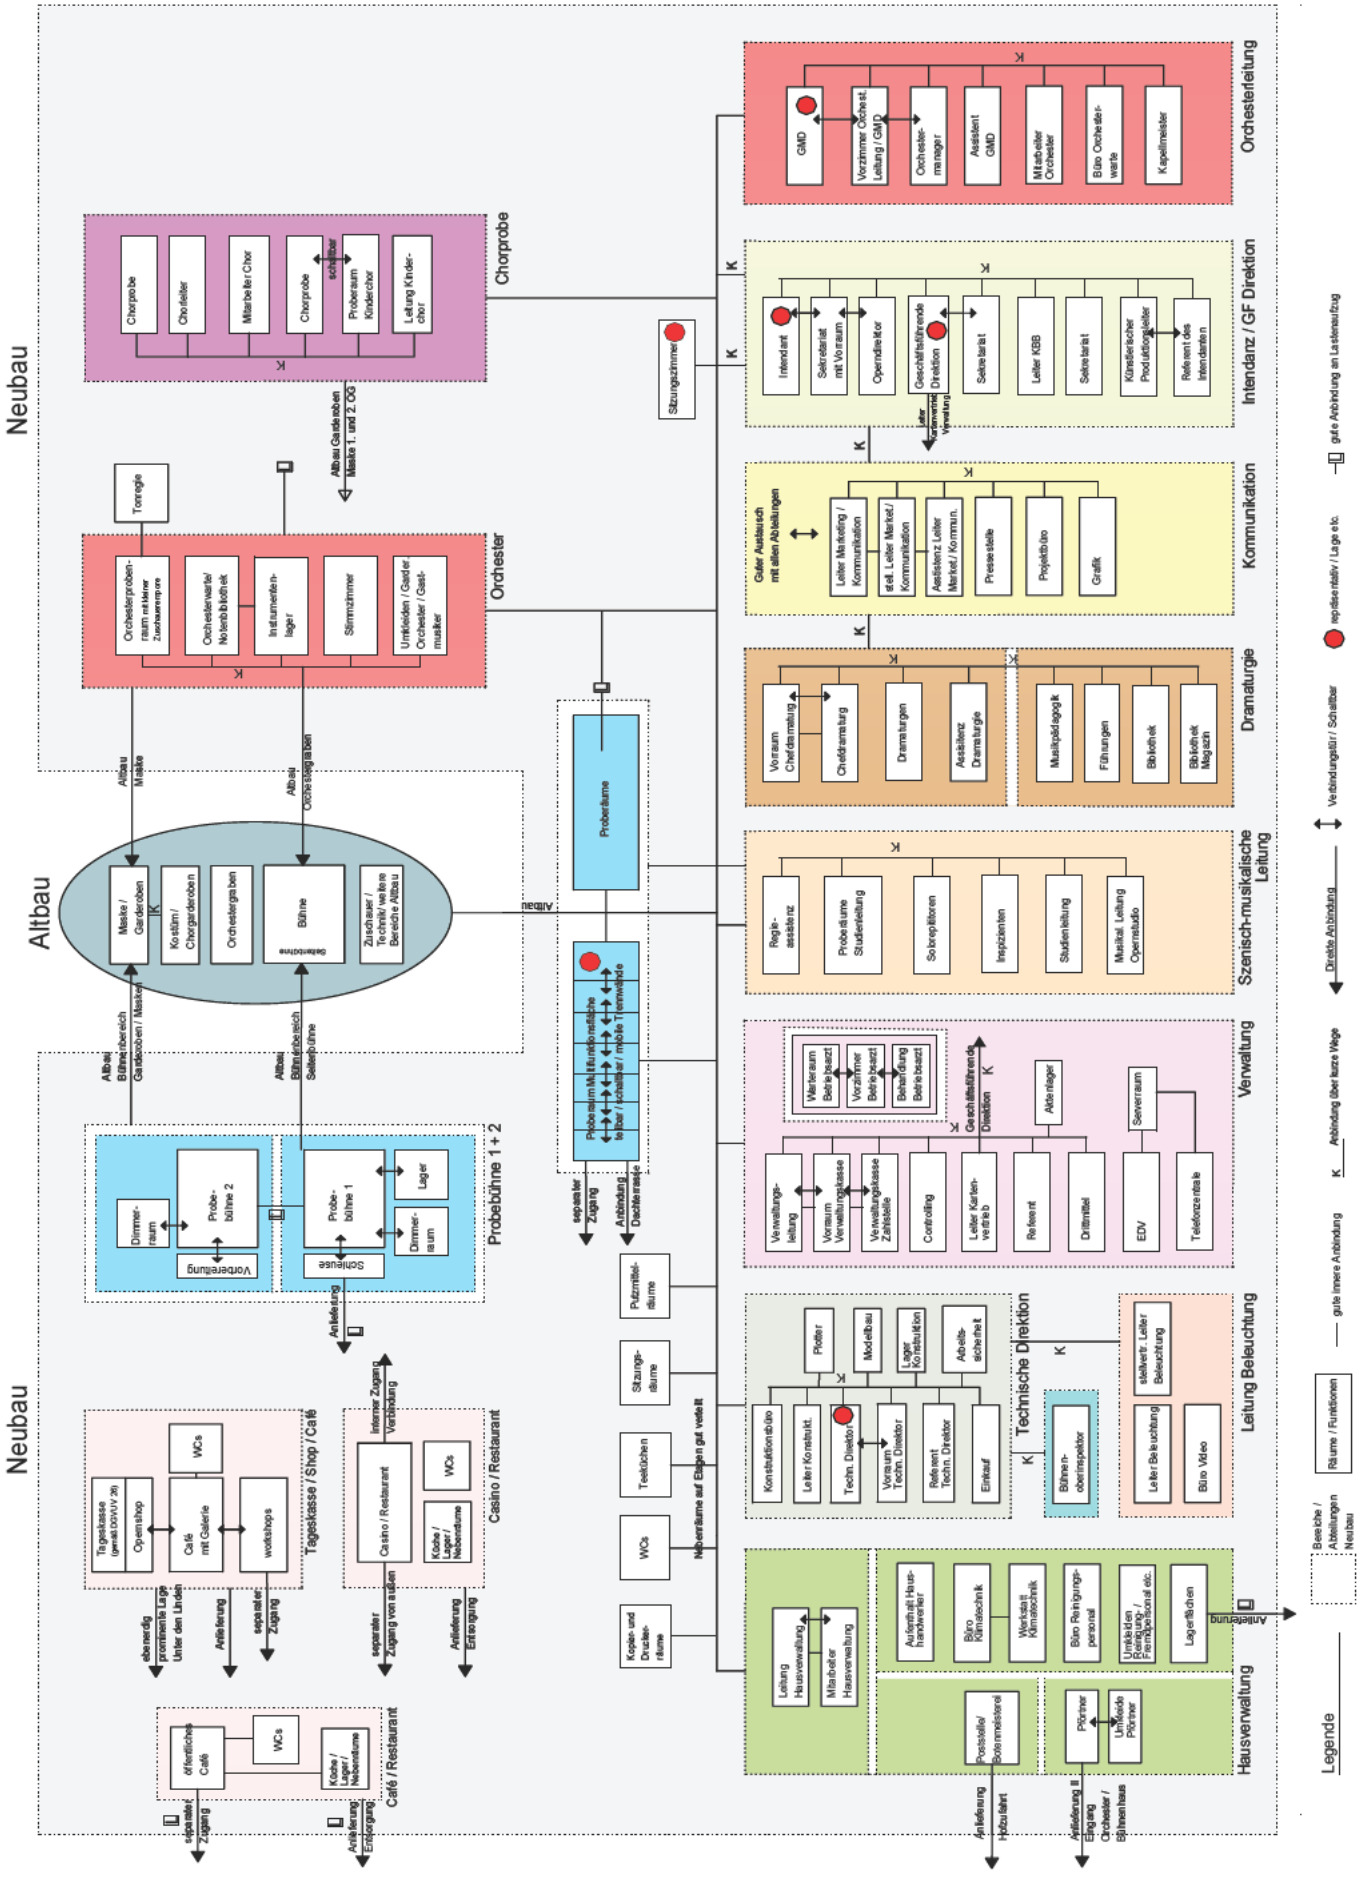


Abb. 30 Funktions- und Zuordnungsdiagramm Neubau / Erweiterug mit Bezügen zum Altbau, siehe auch als pdf im digitalen Anhang

Bei Abendvorstellungen sollen Abenddinners für Besucher vor und nach den Vorstellungen möglich sein.
Das Casino soll vom Straßenraum klar erkennbar sein und direkt erschlossen werden. Ein Außenbereich mit Tischen und Stühlen wäre wünschenswert.
Eine interne Anbindung an das Café / Tageskasse ist entwurfsabhängig zu lösen, jedoch nicht zwingend.

Die interne Anbindung der Neubaufunktionen an das Casino ist erforderlich. Auch eine Anbindung der Foyerflächen wäre wünschenswert.

Öffentliches Café
Zusätzlich zu dem Café mit Tageskasse an der Straße Unter den Linden und dem Casino ist ein öffentliches Café an repräsentativer Stelle im Neubau gefordert. Das Café soll für die Öffentlichkeit separat erschlossen werden können. Der Zugang soll von den Pförtnern überwacht werden.
Hier sollen ab dem Mittag Speisen und Getränke angeboten werden, zum Abend ein After-Work-Space entstehen und nach den Vorstellungen ein Bar-Betrieb möglich sein, bei dem die Begegnung zwischen Gästen und Mitwirkenden explizit gewünscht ist. Die KOB möchte sich in Richtung der Stadt öffnen und das Opernerlebnis bestmöglich ausweiten.
Darüber hinaus wird der Bereich für Sonderveranstaltungen, wie beispielsweise Empfänge (gesetzte Essen), genutzt. Dafür sind gastronomische Vorbereitungsflächen notwendig.

Küche / Nebenräume / Lager der gastronomischen Flächen
Die Flächen für die gastronomischen Bereiche sind funktionsgerecht in Gastraum, Theke, Küche, Nebenräume und Lager aufzuteilen und anzuordnen. Die Lagerräume benötigen kein Tageslicht und können im UG untergebracht werden.
Im weiteren Planungsprozess werden die gastronomischen Bereiche durch Fachplaner weiter qualifiziert werden.
Die Cafés / Casino benötigen jeweils eigene Anlieferung / Entsorgung, ggf. Lastenaufzüge und separate Zugänge.
Mögliche Flächensynergien durch geschickt kombinierte Anordnungen sollen mitgedacht werden.

Poststelle / Botenmeisterei
Die Poststelle / Botenmeisterei soll so angeordnet werden, dass Post-, Paket- und Kurierabfertigungen straßennah und auf Straßenniveau erfolgen können. Der Raum muss hinreichend breite Türen aufweisen und sehr gut auffindbar sein.

Pförtner (Bühneneingang)
Der sog. Bühneneingang ist der zentrale Zugang für alle Beschäftigten der KOB. Die Pförtnerloge ist zentral anzuordnen. Von hier aus werden beispielsweise die Zutritte zum Haus sowie Anlieferungen kontrolliert. Sie dient darüber hinaus als Brandmeldezentrale. Weiterhin sollen in diesem Bereich Schließfächer für Koffer von Hausgästen (ca. 400 Gastkünstler jährlich) untergebracht werden. Die Pförtnerloge ist entsprechend zu positionieren.
Die Umkleide für den Pförtner soll gut daran angeschlossen sein.

Probebühnen 1 + 2
Die beiden Probebühnen entsprechen von den Abmessungen der Hauptbühne, siehe vermaßte Grundrissskizze im Anhang. Sie sind mit auflegbaren Drehscheiben im Durchmesser von 13 m auszustatten. Hinzu kommt der Bereich der Vorbereitungsflächen, die in voller Bühnenbreite den Probebühnen vorzulagern sind.
Die Bühnenbilder für die Probebühnen werden in der Regel im Bühnenservice der Stiftung Oper in Berlin Am Wriezener Bahnhof gebaut und zu den Probebühnen der KOB geliefert. Für die Aufführungen werden die Bühnenbilder über die Schleuse und ggf. den Aufzug über die Seitenbühne auf die Hauptbühne transportiert.
Es ist eine neue Anlieferung für die Probebühnen mit höhenvariabler Anlieferrampe mit Vorschubbrücke nachzuweisen.
Eine Schleuse ist so anzuordnen, dass der Transport der Bühnenbilder etc. sowohl direkt zur Seitenbühne als auch in die Probebühne so erfolgen kann, dass der Betrieb der Probenbühnen nicht gestört wird. Die Schleuse soll hierbei auch als räumlich akustische Trennung dienen.
In die Lufträume der Probebühnen sind jeweils Galerie- und Arbeitsebenen einzuziehen und entwurfsabhängig an die Etagen anzubinden.
Die geforderten Höhen sind im Lichten, das heißt am oberen Ende (wo der Abstand Boden zur Decke am geringsten ist) nachzuweisen.

Probebühne 1
Die Probebühne soll eine lichte Höhe von 9 m aufweisen. Die Lage im EG auf Niveau der Hauptbühne ist vorzusehen. Die Probebühne soll eine direkte Verbindung über eine Schleuse zur Seitenbühne des Bestandsgebäudes aufweisen. Die Schleuse dient der Anlieferung und soll auch als akustische Trennung zur Seitenbühne dienen.

Probebühne 2
Die Probebühne 2 ist mit einer geforderten Höhe von 5,80 m etwas niedriger. Die Anordnung ist entwurfsabhängig zu lösen. Bei Unterbringung in einem anderen Geschoss als die Probebühne 1 wird eine unmittelbare Anbindung an einen Lastenaufzug gefordert, damit die Bühnenbilder in beide Probebühnen transportiert werden können.
Der Probebühne 2 ist eine Vorbereitungsfläche zuzuordnen. Diese ist in Breite der Probebühne anzuordnen. Eine räumliche Abtrennung ist nicht notwendig.

Proberäume
Die sieben Probenräume dienen dem Einstudieren von Solo- und Ensemble-Partien und als Einsingzimmer.
Die Proberäume sollen sich im Bereich der Probebühnen gruppieren und mit den drei Regieassistenzräumen (siehe szenisch-musikalische Leitung) gut auf möglichst kurzen Wegen zugeordnet werden. Sie können im Verbund, aber auch über die Etagen verteilt sein, sind aber dann gut vertikal anzubinden. Der Raum für Solorepetitoren ist bei den Proberäumen anzuordnen.

Proberaum Multifunktion
Die KOB bietet die Möglichkeit an, Veranstaltungen (vorwiegend Workshops, aber auch Tagungen, Empfänge für Politiker, Künstler, Wissenschaftler, Förderern und Sponsoren, Meetings, etc.) - auch als Rahmenveranstaltung zu Opernaufführungen - in der Größenordnung von etwa 50

bis 200 Gästen im Haus durchzuführen.
Im Bestandsgebäude findet dies bereits in der Fritzi-Massary-Lounge (im 2. OG neben dem Foyer) und dem traditionellen Felsenstein-Zimmer statt.

Die große Multifunktionsfläche / Proberaum mit insgesamt ca. 313 m² soll auch für die oben beschriebene Anlässe dienen. Die Fläche soll mit mobilen Trennwänden in mehrere unterschiedliche, akustisch getrennte Räume mit ca. 40 bis 60 m² unterteilbar sein.
Gewünscht werden eine repräsentative Lage und eine Anbindung an eine Dachterrasse.
Die Multifunktionsfläche ist unabhängig vom Opernbetrieb durch einen separaten Zugang zu erschließen und mit einem Garderobenbereich auszustatten.

Ein weiterer Multifunktionsraum mit ca. 76 m² soll zentral im Bereich der Probebühnen angeordnet werden. Hier finden u. a. Veranstaltungen und Kurse der Musiktheaterpädagogik statt.

Orchester -
Stimmzimmer, Umkleiden, Instrumentenlager, Orchesterproberaum
Die Orchestermusiker benötigen einen zusammenhängenden Bereich, in dem sie sich umkleiden können, ihre Instrumente gelagert sind und die Instrumente gestimmt werden können.

Alle Räumlichkeiten des Bereichs können im UG / Tiefparterre untergebracht werden.

Für alle Musiker sind kurze Distanzen zwischen der Vorbereitung und den Aufführungen bzw. Proben zu gewährleisten.
Der Zugang soll zentral über den Bühneneingang erfolgen.

Der Bereich für die Orchestermusiker muss einen direkten Zugang zum Orchestergraben im Bühnenhaus aufweisen (wenn notwendig über Transport-Hubtisch mit integrierten Ausgleichstreppen, Größe ca. 12 m²).

Die Anlieferung der Instrumente von außen und die Anbindung an die Probebühnen und Proberäume über einen Lastenaufzug sind zu gewährleisten.

Über die genannten Anbindungen zwischen Neu- und Altbau sollen die Musiker zu den jeweils angegliederten Treppen- und Aufzugskernen und zum Orchestergraben gelangen.

Umkleiden- / Sanitärräume
Die Umkleide- und Sanitärräume des Orchesters werden von den Musikern genutzt. Die Größe der Umkleide- und Sanitärbereiche für Frauen und Männer soll variabel auf die jeweilige Zusammensetzung des Orchesters reagieren können.
Für die Gastmusiker sind separate Umkleiden vorzusehen.

Die Duschen für Frauen und Männer sollen so platziert werden, dass sie sowohl direkt von den Umkleiden des Orchesters als auch von den Umkleiden der Gastmusiker zugänglich sind. Es sind in diesem Bereich ausschließlich Duschen mit Einzelkabinen vorzusehen.

Stimmzimmer
In unmittelbarer Nähe zu den Umkleiden des Orchesters sind die Stimmzimmer nach einzelnen Stimmgruppen gemäß Raumprogramm anzuordnen. Sie dienen zur Vorbereitung der Musiker auf Proben und Aufführungen. Die Stimmzimmer müssen hohe akustische Anforderungen (Raum in Raum) erfüllen. Eine indirekte natürliche Belichtung wäre denkbar.

Orchesterproberaum / Empore Orchesterprobe
Der Orchesterproberaum soll eine lichte Höhe von mind. 9 m haben. Für die Raumakustik ist ein Raumvolumen von ca. 6.000 m³ notwendig. Der Raum soll in enger Zuordnung und niveaugleich mit den Stimmzimmern und Instrumentenlager angeordnet werden. Er benötigt Tageslicht.
Die Empore soll ca. 30 Besuchern im Rahmen von Workshops ermöglichen, den musikalischen Proben beizuwohnen.

Tonregie
Es soll ein Tonregieraum, z. B auf dem Niveau der Empore angeordnet sein. Ein direkter Zugang zur Hauptebene des Orchesterproberaums ist nicht notwendig. Der Raum benötigt aber die Sicht in den Raum mittels eines Sichtfensters.

Instrumentenlager
Das Instrumentenlager ist zentral unterzubringen. Von dort sind sowohl der Orchestergraben, der Orchesterprobenraum und die Stimmzimmer auf kurzem Weg und niveaugleich zu erreichen.
Das Lager soll in Teilbereiche unterteilt werden können. In diesen sollen die spezifischen Raumanforderungen an Temperatur, Luftfeuchtigkeit separat zu gewährleisten sein.
Das Lager benötigt kein Tageslicht und kann im UG angeordnet werden. Der Zugang soll über eine Doppelflügeltür erfolgen.

Lager Orchesterwarte
Das Lager für die Orchesterwarte soll in unmittelbarer Nähe zum Instrumentenlager sein. In diesem Raum ist die Notenbibliothek untergebracht. Hier werden die Notenmappen für die einzelnen Pulte werden zusammengestellt.

Chorprobe
Die Nutzungen der Chorproben sind zusammenhängend anzuordnen. Neben dem Chorprobenraum sind auch die Chorleitung und der Probenraum für Kinderchor (etwa 50 Kinder) unterzubringen.
Chorprobenraum und Kinderchorprobenraum sind zusammenschaltbar mit mobiler Trennwand nachzuweisen. Die Trennwand und die beiden Probenräume müssen höchste akustische Anforderungen erfüllen.

Die Umkleiden- und Maskenräume für den Chor liegen im 1. und 2. OG des Altbaus. Diese sind auf kurzem Weg anzubinden.

Die Garderoben des Kinderchors sollen im Altbau untergebracht werden und auf kurzem Weg an die Neubaunutzung angebunden werden.

Bürobereiche des Neubaus

Intendanz, Geschäftsführende Direktion

Die Intendanz und Geschäftsführende Direktion bilden gemeinsam die Leitung der KOB. Die Einzel-Büroräume sind im Gebäude repräsentativ und zusammenhängend anzuordnen.
Die Sekretariate sind für jeweils zwei Arbeitsplätze zu planen.

Ein Sekretariat ist der geschäftsführenden Direktion mit einer Verbindungstür direkt zuzuordnen.

Ein Sekretariat ist mit einem Vorraum / interner Flur zwischen Intendant und Operndirektor anzuordnen.

Ein Sekretariat ist dem Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros mit einer Verbindungstür zuzuordnen.

Im Leitungsbereich ist ein großer repräsentativer Sitzungsraum mit mind. 36,5 m² zu planen.

Szenisch-musikalische Leitung

Die szenisch-musikalische Leitung ist in der Nähe der Intendanz, des Operndirektors und der geschäftsführenden Direktion unterzubringen.

Orchesterleitung / GMD

Die Orchesterleitung ist mit guter Anbindung an den übrigen Orchesterbereich unterzubringen. Das repräsentative Büro des Generalmusikdirektors (GMD) kann auch in räumlicher Nähe des Orchesters untergebracht werden.

Dramaturgie und Musiktheaterpädagogik

Die Dramaturgie besteht aus fünf Büros, die zusammenhängend angeordnet werden sollen.
Die Dramaturgie ist gut an alle Bürobereiche, insbesondere an die Leitungsbereiche anzubinden.
Der Chefdramaturgie ist ein Vorraum zuzuordnen.
Die Musiktheaterpädagogik besteht aus drei Einzel-Büros und einer Bibliothek mit zwei Arbeitsplätzen.
Das Bibliotheks-Archiv ist nicht zwingend der Bibliothek räumlich zuzuordnen.
Die Musiktheaterpädagogik soll über kurze Wege an die Dramaturgie angebunden sein.

Kommunikation

Der Bereich Kommunikation ist zusammenhängend in Nähe der Dramaturgie und der szenisch-musikalischen Leitung unterzubringen.

Die Kommunikation arbeitet kreativ und viel in kleinen Teams. Gewünscht sind unterschiedliche Räumlichkeiten, um in kleineren und größeren Gruppen gemeinsam zu arbeiten. Die Räumlichkeiten müssen flexibel auf sich verändernde Abteilungsstrukturen reagieren können.

Der Austausch mit den anderen Abteilungen der KOB ist von Bedeutung.

Verwaltung
Die Verwaltungsleitung der KOB inklusive Verwaltungskasse und dessen Vorraum als besonderer Sicherheitsbereich mit Tresor sind zusammenhängend mit den beiden Controllingräumen anzuordnen.
Bei der weiteren Planung der Verwaltungskasse sind die Richtlinien für Kassenräume DGUV, Vorschrift 26 zu berücksichtigen.

Verwaltung und Kommunikation sind auf gleicher Ebene mit kurzen Wegen unterzubringen, um die geforderte direkte Kommunikation zu gewährleisten.
Die Büroräume für die Mitarbeiter „Drittmittel“ sind dem Verwaltungsbereich zusammenhängend zuzuordnen.

Das Aktenlager soll nach Möglichkeit in räumlicher Nähe zur Verwaltung liegen. Es ist kein Tageslicht erforderlich.

Technische Direktion
Die Technische Direktion leitet alle technischen Abteilungen (Bühnentechnik, Requisite, Licht, Ton, Video).
Die Büroräume der Technischen Direktion, das Konstruktionsbüro und alle weiteren Nebenräume sind zusammenhängend unterzubringen. Sie sollen in Nähe zu den Büroräumen der Leitung Beleuchtung und der Hausverwaltung angeordnet werden.

Leitung Beleuchtung
Die Leitung Beleuchtung und Video ist in räumlicher Nähe der Technischen Direktion anzuordnen.

Sitzungszimmer
Es sind drei Sitzungszimmer mit ca. 26 m² abteilungsübergreifend und zentral auf den Etagen unterzubringen.

Dienende Räume / Teeküchen / Sanitärräume
Die Teeküchen mit Aufenthaltsbereichen und Sanitärräume sollen gut auf den Etagen verteilt werden. Es sind dabei auch mindestens ein Toilettenraum und eine Dusche für intersexuelle Beschäftigte vorzusehen.
Die KOB wünscht sich die Anordnungen je Etage an der jeweils gleichen Stelle.
Die Teeküchen sollen Aufenthaltsqualität aufweisen.

Weiterhin sind die in jeder Büroetage Sitzungszimmer und Kopier- und Druckerräume funktional anzuordnen.

Raumakustische Maßnahmen Neubau
Für die Probebühnen und Orchesterräume sind spezielle raumakustische Maßnahmen erforderlich. Die Sitzungszimmer werden entsprechend den akustischen Normvorgaben ausgestattet.

3.7 Anforderungen Erschließung / Anlieferung / Logistik

Anlieferung / Be- und Entladen
Für Gastspiele gibt es Anlieferungen bis zu zehn 40-Fuß-Containern pro Tag.

Die Bestandszufahrt von der Behrenstraße zur vorhandenen östlichen Anlieferung zum benachbarten Hotel mit Hubtisch soll der Belieferung der Montagehalle, des Dekorationsmagazins und der Werkstätten dienen.
Eine zweite Anlieferung soll die Gesamtlogistik entzerren dem Transport der Dekorationen im Repertoirebetrieb, aber auch bei allen Transporten im Tagesgeschäft eines modernen Opernhauses dienen. Die Anlieferung an die Probebühnen muss entwurfsabhängig nachgewiesen werden.

Die Zufahrt für die Probebühnen soll über die Glinkastraße erfolgen. Sie muss für Fahrzeuge mit bis 18,75 m Länge (Gliederzug) ausgebildet sein. Es ist eine Ladezone mit Laderampe vorzusehen.

An der Glinkastraße darf nur vorwärts ein- und vorwärts wieder ausgefahren werden. Es sind an der Glinkastraße mehrere Ein-/Ausfahrten denkbar. Von der Behrenstraße ist es möglich vorwärts rein und rückwärts wieder raus zu fahren. Eine Ein-/Ausfahrt von der Behrenstraße an der Ecke Glinkastraße wird jedoch städtebaulich problematisch gesehen.

Der Logistikbereich mit Anlieferung soll sich einfügen in die bauliche Konzeption und für Besucher störungsfrei organisiert werden.

Die Müllentsorgung ist nachzuweisen.
Im UG Altbau 3 ist ein Müllraum mit Hubtisch an der östlichen Anlieferung angedacht.

Es werden Lösungen gesucht, die die funktionalen Anforderungen der Anlieferung erfüllen, ohne die Anmutung der Gebäude zu beeinträchtigen.
Es ist eine störungsfreie Anordnung von Besucherverkehr und Lieferverkehr zu gewährleisten.

Die notwendigen Feuerwehrzufahrten sind zu gewährleisten, siehe auch die Richtlinien der Feuerwehr.

Gebäudezugänge KOB
Der Haupt-Besucherzugang bleibt an der Behrenstraße.
Die Tageskasse soll an der Straße Unter den Linden angeordnet werden.

Die Besucher der KOB werden vorwiegend zu Fuß, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Fahrrad ankommen.
Besucher-PKW-Stellplätze werden mit Ausnahme der barrierefreien Stellplätze nicht angeboten.

Personaleingänge
Der sog. Bühneneingang ist der zentrale Zugang für alle Beschäftigten der KOB, siehe auch unter „Pförtner“

Ein weiterer Eingang soll hofseitig im Bereich des Bestandsgebäudes angeordnet werden.

Fahrrad-Stellplätze
Es sind möglichst viele Fahrradstellplätze für Besucher vorzusehen:
- Mind. 60 Stück in der Nähe des Haupteingangs
- Mind. 20 Stück in der Nähe des Besuchereingangs Unter den Linden
- Mind. 70 Stück für die Mitarbeitenden der KOB in Nähe der Personaleingänge

PKW-Stellplätze
Es sind 6 PKW-Stellplätze für rollstuhlgebundene Besucher und 2 PKW-Stellplätze für rollstuhlgebundene Mitarbeitende vorzusehen.
Weiterhin sind mind. 10 PKW-Stellplätze für Dienstfahrzeuge, Lieferanten und Nachunternehmer und für die Anlieferung durch Musiker und Handwerker vorzusehen.

Feuerwehr
Die Aufstell- und Bewegungsflächen der Feuerwehr sind zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Einhaltung der Feuerwehrflächen ist die Muster-Richtlinie für die Feuerwehr / Fassung 2014. Siehe Internet-Link im Anhang.

Innere Erschließung / Verkehrswege
Die innere Erschließung ist kompakt mit optimierten Verkehrswegen für alle Bereiche, insbesondere Garderoben, Deko, Kostüm und Instrumente zu organisieren.

Im Funktionsbereich Orchester soll die Flurbreite mind. 2 m betragen.

Die Transportwege zwischen Anlieferung, Werkstätten, Instrumentenlager, Lager- und Veranstaltungsräumen müssen eine Breite von mind. 2 m, im Bühnenbereich mind. 2,5 m haben. Die Türen in Transportwegen und zu Lagerräumen benötigen eine Offenhaltevorrichtungen, bei schweren Türen auch eine automatische Öffnung. Die Transportflure sind mit hochfesten Industrieestrichen zu versehen.

Türen, Durchgangsbreiten Neubau
Die Räume Probebühnen, Schleuse, Bühne benötigen ein lichtes Durchgangsmaß von 7,5 m Höhe und 3 m Breite. Dem entsprechen auch die geforderten Lastenaufzugsmaße.

3.8 Weitere Technische Anforderungen

Die Räumlichkeiten und vor allem die Arbeitsplätze sind nach geltenden und zeitgemäßen akustischen und klimatischen Richtlinien zu gestalten. Dies gilt auch für die Sommermonate.

Geschosshöhen Neubau
Die geforderten minimalen Geschosshöhen sind in der Raumprogrammlisten aufgeführt. Alle weiteren Geschosshöhen sind entwurfsabhängig unter Berücksichtigung der BauOBln zu planen.

Brandschutz
Für jede Nutzungseinheit müssen in jedem Geschoss mit mindestens einem Aufenthaltsraum zwei bauliche Rettungswege vorhanden sein. Der erste und (außer im Erdgeschoss) auch der zweite Rettungsweg müssen durch notwendige Treppen baulich sichergestellt werden (siehe BauOBln und Arbeitsstättenverordnung).

Offene, repräsentative Treppen sind in Räumen mit Brandlasten nur zusätzlich möglich und können nicht als Fluchtweg betrachtet werden.
Art und Umfang der erforderlichen baulichen Maßnahmen hängen vom Entwurf und vom Brandschutzkonzept ab.
Der technische Brandschutz ist auf ein Minimum zu beschränken.

Aufzüge im Neubau
Der Personen- und der Lastenaufzug sind funktionsgerecht und optimal anzuordnen.
Für die Probebühnen, die ggf. in Obergeschossen untergebracht sind, ist eine Anbindung durch einen Lastenaufzug vorzusehen: Fahrkorbinnenmaß HxBxT 3x3x7,5 m, Traglast 100 KN. Mindestens ein Lastenaufzug soll direkt von der Logistik die Obergeschosse anbinden.

Alle weiteren Aufzüge benötigen ein lichtes Maß von mind. 2 x 1 m.

Deckentraglasten

Probebühnen	5,0 kN/m²
Verwaltung	3,0 kN/m²

Akustik
Im Rahmen des weiteren Planungsprozesses sind differenzierte bauakustische und raumakustische Maßnahmen im Neubau zu planen und der Bestand ist akustisch zu verbessern.

Fenster / Glasflächen
Werden Fenster- und Glasflächen vorgesehen, die nicht von innen zu öffnen sind, sind ab dem 1. OG ausreichende Befahranlagen anzubringen. Glasflächen müssen ohne zusätzliche Höhenzugangstechnik zu erreichen sein.

Licht
Die Räume, die Tageslicht benötigen, sind in der Raumprogrammliste entsprechend gekennzeichnet.
Die Probebühnen benötigen die Möglichkeit der vollständigen Verdunklung.
Alle personalgestützten Arbeitsplätze müssen einen direkten Tageslichtbezug haben.
In der weiteren Planung sind für spezielle Bereiche je nach Erfordernis und geltenden Regeln Verschattungs- und Verdunklungsanlagen zu gewährleisten.

Technikflächen - TF
Die Technikflächen sind in funktionsgerechter Anordnung entwurfsabhängig sinnvoll unterzubringen.
Es ist eine sehr gute akustische Entkoppelung der Technikflächen zum Opernbetrieb unbedingt erforderlich.

Lufttechnische Anlagen

Im Rahmen der weiteren Planung ist ein Gesamt-Lüftungskonzept zu erarbeiten. Dabei sind die erforderlichen Raumkonditionen in Abgleich mit den angestrebten Nutzungen raumweise zu ermitteln und darzustellen. Technische und wirtschaftliche Gesamtlösungen sollen im weiteren Planungsverlauf durch unterschiedliche Varianten hinsichtlich Investitions-, Betriebs- und Instandsetzungskosten untersucht werden.

Der Einsatz von Kältetechnik ist auf die zwingend erforderlichen Bereiche zu beschränken.

Auf mechanische Entrauchungsanlagen soll möglichst verzichtet werden.

Folgende Bereiche im Neubau sollen voraussichtlich über Lüftungsanlagen versorgt werden. Die Lüftungsanlagen sind im Dach unterzubringen:
- WC- und Duschräume, zentral
- Stimmzimmer und Verwaltungsräume mit eigener Lüftungsanlage
- Technik- und Magazinräume mit eigener Lüftungsanlage
- Verkaufsraum, eigene Teilklimaanlage

Folgende Bereiche erhalten Teilklimaanlagen, die mit Außenluft betrieben werden sollen:
- Café
- Küche
- Chorprobe
- Orchesterprobe
- Probebühnen
- Serverräume:
  Die EDV-Räume werden über Splitkühlgeräte versorgt und erhalten einen Anschluss an die zentrale Klimakaltwasserversorgung.
- Instrumentenlager soll über Präzisionsklimageräte versorgt werden.

Bauablauf

Die exponierte Innenstadtlage an einem Verkehrsknotenpunkt und inmitten eines touristischen Hotspots erfordert besondere logistische und organisatorische Anforderungen bei der baulichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass es nur sehr eingeschränkt freie Flächen für Be- und Entlade-Funktionen und Lagerungshaltung gibt, dass notwendige Tiefbaumaßnahmen nur auf engstem Raum und mit hoher Leitungsdichte umzusetzen sind und dass aufgrund angrenzender sensibler Nachbarnutzungen (z.B. Hotelbetriebe, hochwertige Gastronomiebetriebe, Wohnen etc.) ein besonderes Augenmerk auf Staub- und Lärmemissionen zu legen ist.

3.9 Freiflächen / Außenanlagen

Die Freiflächen sind funktional und angemessen gut gestaltet zu entwickeln:
- Gebäudevorbereiche, Eingänge
- befestigte Hof- und Zufahrtsflächen
- Ladezonen
- Freiflächen mit Aufenthaltsqualität für Personal / Pausen

- Fahrradstellplätze
- Kfz-Stellplätze

In allen öffentlichen Bereichen sind die Kriterien des Gender Mainstreaming und des Design for all zu befolgen.

3.10 Nachhaltigkeit / Energieeffizienz / Ökologische Zielsetzung

Als verbindliches Planungsziel wird festgelegt:

Neubauten:
Primärenergiebedarf gemäß Anforderungen der aktuell geltenden EnEV, EnEG und EEWärmeG.

Umfassende Sanierung:
Primärenergiebedarf gemäß Anforderungen der aktuell geltenden EnEV, EnEG und EEWärmeG unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange.

Vor dem Hintergrund der Klimaschutzziele und einer wirtschaftlichen Gesamtkostenbetrachtung legt der Auslober Wert auf eine energieoptimierte Bauweise, die einen deutlich reduzierten Energiebedarf und somit verringerte Energie- und Betriebskosten gewährleistet.

Dabei sind zur Beurteilung der Qualitäten des nachhaltigen Bauens neben den Kriterien Funktionalität, Komfort und Gesundheit, Wirtschaftlichkeit auch die Ressourcen- und Energieinanspruchnahme heranzuziehen:

- Baustoffe
- Endenergiebedarf
- Energiebedarfsdeckung

Bestandsgebäude
Die technischen und energetischen Maßnahmen im Bestandsgebäude sind denkmalverträglich auszubilden. D.h. die energetische Verbesserung der bestehenden Gebäudehülle hat den denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen an die Gebäudesubstanz und an das damit verbundene Erscheinungsbild zu folgen, die sich aus dem Denkmalwert der Gesamtanlage ergeben. Die größtmögliche Erhaltung der Denkmalsubstanz ist vorrangiges Ziel.

Die Betrieblichen Anlagen sind zum größten Teil marode und müssen erneuert werden.

Wärmeerzeugung / Wärmeverteilung
Für alle Gebäudeteile (Bestand und Neu) ist von Fernwärme auszugehen. Der bestehende direkte Fernwärmeanschluss (unterhalb des derzeitigen Casinos) an der Behrenstraße wird an den neuen Bedarf angepasst.

Neubau
Der Neubau an der Glinkastraße erhält keinen eigenen Hausanschluss, sondern wird an den Bestand angebunden.

Heizflächen werden wie folgt vorgesehen:
- Repräsentative Bereiche mit Stahlröhrenradiatoren, ggf. Fußbodenheizungen,
- Küche mit Stahlröhrenradiatoren mit vergrößertem Nabenabstand,
- WC-Bereiche mit Plattenheizkörper mit planer Oberfläche,
- Übrige Bereiche, wie Büros, Werkstatträume etc. mit profilierten Plattenheizkörper.

Die Warmwasserversorgung im Neubau soll dezentral erfolgen.
Der Einsatz erneuerbarer Energien in Form von Solarenergie ist zu maximieren.

Es wird ein ökologisches Gesamtkonzept erwartet, das die folgenden Ziele hinsichtlich der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ausgewogen berücksichtigt:
- Kompaktheit (A/V) der Gebäudeform und klimatische Zonierung der Nutzungsbereiche
- Hohe Flächeneffizienz
- Sicherstellen eines geringen Energiebedarfs (Gebäude und Anlagentechnik)
- Hohe thermische Qualität, Fugendichtheit und wärmebrückenfreie Konstruktionen der Gebäudehülle
- Minimierung des Lüftungswärmeverlustes
- Reduktion von Immissionen und Emissionen
- Umweltverträglichkeit der Baumaterialien, Wiederverwertbarkeit/-verwendbarkeit, Recycelbarkeit
- Einsatz erneuerbarer Energien
- Weitgehender Verzicht auf aktive Kühlsysteme durch Begrenzung der solaren Lasten (Fensterflächenanteil, Sonnenschutz) im Sommer
- Passive Kühlung durch Aktivierung von Speichermassen und nächtliche Kühlung
- Integration erforderlicher Techniksysteme auf Raumebene mit Möglichkeit des individuellen Nutzereingriffs
- Einsatz von Steuerungs- und Regelungstechniken
- Prüfen der Regenwassernutzung
- Dachbegrünung, Möglichkeit der Fassadenbegrünung
- Hoher Komfort und Behaglichkeit
- Sehr gute akustische Raumeigenschaften und Sprachverständlichkeit
- Langfristige und flexible Nutzungsqualität
- Kosteneffizienz bei den Baukosten
- Minimierung der Betriebskosten

Sonnenschutz Neubau
Zur Minimierung der Kühllasten ist vor Verglasungen ein außenliegender Sonnenschutz vorzusehen. Der sommerliche Wärmeschutz ist zu erfüllen. Die Flächen und Volumen für die Integration technischer Systeme sind im Neubau entsprechend vorzusehen.

Ökologische Planungskriterien
Prinzipien des ökologischen Bauens sind in „Bausteine der Nachhaltigkeit“ und im „Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Stand Januar 2019“ beschrieben (siehe digitale Anlagen).

Für die Konstruktion und Bauausführung sollen demnach nur Materialien und Bauteile zur Anwendung kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Transport, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit sowie eine hohe Lebensdauer aufweisen. Bei der Entwurfsbearbeitung sind die Planungsprinzipien der Nachhaltigkeit anzuwenden, die eine ausgewogene Beachtung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte erfordern.

Regenwasserbewirtschaftung
Im Rahmen der weiteren Planung ist gemäß den wasserwirtschaftlichen Grundsätzen ein Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung zu entwickeln. Hierbei soll das Niederschlagswasser möglichst vollständig zurückgehalten werden (siehe hierzu Begrenzung von Regenwassereinleitungen bei Bauvorhaben in Berlin (BReWa-BE, Juli 2018), link in Teil 4).
Flachdächer sind (extensiv) zu begrünen. Innenhöfe sollen als nutzbare Flächen angelegt werden.

3.11 Investitionskosten / Nutzungskosten / Wirtschaftlichkeit

Nach der Landeshaushaltsordnung ist der Bauherr verpflichtet, seine Mittel sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. Die Wirtschaftlichkeit des Entwurfs ist daher ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten.
Die Planung hat sich am Prinzip des kostensparenden Bauens zu orientieren. Dies bezieht sich auf:
- Baukosten
- Instandhaltungskosten
- Kosten des laufenden Betriebs

Hierzu sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:
- Kompakte, klare und funktionale Grundrissorganisation, Reduzierung der Verkehrsfläche auf ein sinnvolles Maß
- Verzicht auf aufwendige Konstruktionen
- Minimierung der Oberfläche, Kompaktheit
- Optimierung des Verhältnisses von verglaster zu geschlossener Fassadenfläche
- Reduktion der Materialwahl, Instandsetzungsfähigkeit, Alterungsfähigkeit des Materials

Der Kostenrahmen wurde auf der Annahme eines „mittleren Standards“ für Kulturbauten ermittelt.
Es wird vorausgesetzt, dass bei der Planung umweltfreundliche Baustoffe verwendet und technische Systeme auf ein Minimum reduziert werden (die Verwendungsverbote und -beschränkungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sind zu beachten, s. Anhang).

Die Bewirtschaftung beider Gebäude ist zu optimieren. Dies betrifft die zentrale Anordnung der Technik, Anlieferung, etc.

Für die Baumaßnahme liegt ein geprüftes und genehmigtes Bedarfsprogramm vom April 2018 mit Gesamtkosten von 227.000.000,- Euro (brutto, Index Feb/18) vor.

Diese Kostenobergrenze ist zwingend einzuhalten.

Für die Kostengruppen 300 + 400 wurden folgende Kosten genehmigt:

Neubau - Kosten - KG 300 + 400 brutto

KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	28.740.000,- Euro
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	19.050.000,- Euro
Summe KG 300 +400 Neubau		47.790.000,- Euro

Bestandsgebäude - Kosten - KG 300 + 400 brutto

KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	38.526.200,- Euro
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	32.050.000,- Euro
Summe KG 300 +400 Bestand		70.576.200,- Euro

Die denkmalpflegerischen, wirtschaftlichen und technischen Zwänge dieser Sanierung und Ergänzung des Einzeldenkmals sowie die komplexen Anforderungen des Nutzungskonzeptes schränken den Spielraum für eine Varianten- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 LHO stark ein.

Die Fertigstellung ist für 2029 geplant.
Der konkrete Rahmenterminplan wird nach Vorliegen des Wettbewerbsergebnisses erarbeitet werden.

Im Neubau soll die vorgesehene „Kunst am Bau“ nach ABau realisiert werden.

3.12 Barrierefreies Bauen

Barrierefreies Bauen ist als selbstverständliche Qualitätsanforderung im Sinne eines Design for all in Hochbau und Freiraumplanung konsequent umzusetzen. Barrierefreies Bauen ist in den Rechtsgrundlagen (Bauordnung für Berlin – BauOBln, DIN 18040 Teil 1, Betriebsverordnung – BetrVO u.a.) geregelt. Darüber hinaus sind in Berlin die Handbücher Berlin-Design for all – Öffentlich zugängliche Gebäude und Berlin-Design for all – Öffentlicher Freiraum nach Anweisung Bau, Richtlinie II 120 ff. verbindlich anzuwenden, siehe Internet-links im Anhang unter 4_1_09.
Das Projekt soll beispielhaft von Beginn an in einem „Konzept Barrierefrei“ gemäß ABau entwickelt und durch den gesamten Planungsprozess weiter gesteuert werden.

Das Anliegen von Menschen mit Behinderung ist bereits bei der Ideenfindung zu berücksichtigen, um kluge Lösungen ohne Sondermaßnahmen zu finden.

Die Wechselbeziehungen zwischen vorhandenem Stadtraum, neuen bzw. vorhandenen Gebäuden, Außenanlagen sowie verschiedenen Funktionsbereichen sind lückenlos barrierefrei zu gestalten, um so die Basis für eine inclusive Nutzungsform gemäß den Forderungen der UN Behindertenrechtskonvention zu bereiten.
Dabei sind sowohl das Gesamtsystem als auch die separaten Funktionsbereiche bei Abtrennung schlüssig barrierefrei zu konzipieren (z.B. barrierefreie Ein- oder Übergänge, Zuordnung von Sanitäreinheiten etc.).

Die grundsätzliche Barrierefreiheit der KOB ist gefordert und ist entwurfsabhängig zu lösen. Eine barrierfreie Erschließung des 1. Ranges und 2. Ranges ist erforderlich.

3.13 Baurechtliche Vorschriften, Normen und Richtlinien

Der Planung sind insbesondere zugrunde zu legen (siehe auch Internetlinks im Anhang):
- Bauordnung Berlin (BauOBln) und ergänzende Vorschriften BauOBerlin in der aktuell gültigen Fassung
- Verordnung über Bauvorlagen, bautechnische Nachweise und das Verfahren im Einzelnen (Bauverfahrensverordnung - BauVerfVO) in der aktuell gültigen Fassung
- DIN 18040 - Barrierefreies Bauen, Teil 1 vom 01.07.2012
- Energieeinspar-Verordnung (EnEV) in der aktuell gültigen Fassung
- Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (BGBl. I S. 1658) in der aktuell gültigen Fassung
- Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (BetrVO) in der aktuell gültigen Fassung
- Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättVO) in der aktuell gültigen Fassung

Des Weiteren sind die im Anhang aufgeführten Richtlinien zu beachten.

3.14 Beurteilungskriterien des Preisgerichts

Beurteilungskriterien der ersten Phase

Städtebauliches Konzept
- Stadträumliche Einbindung
- Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude und der Gesamtanlage
- Verhältnis / Dialog des Neubaus zum denkmalgeschützten Bestandsgebäude
- Anbindung / Schnittstellen Bestandsgebäude / Neubau
- Adressbildung
- Außenraum
- Verkehrliche / logistische Erschließung

Gestaltung
- Architektonische Ausdruckskraft
- Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude

Funktion
- Erschließung, Anlieferung
- Funktionale Zuordnung

Realisierbarkeit
- Programmerfüllung
- Genehmigungsfähigkeit

Beurteilungskriterien der zweiten Phase

Städtebauliches Konzept
- Stadträumliche Einbindung
- Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude und der Gesamtanlage
- Verhältnis / Dialog des Neubaus zum denkmalgeschützten Bestandsgebäude
- Anbindung / Schnittstellen Bestandsgebäude / Neubau
- Adressbildung
- Außenraum
- Verkehrliche / logistische Erschließung

Gestaltung
- Architektonische Ausdruckskraft
- Baukörpergestaltung, Ablesbarkeit, Niedrigschwelligkeit
- Konstruktion, Materialität
- Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude

Funktion
- Erschließung, Anlieferung
- Funktionale Zuordnung
- Funktionale-architektonische Qualität der Innenräume
- Flexibilität der Büroflächen
- Belichtung, Belüftung

Realisierbarkeit
- Programmerfüllung
- Nachhaltigkeit, Energieeffizienz
- Barrierefreiheit
- Genehmigungsfähigkeit
- Wirtschaftlichkeit von Bau und Betrieb
- Einhaltung des Kostenrahmens

Die Reihenfolge der Kriterien stellt keine Gewichtung dar.

Teil 4 Anhang

4.1 Digitale Anlagen

4_1_01 Auslobung

01_KOB_Auslobung.pdf
02_KOB_Auslobung_ebook.pdf

4_1_02 Lageplan - Arbeitsplan

01_KOB_Lageplan.dwg
02_KOB_Lageplan_500.pdf

4_1_03 Vermesserplan

01_KOB_Vermesser.dxf
02_KOB_Vermesser.pdf

4_1_04 Bestandsplaene

Grundrisse

KOB 2022_01_UG01_A_190122_Index H_B.dwg und pdf
KOB 2022_02_EG00_A_190122_Index G_B.dwg und pdf
KOB 2022_03_OG01_A_190122_Index E_B.dwg und pdf
KOB 2022_04_OG02_A_190122_Index E_B.dwg und pdf
KOB 2022_05_OG03_A_190122_Index E_B.dwg und pdf
KOB 2022_06_OG04_A_190122_Index D_B.dwg und pdf
KOB 2022_07_OG05_A_170706_B.dwg und pdf
KOB 2022_08_DA00_A_170706_B.dwg und pdf

Ansichten und Schnitte

KOB 2022_21_SC01_AA+BB_A_170607_B.dwg und pdf
KOB 2022_22-24_AN01-03_A_170607_B.dwg und pdf

Bestandsplaene wie oben, jedoch

bei Bedarf in der Autocad-Version 2000
KOB_Bestand_DWG_2000.zip

4_1_05 3_d_Modell

KOB-Modellplan_3DM.zip
KOB-Modellplan_3DS.zip

4_1_06 Raumprogramm

01_KOB_Raumprogramm_NUF_TF_Neubau.pdf (analog zu Formblatt 02)
02_KOB_Raumprogramm_NUF_TF_Bestand.pdf (analog zu Formblatt 02)
03_KOB_Einpassstudie.pdf
04_KOB_Funktionsschema.pdf

4_1_07 Formblaetter

01_KOB_Formblatt_Gebaeudekennwerte_Neubau.xls
02_KOB_Formblatt_Nutzflaechen_Technikflaechen_Neu.xls
03_KOB_Formblatt_Nutzflaechen_Technikflächen_Bestand.xls
04_KOB_Verfassererklaerung_1_Phase.pdf
05_KOB_Verfassererklaerung_2_Phase.pdf

4_1_08 Informationsunterlagen

Luftbilder

01_KOB_Luftbild_2018.jpg

Auszug Denkmalpflegeplan

02_KOB_Denkmalpflegeplan_Auszug
03_KOB_R1_Auszug_Fasssade_Gebaeudebuch_denkmalpflegeplanf.pdf

Hauptbühne

04_KOB_R2_Abmessungen_Hauptbühne.pdf

Baugrund

05_KOB_Boden_Vororientierung.pdf

Datenschutzhinweise

06_KOB_Datenschutz.pdf

Modellbau (2. Phase)

Fotos des Umgebungsmodells werden zu Beginn der 2. Phase versendet.
Die Modell-Einsatzplatte im M 1:500 erhalten die Teilnehmer ebenfalls mit Beginn der zweiten Phase

4_1_09 Bilddokumentation

01_KOB_Bilddokumentation.pdf
02_KOB_R3_Fotos_Probebuehne2

4_1_10 **VgV-Vergabeunterlagen** - zur Information

A 1-1 Angebotsschreiben IV_213eF.pdf
A 1-2 Hinweise zum Angebotsschreiben - elektronisches Angebot IV 213 eF.pdf
A 2 Honorarangebot.pdf
A 3-1 Qualifikation Schlüsselpersonal-Projektleitung.PDF
A 3-2 Qualifikation Schlüsselpersonal-stellv. Projektleitung.PDF
A 3-3 Qualifikation Schlüsselpersonal-Oberbauleitung.PDF
A 4 Verhandlungsvorschläge.PDF
A 5 IV 128 F Erklärung Bewerber- Bietergemeinschaften _Wirt 238_.pdf
A 6 Erklärung zum Einsatz von Unterauftragnehmern.PDF
A 7 IV 126 F Verpflichtungserklärung _Wirt 236 _.pdf
A 8 Besondere Vertragsbedingungen Frauenförderung _Wirt 2141_.PDF
A 9 Besondere Vertragsbedingungen für Tariftreue und Eigenerklärung _Wirt 214_.PDF
E 1 Erklärungen und Angaben zur Eignungsprüfung.PDF
IV 0 Unterlagenverzeichnis Verhandlungsverfahren nach Wettbewerb#3.PDF
IV 1 Informationen zum Verhandlungsverfahren-Verfahrensbedingungen#2.PDF
IV 2 Informationen zum Verhandlungsverfahren-Zuschlagskriterien#2.PDF
V 1-1 Vertragsentwurf Generalplanerleistungen#2.PDF
V 1-2 IV 401.H F Allgemeine Vertragsbestimmungen AVB Hochbau.pdf
V 1-3a_Gebäudeplanung.pdf
V 1-3b_Freianlagen.pdf
V 1-3c_Tragwerksplanung.pdf
V 1-3d_TGA.pdf
V 1-3e_Beratungsleistungen.pdf
V 1-4 BVB Umweltschutzanforderungen.pdf
V 1-5 Techn und sonstige Vorschriften Regelwerke.pdf
V 1-6 Verpflichtung gemäß Verpflichtungsgesetz _Wirt-240_.pdf
V 1-7 IV 4103.H F_ Liste der Beteiligten-Blanko.pdf

V 1-8 Vorläufiger Rahmenterminplan.pdf
V 1-9 Prüfvermerk_Bedarfsprogramm.pdf
V 1-10 Bedarfsprogramm Kosten Gesamt.pdf

4_1_11 Rechtliche Grundlagen und Leitfäden im Internet

Bauordnung Berlin und ergänzende Vorschriften (BauOBln), in der aktuellen Fassung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/bauen.shtml

Allgemeine Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Berlins (Anweisung Bau – Abau)
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/abau/

Baugesetzbuch (BauGB), in der aktuellen Fassung
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbaug/gesamt.pdf

Leitfaden zum Baunebenrecht zur Anwendung in den bauaufsichtlichen Verfahren entsprechend der Bauordnung für Berlin, in der aktuellen Fassung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/leitfaden_baunebenrecht.pdf

Verordnung über Bauvorlagen, bautechnische Nachweise und der Verfahren im Einzelnen (Bauverfahrensverordnung - BauVerfVO)
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/bauen.shtml

Rundschreiben im Bereich Bauen, Projektvorbereitung und -prüfung, Hochbau, Richtwerte und Standards, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/projekte_hochbau.shtml

Leitfaden zum Baunebenrecht zur Anwendung in den Bauaufsichtlichen Verfahren entsprechend der Bauordnung für Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 2014
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/leitfaden_baunebenrecht.pdf

Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (DSchG Bln), in der aktuellen Fassung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/sen/denkmal/service/gesetzestexte/index.shtml

Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (BetrVO), in der aktuellen Fassung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/BetrV.pdf

Neue Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 1. September 2012
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR.html

Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz – EnEG) in der aktuell gültigen Fassung
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/eneg/gesamt.pdf

Energieeinsparverordnung EnEV in der aktuell gültigen Fassung
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/enev_2007/gesamt.pdf

Verordnung zur Durchführung der Energieeinsparverordnung in Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 2010
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20091218EnEVDVBln2009.pdf

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), in der aktuellen Fassung
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eew_rmeg/gesamt.pdf

Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&rid=3

Leitfaden Nachhaltiges Bauen 2015“ 3. aktualisierte Auflage mit Stand Januar 2019
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Leitfaden_2019/BBSR_LFNB_D_190125.pdf

Bausteine der Nachhaltigkeit, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 2009
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/

Verwaltungsvorschrift für die Anwendung von Umweltschutzanforderungen bei der Beschaffung von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen (Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt – VwV-BU)
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/beschaffung/

Begrenzung von Regenwassereinleitungen bei Bauvorhaben in Berlin (BReWa-BE)
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/regenwasser/de/Hinweisblatt-BReWa-BE.pdf

Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr (MRFIFw), 2009
http://www.is-argebau.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=759O986O991

Ausführungsvorschriften zu § 50 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) über Stellplätze für Kraftfahrzeuge für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (AV Stellplätze)
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20071129-AV-Stellpl.pdf

Berlin-Design for all - Öffentlich zugängliche Gebäude
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/download/handbuch/BarrierefreiesBauen2012.pdf

Design for All - Öffentlicher Freiraum in Berlin
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/download/designforall/Handbuch-Design_for_all_2011_broschure.pdf

Konzept Barrierefrei, Anleitung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/download/Konzept_Barrierefrei.pdf

4.2 Quellenangaben

Abbildungen

Soweit nicht gesondert aufgeführt wurden die Abbildungen, zum Teil auf der Grundlage der ALK von Ulrike Lickert Architektin erstellt. Weitere Abbilundsnachweise:

Titelbild: Fotograf: Gunnar Geller, Pressestelle KOB
Abb. 02: Luftbild 2018. Quelle: Landesarchiv Berlin, Landesbildstelle
Abb. 04: Fotograf: Markus Löffelhardt, Berlin, September 2015
Abb. 05-07: Fotograf: nilo, Agentur für Fotografie Berlin
Abb. 08: Fotograf, Jan Windszus Photography, Pressestelle KOB
Abb. 09-10: Fotograf: Gerald Zabel
Abb. 12: Übersichtsplan von Berlin, bearbeitet von Julius Straube, um 1910. Quelle: Landesarchiv Berlin
Abb. 13: picture alliance / ZB, Fotograf: Bernd Settnik
Abb 14 - 18: KOB-Archiv (aus Hübner + Oehmig: Komische Oper Berlin, denkmalpflegerische Dokumentation, Denkmalpflegeplan, Berlin 2018)
Abb. 19-20: Fotograf: Jan Windszus Photography, Pressestelle KOB
Abb. 21-23: Landesdenkmalamt, Berlin
Abb. 24 Fotograf: Jan Windszus Photography, Pressestelle KOB
Abb. 25: Fotograf: Gunnar Geller, Pressestelle KOB
Abb. 26: Bestandsgrundriss, Komische Oper Berlin
Abb. 28: Denkmalkarte, https://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/
Abb. 30 Funktionsdiagramm, erstellt von Dipl.-Ing. Ulrike Lickert

Literatur

Hübner + Oehmig: Komische Oper Berlin, denkmalpflegerische Dokumentation, Denkmalpflegeplan, Berlin 2018

Architekten-Verein zu Berlin und Vereinigung Berliner Architekten (Hrsg.): Berlin und seine Bauten, II. Der Hochbau, Berlin 1896

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin (Hrsg.): Berlin und seine Bauten, Teil V Bauten für Kunst, Erziehung und Wissenschaft, Band A Bauten für die Kunst, Berlin 1983

Rolf Hosfeld, Boris Kehrmann, Rainer Wörtmann: Komische Oper Berlin, Hamburg 2001

Denkmaltopographie in Deutschland. Denkmale in Berlin. Bezirk Mitte. , hrsg. vom Landesdenkmalamt Berlin, Petersberg 2005

Realisierungswettbewerb Deutscher Bundestag – Neubau –
Unter den Linden 62-68, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Juni 2018

Rocco Curti, «Rekonstruktionen und retrospek-tive Neubauten zwischen Brandenburger Tor und Palast der Republik. Tendenzen der Historisierung des Stadtraums und deren Auswirkungen auf die Denkmalpflege», in: kunsttexte.de, Nr. 3, 2006 (15 Seiten), www.kunsttexte.de.
